



30 Kasım 2012

... / 11 / 2012

GİZLİ

Sayı: B.30.2.HAC.0.70.00.00/ = 5793

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Yükseköğretim Kurulu-(Gelen No)



30.11.2012 - 87374

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında MARUBENI EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanla ilgili olarak, Firmanın, sözleşme ve şartnamede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiş ve ihtarlara rağmen bu eksikliklerin giderilmemesi üzerine sözleşme feshedilmiştir. Bu suretle malzemenin atıl kalması ve ekonomik değer kaybına uğratılması ile ihtiyaca rağmen hizmete alınamaması sonucunda işlemlerin sözleşmeye uygun olarak yürütülmesi ve takibinden sorumlu personelin ve ortaya çıkan idari zararının tespiti ile işlemin yürütülmesinde ve idare zararına sebebiyet verilmesinde kusuru ve ihmali bulunanlar hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılmıştır.

Bu suretle malzemenin atıl kalması ve ekonomik değer kaybına uğratılması ile ihtiyaca rağmen hizmete alınamaması buna rağmen firmanın malzemelerin garanti sürelerinin dolduğu iddialarıyla karşı karşıya gelmesine sebebiyet verilmiş olması nedeniyle öncelikle satın alma işleminin akdi ilişkiye uygun olarak yürütülmesi ve takibinden sorumlu personelimizin ve ortaya çıkan idari zararının tespiti ile işlemin yürütülmesinde ve idare zararına sebebiyet verilmesinde kusuru ve ihmali bulunanlar hakkında Rektörlüğümüzce disiplin ve ceza soruşturması başlatılmıştır.

Disiplin ve ceza soruşturması kapsamında görevlendirilen soruşturma komisyonunca hazırlanan raporda soruşturma onayı doğrultusunda, konu ile ilgili olarak öncelikle sorumluluğu bulunanların tespitine gidildiği, sorumlular arasında aynı zamanda proje kapsamında işlemleri yürüten birim amirlerinden olan Üniversitemiz eski Rektörlerinden Prof.Dr. Uğur ERDENER ile Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN'in de bulunduğu bildirilmiştir.

2547 sayılı Kanun'un 53/c-1 maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 18. maddesinin "Rektörler hakkında soruşturma açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanının kararı ile olur. Bu soruşturma Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri tarafından yapılır..." hükmü uyarınca konu ile ilgili sorumluluğu tespit edilen Üniversitemiz eski rektörleri ve diğer tüm sorumlular hakkında disiplin ve ceza soruşturmasının Başkanlığınızca yürütülmesi hususunu takdirlerinize saygılarımla arz ederim.


Prof.Dr. A.MURAT TUNCER
REKTÖR

Eki: Soruşturma dosyası (2 klasör)

GİZLİ

09.11.2012

Sayı : B.30.2.HAC.0.00.00.00/410 - 4300

Konu : Soruşturma Hk.

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK MAKAMINA,

İlgi: 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı yazı.

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENI EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca yapılan ceza soruşturması yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız. Söz konusu görevlendirme onayı uyarınca yukarıda bahsi geçen olayların aydınlatılması ve sorumluların tespiti ile ilgili olarak, komisyonumuzun hazırladığı Soruşturma Raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Filiy Ezean

Prof. Dr. Filiz Ercan

[Handwritten signature]

Prof.Dr. Mutlu Aytemir

Long

Prof.Dr. Canan Hekimoğlu

Ek: 2 adet paketlenmiş dosya

PLACED IN THE
THURSDAY MAY 2 1968
KRYM NO
S263
LE


GİZLİ

DİZİ PUSULASI

A- Soruşturma Raporu

- Ek-1:** 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı yazı.
Ek-2: 11.07.2012 tarih ve 3074 sayılı yazı.
Ek-3: 27.09.2012 tarih ve 4532 sayılı yazı.
Ek-4: 11.05.2012 tarih ve 214 sayılı yazı.
Ek-5: 02.07.2012 tarih ve 2638 sayılı yazı.
Ek-6: 01.08.2012 tarih ve 3034 sayılı yazı.
Ek-7: 17.05.2012 tarihli tutanak
Ek-8: 07.06.2012 tarihli tutanak
Ek-9: 12.07.2012 tarihli tutanak
Ek-10: 17.07.2012 tarihli tutanak
Ek-11a: Prof.Dr. Tuncalp ÖZGEN (Yazılı)
Ek-11b: Prof.Dr. Uğur Erdener
Ek-12: Prof.Dr. Ömer UĞUR (Yazılı)
Ek-13: Prof.Dr. Tezer KUTLUK
Ek-14: Dr. Turhan MENTEŞ
Ek-15: Prof.Dr. A. Faruk ZORLU
Ek-16: Prof.Dr. Ayşegül ÜNER
Ek-17: Prof.Dr. Şuayip YALÇIN
Ek-18: Prof.Dr. Erol BELGİN
Ek-19: Prof.Dr. Orhan Macit ARİYÜRÜK
Ek-20: Prof.Dr. Osman Koray BODUROĞLU
Ek-21: Prof.Dr. Mustafa N. ÖZMEN
Ek-22: Prof.Dr. Mustafa CENGİZ
Ek-23: Doç.Dr. Evren ÖZDEMİR
Ek-24: Prof.Dr. Şevket RUACAN (Yazılı)
Ek-25: Mehmet ÖZEN
Ek-26: Süreyya ÖZER
Ek-27: Ertuğrul KALE
Ek-28: M. Nejat ERTÜRK
Ek-29: Meral KIRAZLI
Ek-30: Hasan BEYTAŞ
Ek-31: Demet YILDIZ
Ek-32: Mehmet Sabri ÜSTÜN
Ek-37: Ercan YIĞIT
Ek-34: Ekrem ATEŞOĞLU
Ek-35: Murat KARAAĞAÇ
Ek-36: Yasin TÜRK
Ek-33: Yücel DENİZ
Ek-38: İbrahim Ender KILIÇ Ayşe Nihan KAYA (Marubeni Avukatı) Erdem BAŞGÜL (Marubeni Avukatı)
Ek-39: Celal TEKALP
Ek-40: Ali Murat ÖZARTAN
Ek-41: Cem MEMİK (Beyaz Teknik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Yazılı)

FE



la

Ek-42: Proje Bilgileri:

Ek-43: 09.12.2010 tarih ve 09 sayılı onayları ile aşağıda bulunan isimlerden oluşturulan komisyonun

Ek-44: 13.12.2010 tarihli, 2 adet lineer akseleratör muayene ve kabul protokolü

Ek-45 :17 Ekim 2007 tarihli, Varian Mediacal Sistemlere ait belge (delivery note:319431416)

Ek-46: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi tıbbi cihaz ihalesi

Ek-47: 06.02.2009tarih ve 39 sayılı muayene komisyonu raporu

Ek-48: 13 Aralık 2001 tarihli sözleşme

Ek-49: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Tıbbi Makine Teçhizat İhalesine Ait Kredili Yurt Dışı Satın Alma (Teknik) şartnamesi

Ek-50: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Tıbbi Makine Teçhizat İhalesine Ait Uluslararası Dış Kredili Yurt Dışı Satın Alma İdari Şartnamesi

Ek-51: Marubeni Cooperation Japan/Marubeni Europe plc şirketi başlıklı belge

Ek-52: 24 Mart 2010 tarihli toplantı notları

Ek-53: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin tamamlanması ve I.Kısım Tadilat ve Büyük Onarımları İşine Ait Sözleşme

Ek-54: Pirsantaj oranları icmal tablosu

Ek-55: 26.01.2009 tarih ve 17 sayılı muayene komisyonu raporu

Ek-56: 21.06.2012 tarih ve B.30.2.HAC.0.H3.00.00-1307 sayılı yazı

Ek-57: 14.11.2007 tarih ve B.30.2.HAC.0.70.10.14-D-1164 sayılı yazı

Ek-58a: 2 Mart 2012 Beşiktaş 11. Noterine ait (No:10513) belge

Ek-58b: 1 Mart 2012 Beşiktaş 11. Noterine ait (No:10328) belge

Ek-59:14 Mayıs 2012 Tarihli, 2012/18D.İş dosya no'lu Bilirkişi Tespit raporu

Ek-60: 09.092009 tarih ve 080380 sıra no'lu fatura

Ek-61:Marubeni firması avukatları tarafından teslim edilen belgeler

Ek-62: Marubeni firması avukatları tarafından teslim edilen belgeler

EK-63: 28.01.2011 tarih ve b.30.2.HAC.0.H3.00.00-109 sayılı yazı

Ek-64: 12.01.2012tarihli Medikal Fizik Uzmanı Demet Yıldız imzalı belge

Ek-65: 11.04.08 tarihli Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün yazısı

Ek-66: 04.07.2012 tarih ve B.30.2.HAC.0.73.00.00/919 sayılı Marubeni Europe Plc ile ilgili fesih yazısı

Ek-67: 25.07.2012 tarih B.30.2.HAC.0.61.00.00/HA-3306 sayılı Marubeni Europe Plc. ile ilgili İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı


Ek-68: Mehmet KAYA

Ek-69: Yaşar ANDIÇ

Ek-70:Konu ile ilgili diğer Ek- belgeler

Ek-71:Prof. Dr. H. Fadıl Akyol

Filiz Erca



GİZLİ

SORUŞTURMA RAPORU

SORUŞTURMA EMRİNİ VEREN MAKAM: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

SORUŞTURMA BAŞLAMA TARİHİ ve ONAYI : 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı yazı (Ek-1).

SORUŞTURULANLARIN AD SOYAD VE GÖREVLERİ: MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem; makine, malzeme ve ekipman ile ilgili sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak sorumluların tespiti ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması.

SORUŞTURMA KONUSU: Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem; makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak sorumluların tespiti ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması.

SORUŞTURMACILAR: Prof.Dr. Filiz Ercan (Başkan), Prof.Dr. Mutlu Aytemir (Üye) ve Prof.Dr. Canan Hekimoğlu (Üye)

İdari Mali İşlerde görevli memur Yaşar Andıç ve Hukuk Müşavirliğinde görevli Av.Mehmet Yalçın, Rektörlüğe gönderilen 01.08.2012 nolu yazı ile soruşturmada bilgi ve belge sağlamak amacıyla görevlendirilmişlerdir (Ek-6).

Filiz Ercan

 1



SORUŞTURMA SAFHALARI: Komisyonumuz onayıyla öncelikle projenin başlangıcından itibaren her aşamasında yer alan sorumluların tespiti için konuyla ilgili daveti kabul eden herkesin ifadesine başvuruldu. Yaptığımız inceleme sonucunda, Proje sözleşmesinin gereğini yerine getirmeyen proje yöneticilerini ve teçhizatla (TRP6 brakiterapi ve HKS1 Hijyenik klima...vb.) ilgili muayene ve kabul protokolünde imzası bulunan kişiler tespit edildi. Bu kapsamda 36 adet personelin bilgisine başvuruldu, konu ile ilgili belge ve dokümanları araştırıp incelendi **(Ek-7- Ek-69)**.

SORUŞTURMA İÇİN İSTENEN EK SÜRELER:

I. **Ek Süre :** 11.07.2012 tarih ve 3074 sayılı yazı **(Ek-2)**.

II: **Ek Süre :** 27.09.2012 tarih ve 4532 sayılı yazı **(Ek-3)**.

SORUŞTURMA İÇİN İSTENEN EK BELGELER:

11.05.2012 tarih ve 214 sayılı yazı **(Ek-4)**.

02.07.2012 tarih ve 2638 sayılı yazı **(Ek-5)**.

SORUŞTURMAYA BELGE SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN GÖREVLENDİRMELER:

01.08.2012 tarih ve 3034 sayılı yazı **(Ek-6)**.

DELİLLER:

1- Komisyon tarafından düzenlenen tutanaklar: **(Ek-7 - Ek-10)**

17.05.2012 tarihli tutanak **(Ek-7)**

07.06.2012 tarihli tutanak **(Ek-8)**

12.07.2012 tarihli tutanak **(Ek-9)**


17.07.2012 tarihli tutanak **(Ek-10)**

2- İfade tutanakları:

Prof.Dr. Tuncalp ÖZGEN (Yazılı) **(Ek-11a)**

Prof. Dr. Uğur Erdener **(Ek-11b)**

Prof.Dr. Ömer UĞUR (Yazılı) **(Ek-12)**

Fatih Ersoy  2 

Prof.Dr. Tezer KUTLUK	(Ek-13)
Doç. Dr. Turhan MENTEŞ	(Ek-14)
Prof.Dr. A. Faruk ZORLU	(Ek-15)
Prof.Dr. Ayşegül ÜNER	(Ek-16)
Prof.Dr. Şuayip YALÇIN	(Ek-17)
Prof.Dr. Erol BELGİN	(Ek-18)
Prof.Dr. Orhan Macit ARİYÜREK	(Ek-19)
Prof.Dr. Osman Koray BODUROĞLU	(Ek-20)
Prof.Dr. Mustafa N. ÖZMEN (Yazılı)	(Ek-21)
Prof.Dr. Mustafa CENGİZ	(Ek-22)
Doç.Dr. Evren ÖZDEMİR	(Ek-23)
Prof.Dr. Şevket RUACAN (Yazılı)	(Ek-24)
Mehmet ÖZEN	(Ek-25)
Süreyya ÖZER	(Ek-26)
Ertuğrul KALE	(Ek-27)
M. Nejat ERTÜRK	(Ek-28)
Meral KIRAZLI	(Ek-29)
Hasan BEYTAŞ	(Ek-30)
Demet YILDIZ	(Ek-31)
Mehmet Sabri ÜSTÜN	(Ek-32)
Yücel DENİZ	(Ek-33)
Ekrem ATEŞOĞLU	(Ek-34)
Murat KARAAĞAÇ	(Ek-35)
Yasin TÜRK	(Ek-36)
Ercan YIĞIT (Varinak)	(Ek-37)
İbrahim Ender KILIÇ (Danışman)	(Ek-38)

Fatih Ercan

İmza

Ayşe Nihan KAYA (Marubeni Avukatı)(Ek-38)

Erdem BAŞGÜL (Marubeni Avukatı) (Ek-38)

Celal TEKALP (Somut Şirketi) (Ek-39)

Ali Murat ÖZARTAN (Ek-40)

Mehmet KAYA (Ek-68)

Yaşar ANDIÇ (Ek-69)

Prof. Dr. H. Fadıl Akyol (Ek-71)

Cem MEMİK (Beyaz Teknik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Yazılı) (Ek-41)

3- Marubeni firması avukatları tarafından teslim edilen belgeler (Ek-61, Ek-62)

4-Konu ile ilgili diğer Ek- belgeler (Ek-70)

5- Proje Bilgileri: (Ek-42)

PROJENİN ADI: H.Ü. Onkoloji Hastanesi II.Kısım Projesi

PROJENİN TOPLAM MALİYETİ: 39 milyon USD.

PROJENİN AMACI: Türkiye'ye tam donanımlı bir kanser merkezi kazandırarak, yurt dışına gidişleri azaltmak ve bu konuda uzman açığını kapatmak

SAVUNMA ÖZETİ:

1. Sıra No: 155 TRP6 Brakiterapi Sistemi:

09.12.2010 tarih ve 09 sayılı onayları ile aşağıda bulunan isimlerden oluşturulan komisyonun (Ek-43) 13.12.2010 tarihinde Marubeni Europe Plc. firmasından alınan 1 adet Lineer Akseleratör (S.No.150), 1 adet Bilgisayarlı tedavi planlama sistemi (S.No.153), 1 adet dozimetri sistemleri (S.No.154), 1 adet brakiterapi sistemi, yüksek doz hızlı (S.No.155) ve 1 adet radyoterapi amaçlı network sistemi (S.No.156), Muayene ve kabul protokolünü imzalamışlardır (Ek-44).

Komisyon Üyeleri

  4 

Prof.Dr. Şuayip YALÇIN (**Komisyon Başkanı**)
Onkoloji Hastanesi Müdürü

Prof.Dr. Orhan Macit ARİYÜREK (**Uzman Üye**)
Radyoloji ABD Başkanı

Prof.Dr. Fadıl AKYOL (**Uzman Üye**)
Radyasyon Onkolojisi ABD Başkanı

Meral KIRAZLI (**Üye**)
Onkoloji Hastane Müdürü

Demet YILDIZ (**Üye**)
Medikal Fizik Uzmanı

Meral Kirazlı tarafından verilen bilgi ifade tutanağında (**Ek-29**): TRP6 brakiterapi cihazının 2010 yılında Incekaralar yüklenici firması tarafından Radyasyon Onkoloji ABD'na kurulduğu bildirilmiştir. Tayfun Turan taşınır kayıt yetkilisidir.

Belirtilen cihaz 2008 yılında üniversiteye teslim edilmiştir. Cihazın geçici kabulü 13.12.2010 tarihinde yapılmıştır. (**Ek-44**).

Komisyon üyesi Demet YILDIZ (Ek-31): TRP6 Cihazının geçici kabul ve muayene protokolünden yaklaşık olarak iki yıl sonra 2012 Mayıs ayında kullanılmaya başlandığı, Medikal Fizik uzmanı Demet Yıldız'ın **Ek-31**'de verdiği bilgi ifade tutanağından anlaşılmaktadır. İfadesinde diğer komisyon üyeleri tarafından **Ek-44**'de yer alan tutanakta brakiterapi cihazının eksiksiz ve kusursuz olarak hazır olduğunu, montajlarının yapılarak cihazın tüm fonksiyonları ile çalışır durumda teslim edildiğibelirtilerek üyeler imzaladığı için kendisinin de imzaladığını, cihazın kimin üzerine kayıtlı olduğunu bilmediğini ve o tarihe kadar teknik şartnameyi görmediğini, komisyon üyesi olarak görevlendirildiğinin daha önceden kendisine tebliğ edilmediğini ve buna ait bir evrakının da olmadığını well-type iyon odasını hiç görmediğini, cihazın ambalajının açılımında ve kurulumunda kendisinin olmadığını, ölçümlerde kullanmak üzere well-type iyon odasının Varinak firma yetkilisi Kemal Ay tarafından dışarıdan kendisine temin edildiğini, Varinak Firmasından Kemal Ay ve Ercan Yiğit tarafından

Fatih Ercan



Well-type iyon odasının Hacettepe Üniversitesine teslim edildiğinin kendisine sözel olarak söylendiğini ifade etmiştir. Demet Yıldız'ın 12.01.2012 tarihli dilekçesi (Ek-64).

Prof.Dr. Şuayip YALÇIN (Ek-17): "Well-type iyon odasının eksik olduğunu bilseydim Ek-44'deki protokolü imzalamazdım, herkes imzaladıktan sonra ben de imzaladım" şeklinde belirtmiştir.

Prof.Dr. Orhan Macit ARİYÜREK (Ek-19): "İmza dosyası karşımıza gelince Şuayip ve Fadıl Beyler'in imzası olunca ben de imzaladım. Bu cihazın nasıl çalıştığını bilemeyeceğimiz gibi bir eksiğinin olup olmadığını da anlama şansımız yoktur. Komisyon Başkanı Şuayip Bey görüyor. Şuayip Bey eksikleri tespit edip sonra imzaya açması gerekirdi. Komisyon toplanmadan imzaya açılmıştır" şeklinde bilgi verdi.

Prof. Dr. H. Fadıl Akyol (Ek-71): "Brakiterapi Cihazının Well-Type iyon odasının eksik olduğunu bilmiyordum. Alet çalıştığı için ben de kesin kabul ve muayene belgesini imzaladım." Şeklinde bilgi verdi.

Meral KİRAZLI (Ek-29): "Kutuların içinde ne olduğuna dair bilgimiz olmazdı. Ben teknik kişi değilim. Ben sadece gelen malzemelerin yükleme listesinde belirtilen kutu ya da koli sayısına göre teslim alıyordum. Cihazlar monte edilirken bulunma gibi bir zorunluluğum yok. Cihazlar indirilirken monte edilirken Incekaralar Firmasından muhakkak biri olur" dedi.

Yaşar ANDİÇ (Ek-69): Gümrükten 171 kalem malzemeyi Hacettepe Üniversitesi adına çeken memurdur, ayrıca gelen giden evrakların arşivlenmesi de kendisine aittir. Bilgi ve belgelerin detayı hakkında geniş bilgisi var. 9 kalem malzemenin (içlerinde TRP6 brakiterapi cihazının da olduğu) orijinal komisyon kabul ve muayene protokol raporlarını görmediğini ve kendisinde olmadığını söylüyor.

2. Sıra No: 175 HKS1 Hijyenik Klima Sistemi:

HKS1 Hijyenik Klima sistemi, Marubeni Firmasının 1 December 2010 tarihli yazısının arkasındaki listede 175. madde de Hijyenik Klima sisteminin 13.07.2007'de (Sevkiyat tarihi) 27.07.2007'de teslim tarihi (fiyat 1.266.496,00 €) olarak yer almıştır (Ek-55). 08.08.2007 tarihinde Klimalar, [Ertuğrul Kale'nin (Hacettepe Onkoloji Hastanesi Hastane Müdür Yrd.) olarak kabul ve teslim belgesi var] tırlarla 4 adet koli halinde Onkoloji Hastanesinin önüne getirilmiştir (Ek-55). Klimalar, Incekaralar

Fatih Ersoy

firmasına haber verilerek Beyaz Teknik Firmasının (Somut Firması) eşliğinde getirilmiştir. Klimalar taşınırken ilk zamanlarda Incekaralar Firmasından görevli Yılmaz Bey, Aylin Hanım ve Özgür Çivi Beyin var olduğu söyleniyor. Klimalar Yaşar Andiç tarafından Gümrükten çekiliyor. Incekaraların belirlediği kamyonlara Incekaraların elemanı eşliğinde yükleniyor ve Hastane önünde de Ertuğrul Kale'ye teslim edilmiş. Marubeni haberim yok diyor, ama Türkiye temsilcisi Incekaraların haberi var. 2007 yılından 2010 yılına kadar açık havada uygun olmayan açık hava koşullarında park yerinde muhafaza edilmiştir. 2012 yılı başında inşaatların tamamlanmasından sonra klima sistemlerinin çalıştırılması gerekmiştir. Konu ile ilgili Marubeni Europe firmasına haber verilmiş ancak cihazlar çalıştırılmamıştır. Cihazın üreticisi Weiss Klima Teknik Firması ve Türkiye tek yetkili satıcısı Beyaz Teknik Firması, klimaların, üç yıl boyunca açık alanda yağmur, kar ve güneş gibi olumsuz hava koşullarına maruz bırakılması sebebi ile cihazların hasar gördüğünü belirtmişler ve cihazları çalıştırmayı reddetmişlerdir. Marubeni Europe Plc firması ile ilgili olarak mahkeme süreci başlamıştır (Ek-56).

Marubeni Firması yaklaşık olarak bir yıl sonra İngilizce bir metin yollamış bu metin Ecz. M. Nejat Ertürk tarafından imzalanmıştır. Metnin içeriğinde "ürünlerin kurulumu yapılamamasına rağmen sağlam, kuru bir ortamda depolama talimatlarına uygun olarak saklandığını" teyit eden (Ek-51) ve Üniversiteyi zor duruma düşüren yanlış bir beyan bulunmaktadır (Ek-52).

Marubeni Firması tarafından yapılması gereken inşaat işlerinin bir kısmı üniversitemiz tarafından ücret ödenerek Somut Firmasına yaptırılmıştır (Ek-53 ve Ek-54 ve Ek-60). Somut Firması (Firma Ortağı Celal Tekalp, Ek-39) 2008 yılı sonunda 171 kalem malzemenin alt yapısını hazırlamak, inşaat, onarım ve tadilat işlerini yapmak için ihaleyi alıyorlar. Somut Firması sorumlusu Celal Tekalp Bey "yaptığım her işten Tezer Kutluk Hoca'nın haberi var, çakılan her çiviye Tezer Kutluk Hoca ve yapı işlerinden habersiz yapmadım. Klimaların su aldığı, filitrelerinin bozulduğu ve panoların su aldığı" şeklinde bilgi vermiştir.

OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Ek-43'de yer alan Ecz. Nejat Ertürk'ün Rektörlük Makamına 09.12.2010 tarihinde yazdığı yazıda Brakiterapi (Sıra No 155) ve diğer 153, 154 ve 156 Sıra Nolu

Fatih Ersoy

lar

cihazların muayene ve kabul işlemlerinin yapılabilmesi için Prof.Dr. Şuayip Yalçın, Prof.Dr. Fadıl Akyol, Prof.Dr. Macit Arıyürek, Meral Kirazlı ve Demet Yıldız'ın komisyon üyesi olarak görevlendirilmiştir. (Ek-44).

Ek-45 ve **Ek-46**'daki belgelerden Well-type iyon odasının idare tarafından istendiği ve firma tarafından da listelendiği anlaşılmaktadır. Fakat cihazların üzerinde Sözleşme'nin Ambalajlama kısmının c-bendinde (**Ek-47**) Packing-listin gerekliliği yazmasına rağmen Packing-liste ulaşamadığımız, Marubeni firma danışmanı İbrahim Ender KILIÇ (**Ek-38**)'in ifadesinden anlaşılmıştır. Gümrük sorumlusu (dış alımlar) Yaşar Andiç Bey **Ek-69**'daki ifadesinde gümrükten çekilen malların üzerinde genelde packing-list olmadığını söylemiştir. Packing-listin olmaması gümrükteki işlemleri kolaylaştırdığını ifade etti. Oysa ki, teknik şartnameye göre packing-listlerin olması zorunludur.

Ek-47'de görülen komisyon tarafından içinde brakiterapi cihazının da olduğu malzemelerin muayene edilip, şartname ve sipariş niteliklerine uygun olduğu rapor edilmiştir. Marubeni Firmasından (Danışman İbrahim Ender Kılıç'tan) brakiterapi ile ilgili detaylı *packing-list* istenmiş fakat well-type içeren detaylı bir packing list'e ulaşılamamıştır.

Well-type iyon odasının eksikliği sıkıntı yaratmaktadır, her kaynak değişimi sırasında aktivite ölçümü için gerekli olan iyon odası üniversite dışındaki başka firmalardan geçici olarak temin edilmektedir.

Prof. Dr. Tezer KUTLUK (Ek-13): Hacettepe Üniversitesi adına projeyi yürüten birimin yetkili amirlerinden (Rektörlük ve Onkoloji Hastanesi Başhekimliği) biri olduğu proje bilgileri dokümanında yer almaktadır (**Ek-42**). Proje yürütücüsü olarak bütün gelişmelerden ve projenin takibinden sorumludur.

Ecz. M. Nejat ERTÜRK (Ek-28): Marubeni Europe PLC Firmasından alımların yapıldığı dönemde İdari ve Mali İşler Daire Başkanıdır. Bütün alımlar ve gümrükten teçhizat çekimi bilgisi dahilindedir. Şartnamede yazılı olmasına rağmen malzemelerin üzerinde olması gereken *packing-listlerin* olup olmadığını takip etmemiş, 9 grup malzemenin kabul ve muayene protokolü İdari Mali İşler Daire Başkanlığının arşivinde ve hiçbir birimde bulunamamıştır. Bu komisyon kabul ve muayene

Fulya Ercaz

protokollerinin İdari Mali İşler Daire Başkanlığına geri dönmesini ya da bu belgelerin korumasını takip etmemiştir. Yurtdışından gelen metni yetki ve sorumluluğunun dışında ve gereğini yapmadan imzalayarak, "hijyenik klimaların kuru ve şartnameye uygun biçimde saklandığına dair" yanlış beyanda bulunarak üniversitemizi zor duruma sokmuştur. Aslında sözlü ifadesinde İngilizce metnin içeriğinden haberdar olduğunu Tezer Bey'in kendisine bu durumu açıkladığını söylemiş fakat yazılı metinde söylediğini değiştirmiştir (Ek-10-Ek-28).

Marubeni Europe PLC: Firma, cihazların teslimi, kurulumu, garanti süreleri ve teslimatında *packing-listlerin* ambalajlarda yer alması gibi yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Şartnamede teçhizatın ambalajlarında muhakkak *packing-list* olması gerektiği yazmasına rağmen gümrükten çekim sırasında *packing-list* olmadığı firma ve Yaşar Andiç'in ifadelerinden anlaşılmıştır (Ek-38, Ek-69). *Packing-list* olmadığına, çok sayıdaki malzemeyi gümrükten çekmenin zaman kazanılması yönünden daha kolay olduğunu ifade etmiştir. 2001 yılında yapılan ihalede firma, ihale usulüne göre krediyi bulmakla yükümlüdür. T.C. Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı da garantör olmuştur. Marubeni Europe PLC. krediyi 2005 yılında CITIBANK (Bahreyn şubesi vb.) gibi bankalardan kendisi 4 yılda bulmuştur ve dolayısıyla kredi 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla sipariş vermede gecikmeyi sadece Hacettepe Üniversitesini sorumlu tutmak doğru değildir. Hazine, firmaya paranın %15'ini malzemeler gelmeden ödemiştir.

İncekaralar Firması: Firma adına Ali Murat Özartan katılmıştır (Ek-40). Özartan, Marubeni Europe PLC. Firmasının operasyonel şirketi olduklarını etmiş ise de sözleşmede Türkiye temsilcisi oldukları görülmektedir (Ek-48). Firma ifadesinde Ecz. Nejat Ertürk'ü suçlamaktır. Klimaların şartnameye uygun olarak muhafaza edildiğine dair ellerinde imzası olan belge bulunduğunu belirtmiştir. İncekaralar Firmasından bir görevlinin (Özgür Çivi olabilir deniliyor, yıllar sonra firmadan ayrılmış) ve Üniversitenin gümrük görevlisi Yaşar Andiç'in eşliğinde klimalar ve diğer malzemelerin Üniversiteye getirildiğini ve Ertuğrul Kale'ye teslim edildiğini beyan etmektedirler. Dolayısıyla, klimaların park alanına yerleştirildiği İncekaralar Firması tarafından bilinmektedir. Klimalar 2007 Temmuz ayında Hacettepe Üniversitesi

Filiz Ersoz



la

Onkoloji Hastanesi önündeki park alanına İncekaraların temsilcisi, Yaşar Andiç ve Ertuğrul Kale eşliğinde yerleştirilmiştir (Ek-40). Ekrem Ateşoğlu malzemelerin teslimatında ve kurulumunda gözetmen olarak bulunmuştur (Ek-34).

Atila Konaç (H.Ü. eski Genel Sekreter): Bütün idari birimler kendilerine bağlı olan yetkili kişidir.

Doç.Dr. Turhan Menteş (H.Ü. eski Genel Sekreter): Bütün idari birimler kendine bağlı olan yetkili kişidir. Sözlü ifadesinde Marubeni Firmasının ismini hiç duymadığını söylemiştir (Ek-9, Ek-14).

Prof.Dr. Tunçalp Özgen (H.Ü. eski Rektör): Proje bilgileri dokümanında da yer aldığı gibi (Ek-42), Hacettepe Üniversitesi adına projeyi yürüten birimin (Rektörlük ve Onkoloji Hastanesi Başhekimliği) yetkili amiri konumundadır. Klimalar Rektörlüğü döneminde Onkoloji Hastanesindeki açık hava koşullarına maruz park alanına yerleştirilmiştir. İnşaat çalışmaları gecikmiş ve teçhizatın gelişyle eş zamanlı yürütülmemiştir. Klimaların Sözleşmeye uygun olarak muhafazası konusunda gerekli takip yapılmamıştır.

Prof.Dr. Uğur Erdener (H.Ü. eski Rektör): Proje bilgileri dokümanında da yer aldığı gibi (Ek-42), Hacettepe Üniversitesi adına projeyi yürüten birimin (Rektörlük ve Onkoloji Hastanesi Başhekimliği) yetkili amiri konumundadır. 2007 Kasım ayında görevi devir aldıktan sonra projenin takibini yetkili birim olarak yapmamış, ilgilileri zamanında yazılı olarak uyarmamış, klimaların yıllarca uygun olmayan açık hava koşullarında kalmasını önlememiştir. Firmayı yazılı olarak uyarmamıştır, sorumlular hakkında işlem yapmamıştır.

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile MARUBENİ EUROPE PLC Firmasından satın alınan 171 kalem; makine, malzeme ve ekipman alımı ile ilgili komisyonumuz tarafından değerlendirme sonuçlarına göre;

2007 yılından itibaren Marubeni Firması tarafından Hacettepe Üniversitesine teslim edilen cihazların kurulacağı alanlardaki inşaat çalışmaları ve cihazların teslimatı eş zamanlı yürütülmemiştir. Bu nedenle birçok cihazın montajı gecikerek, garanti sürelerinde üretici firmalarla sıkıntı yaşanmıştır. Marubeni Firması sözleşmedeki garanti ve montaj gibi yükümlülüklerini bazı cihazlar için (Örn: Sıra No: 150 TRP1 2

Fily Ercaş

Le

adet, Sıra No: 161 TRP12 adet Işınlama sisteminin garanti süreleri, Sıra No: HKS1 Hijyenik klima sistemi vb...gibi) yerine getirmemiştir. Sıra No: 175 HKS1 Hijyenik klimalar için; Üniversitedeki bu projeden sorumlu yetkililer ve cihazın monte edileceği birimdeki sorumlu personel Sözleşmenin 11.10. maddesinin gereğini yerine getirmemişlerdir (Ek-48). "Her ne kadar Marubeninin operasyonel firmasıyız" deseler de, İdari ve Mali İşlerdeki dosya tetkiklerinden de anlaşıldığı üzere Incekaralar firmasının aslında Marubeninin Türkiye Temsilcisi olduğu anlaşılmıştır. Incekaraların başından beri Hijyenik klimaların açık alanda muhafaza edildiğini bildiği ve klimaları muhafaza için naylon temin ettiği Ertuğrul Kale'nin (Ek-27) ve Ekrem Ateşoğlu (Ek-34)'ün ifadelerinden anlaşılmıştır. Ayrıca gümrükten teçhizatlar çekilip Üniversiteye getirilirken Incekaralar Firmasından bir yetkilinin de hazır bulunduğu anlaşılmıştır (Ek-69).

Komisyonumuz tarafından Onkoloji hastanesine 17.05.2012 tarihinde HKS1 ve TRP6 sistemleri ile ilgili yapılan keşif gezisinde klimaların çalışmaz durumda monte edildiği, üzerindeki elektronik kartların olmadığı, elektrik pano kısımlarında belirgin su izleri olduğu ve TRP6 Brakiterapi sisteminde *well-type* iyon odasının olmadığı tespit edilmiştir (Ek-7).

Yaptığımız inceleme sonucunda; konunun mali, idari ve hukuki konuları içerdiği anlaşılmıştır. Şöyle ki, proje, bu satın almada teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması da dahil olmak üzere satın alma yasasına göre ihalesi, sözleşmenin hazırlanması, akreditif açılması, akreditifin mahsubu, 171 kalem makine ve malzemenin gümrük vergilerinin ödenerek gümrükten çekilmesi, Hacettepe Üniversitesi'nin yasal mevzuatına göre geçici olarak teslim alınması ve depoya yerleştirilmesi, daha sonra muayenesinin istenmesi ve ilgili mekanlara monte edilerek çalışır halde muayene işlemlerinin yapılması gibi hususları içermektedir.

Ancak muayene ve kabul aşamasına gelmeden işin başında özellikle teknik ve idari şartnamenin uygulanmamasından kaynaklanan uyuşmazlıklar meydana gelmiştir. Bu anlaşmazlıkların çözümü için küçük girişimlerde bulunulduğu ancak çözülemediği anlaşılmıştır. Olayın hemen akabinde sığağı sığağına, Üniversitenin zararının önlenmesi, sorumlular hakkında yasal işlem yapılması yönüne gidilmediği anlaşılmaktadır.

Fily Erzar



HKS1 Hijyenik klimaların montajının yapılacağı yerlerle ilgili inşaatın gecikmesi, cihazların teslim alımı ve cihazların monte edileceği yerlerin inşaatlarının tamamlanma süreci arasında eşgüdüm olmaması ve dolayısı ile klimaların sözleşmenin 11.10 maddesine aykırı fiziksel koşullarda üç yıl bekletildiği ve bu durumun asıl tedarikçi Weiss Firması tarafından tespit edilerek belgelendiği (**Ek-58a, Ek-58b, Ek-59**) ve elektronik kartlarının bu firma tarafından Üniversiteden izinsiz alınarak incelendiği ve cihazların çalışması ile ilgili sakıncalı raporunun verildiği görülmektedir. Söz konusu HKS1 cihazlarında oluşan hasar ve hazine zararının tespiti amacı ile Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak tespit istenmiştir. Adı geçen mahkeme uzmanlardan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tayin etmiş ve bilirkişi heyetinin verdiği raporda, klimalarda bazı parçaların özelliklerini kaybettiği, bu durumda çalıştırılması halinde etrafa ve hastalara zarar verebileceği ve bu parçaların değiştirildiği takdirde kullanılabileceği belirtilmiştir. Değişmesi gerekli görülen parçaların bedelinin 500.000 TL olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir (**Ek-59**). Konu kapsamında büyük mali yer tutan HKS1 cihazları hakkında yaptıkları tespitleri ve son teknik durumu hakkında bilgi almak ve konuyu aydınlatmada önemli bilgileri olduğu düşünülen ve Marubeni Europe PLC'nin tedarikçisi olduğu öğrenilen Weiss Klimatechnik GmbH ve Türkiye Temsilcisi Beyaz Teknik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. şirketinden Genel Müdür Cemil Memik davet edilmiş ancak davetimize katılmayacağını faks gönderisi ile bildirmiş ve gelmemiştir (**Ek-41**). Telefon yolu ile kendisi aranmış ve haber bırakılmasına rağmen aramamıştır. Klimalar monte edilene kadar Marubeni Firmasının Türkiye Temsilcisi Incekaralar Firması HKS1 klimalarını dış ortamda korumalı hale getirmek için proje hazırlattığı ancak maliyeti nedeniyle vazgeçtiği, bunun yerine cihazları korumak amacı ile örtmek üzere zaman zaman naylon örtüler sağladığı ve örttüğü Gözetmen Ekrem Ateşoğlu tarafından bize bilgi olarak verilmiştir (**Ek-27, Ek-34**). Ayrıca "malzemelerin indirileceği yerin hastane yönetimi tarafından bilindiği, teslimatta kendisinin, Ertuğrul Kale, Meral Kirazlı ve firma yetkilisinin bulunduğu" şeklinde ifade verdi (**Ek-34**).

Bilgi almak üzere Marubeni Europe PLC. Şirketine tebligatta bulunulmuş, şirketi temsilen Danışman İbrahim Ender Kılıç, Avukat Nihan Kaya ve Stj. Avukat Erdem Başgöl 17.07.2012 tarihinde toplantıya katılmışlar ve kendi iddialarını içeren iki adet dosya teslim etmişlerdir (**Ek-61, Ek-62**).

Fatih Esen



La

179 Nolu Nuk3 siklotron cihazının yerinin belirlenemediği, gerekli yer ve montaj hazırlıklarının yapılamadığı ve buna bağlı olarak cihazın hala ambalajı içinde beklediği için kullanılamadığı öğrenilmiştir. General Electric Firması bir kere montaj planı çizmiş ve bir daha ekstra maliyet nedeniyle çizemeyeceğini söylemiştir. Hacettepe Üniversitesi yönetimi, önceki belirlenen alanın kurulum için uygun olmadığını, ruhsat aşamasında sorun çıkacağını belirtmiştir. Tadilat ve bakım anlaşmasına göre Siklotron cihazının monte edileceği yerin inşaatının Somut Firması tarafından yapılması gerektiği kanaati oluşmuştur (Ek-53).

Sözleşmenin 6. maddesine (Ek-48) göre 171 kalem malzemenin hepsi teslim edilmedikçe teminatların serbest bırakılmayacağı bilinse de, Prof.Dr. Şuayip Yalçın'ın 28.01.2011 ve Ecz.M. Nejat Ertürk'ün 09.02.2011 tarihli yazılarında geçici kabulleri yapılan cihazların kesin teminatlarının %50'sinin serbest bırakılması istenerek, Hastaneler Genel Direktörlüğüne ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazmışlardır (Ek-63).

Firma Garanti sözleşmesini, zamanında kurulamayan ya da tam olarak kabul ve muayene protokolü yapılmayan cihazlar için de Sözleşmenin 14.1.d maddesine göre işletmektedir (Ek-48). Oysa sözleşmede cihazların montaj ve çalıştırılmasından sonra garantilerinin başlaması gerekmektedir. Dolayısıyla montajı yapılmayan ya da geç yapılan cihazların garanti ve bakım prosedürlerinde anlaşmazlık çıkmıştır.

Üniversitenin önceki Rektörlerinden Prof.Dr. Tunçalp Özgen (Ek-11a) 04.07.2012 tarihli ve Prof.Dr. Uğur Erdener (Ek-11b) 02.07.2012 tarihli yazılarla bilgilerine başvurmak üzere davet edilmişlerdir. Prof.Dr. Tunçalp Özgen 03.09.2012 tarihine kadar Ankara dışında olacağını yazılı olarak bildirmiştir. Prof.Dr. Uğur Erdener ise tebligatın gittiği günlerde telefon ile soruşturma komisyonu başkanını arayarak, önceki Rektör olduğunu, bilgisine yazılı olarak başvurulursa memnun olacağını ifade etmiştir. Projeden sorumlu birimler, tutanaklara ve belgelere Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve H.Ü. Onkoloji Hastanesi Başhekimliği olarak geçmiştir. Ayrıca gözetmen Ekrem Ateşoğlu'nun söyledikleri de idarenin her şeyden haberdar olduğu yönündedir (Ek-34).

Sonuç olarak; Marubeni Europe PLC. Firmasından ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile satın alınan 171 kalem malzeme kapsamında bulunan HKS1 klimalarının kullanılamaz durumda olduğu ve

Fahri Erar



cihazlar vaktinde kurulamadığından dolayı bugüne kadar kemik iliği ünitesinde hasta kabul edemedikleri ve ihtiyaca gereği gibi cevap veremedikleri anlaşılmıştır. Burada hem hasta kabul edememekten, hem de klimalar kullanılamaz durumda olduğundan dolayı iki türlü kamu zararı oluşmuştur.

Marubeni Europe PLC. ile görüşmelerin netice vermemesi sonucu, 02.08.2001 tarihli Üniversitemiz ile söz konusu firma arasındaki sözleşmenin feshi, kesin teminatın irat kaydedilmesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığının 04.07.2012 tarihli yazısından anlaşılmıştır (Ek-66). Bunu takiben Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne yazdığı 25.07.2012 tarihli yazısında Firma hakkında bir yıl süre ile bütün ihalelere katılma yasağı Ek-67'de verilen T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nün 30.07.2012 tarihli ve 19157 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazdığı yazıdan anlaşılmıştır.

SONUÇ:

Projenin ihalesinin tamamlanmasından sonraki süreçte;

Kabul ve muayene protokolü yapılan veya hala çalışmasında, kurulumunda, garanti sürelerinde ve aksesuarlarında problem bulunan makineler veya malzemelerle ilgili tutanaklarda imzası bulunan, yazışmaları gerçekleştiren veya projenin yürütülmesinden veya işleyişinden sorumlu olan;

1. Prof. Dr. Tunçalp Özgen (Proje ile ilgili işlemleri yürüten birim amiri ve H.Ü. Rektörü)
2. Prof. Dr. Uğur Erdener (Proje ile ilgili işlemleri yürüten birim amiri ve H.Ü. Rektörü)
3. Prof. Dr. Tezer Kutluk (Proje ile ilgili işlemleri yürüten birim amiri ve Onkoloji hastanesi Başhekimisi)
4. Prof. Dr. Şuayip Yalçın
5. Prof. Dr. Fadıl Akyol
6. Prof. Dr. Macit Arıyürek
7. Ecz. Nejat Ertürk
8. Ertuğrul Kale
9. Meral Kirazlı

Fatih Ercan


Jan

10.Demet Yıldız


11.Sabri Üstün

isimli kişilerin, malzemeleri görmeden teslim almak, eksik teslim almak, uygun saklama koşullarını oluşturmamak, kurumu zora sokan yanlış beyanda bulunmak, kamu malını korumamak, sözleşmenin yürütülmesinin takibinde görev ve yetkilerinin gereğini yerine getirmemekten sorumlu oldukları kanaatine varılmıştır.

Ancak proje sorumluların içinde iki eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü bulunduğundan soruşturmanın, 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 18. maddesinin "Rektörler hakkında soruşturma açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanının kararı ile olur. Bu soruşturma Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri tarafından yapılır... " hükmü uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. 09.11.2012.



Prof. Dr. Filiz Ercan



Prof. Dr. Mutlu Aytemir



Prof. Dr. Canan Hekimoğlu



EL-1

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Müşavirliği

30 Nisan 2012

.../.../2012
GİZLİ

Sayı : B.30.2.HAC.0.61.00.00/LE.SOR.5263 - 1595

Konu : Soruşturma hk.

Sayın : Prof. Dr. Filiz ERCAN
Mühendislik Fakültesi
Fizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile MARUBENI EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanla ilgili ekli listede yer alan malzemeler hakkında Onkoloji Hastanesi Başhekimliği'nin 20.01.2012 tarih ve B.30.2.HAC.0.H3.00.00-159; 26.01.2012 tarih ve B.30.2.HAC.0.H3.00.00- 213 sayılı yazıları ve ekleri ile, Hukuk Müşavirliği'nin 13.02.2012 tarih ve B.30.HAC.06.00/ NA.418 sayılı yazısı ve 14.02.2012 tarih ve B.30.2.HAC.0.H3.00.00.334 sayılı Onkoloji Hastanesi Başhekimliği yazısı ve eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda satın alınan makine, malzeme ve ekipmanın Üniversiteye naklinden itibaren Firmanın, sözleşme ve şartnamede belirlenmiş olan teslim, kurulum, montaj ve deneme süresi ile garanti süresi içerisindeki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmiş olduğu; Bununla birlikte sözleşme ve şartname hükümlerine göre işin tamamlanması sürecinde firmanın taahhüdüne aykırı işlemleri nedeniyle idari şartnamenin 22.maddesine göre süre tanınmak suretiyle yazılı olarak uyarılmadığı, müteahhit firma malzemenin yerleştirileceği (monte edeceği) hacimlerinde yapılması gereken her türlü düzenlemeden (inşaat, tesisat ve elektrik işleri) ve cihazların montajı esnasında olabilecek tüm tadilatın sorumlu olmasına rağmen mahallinin hazırlanmasının inşaat işi olarak düşünülüp başka bir firmaya (somut) ihale edilmek suretiyle idare zararına yol açıldığı bir kısım malzemenin montajının, bir kısım malzeme eksikliğinin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabul protokollerinin düzenlenmesinde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı anlaşılmıştır.

Bu suretle malzemenin atıl kalması ve ekonomik değer kaybına uğratılması ile ihtiyaca rağmen hizmete alınamaması buna rağmen firmanın malzemelerin garanti sürelerinin dolduğu iddialarıyla karşı karşıya gelinmesine sebebiyet verilmiş olması karşısında öncelikle satın alma işleminin akdi ilişkiye uygun olarak yürütülmesi ve takibinden sorumlu personelimizin ve ortaya çıkan idare zararının tespiti ile işlemin yürütülmesinde ve idare zararına sebebiyet verilmesinde kusuru ve ihmali bulunanlar hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53/c maddesine göre ceza ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca, disiplin soruşturması yapmak üzere; Prof. Dr. Ferhun Balkancı Başkanlığında, Prof.Dr. İbrahim Güllü ile Prof.Dr. Ayşe KARS soruşturmacı olarak görevlendirilmişler de sunmuş oldukları mazeretleri nedeniyle Başkanlığınızda Prof. Dr.



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Müşavirliği

Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Soruşturmanın en kısa zamanda tamamlanarak hazırlayacağınız fezleke ve soruşturma raporunun iki suret halinde Rektörlüğümüze gönderilmesini rica ederim.


Prof. Dr. A. Murat TUNCER
REKTÖR

- Ek- 1. Geçici muayene ve kabul tutanakları**
2. Malzeme, makine ve ekipman listesi
 3. 30.03.2012 tarihli 1204 sayılı yazı ve ekleri(4 syf.)
 4. 20.01.2012 tarihli 159 sayılı yazı
 5. 26.01.2012 tarihli 213 sayılı yazı
 6. 13.02.2012 tarihli 418 sayılı yazı
 7. 14.02.2012 tarihli 334 sayılı yazı
 8. 19.04.2012 tarihli 1312 sayılı yazı (9 sayfa)
 9. 19.04.2012 tarihli 773 sayılı yazı (9 sayfa)
 10. Örnek soruşturma belgeleri

Dağıtım

Gereği İçin:

- Prof. Dr. Filiz ERCAN (Mühendislik Fak. Fizik Müh. Böl.)
- Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU (Diş Hekimliği Fak. Protetik Diş Tedavisi Böl.)
- Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR(Eczacılık Fak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Bilgi İçin

Personel Dairesi Başkanlığı (ek yok)



Ek-1

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Müşavirliği

Sayı :B.30.2.HAC.0.61.00.00/LE.SOR.5263 247

01 Haziran 2012
.../05/2012
GİZLİ

Konu : Soruşturma hk.

Sayın : Prof. Dr. Filiz ERCAN
Mühendislik Fakültesi
Fizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

İlgi : 30.04.2012 tarih ve 5263-1595 sayılı yazınız.

Hastaneler Genel Direktörlüğü'nün 23.05.2012 tarih ve 1707 sayılı yazısı ve eki ilgi sayılı yazımız uyarınca, Başkanlığınızdaki soruşturma komisyonu tarafından yürütülmekte olan ceza ve disiplin soruşturmasında incelenmek ve değerlendirilmek üzere ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.


Prof. Dr. A. Murat TUNCER
REKTÖR

Eki: 23.05.2012 tarih ve 1707 sayılı yazı ve eki (13 syf.)



Ek-2

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Müşavirliği

Sayı : B.30.2.HAC.0.61.00.00/LE-Sor.5263 3076

11.07.2012
GİZLİ

Konu : Soruşturma hk.

Sayın : Prof.Dr.Filiz ERCAN
Hacettepe Meslek
Yüksekokulu Müdürü

İlgi : a) 30.04.2012 tarih ve SOR/5263 sayılı yazımız.
b) 29.06.2012 tarih ve 2590 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız üzerine yürüttüğünüz disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturma süresinin ilgi (b)'de kayıtlı yazınızda belirtilen talebiniz doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 22.maddesi hükmü uyarınca 2 ay uzatılması uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi rica ederim.


Prof.Dr.A. Murat TUNCER
REKTÖR



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE/ANKARA

Sayı : HAC.0.70.01.00/ 2590

29.06.2012

H.Ü. Rektörlük Makamına,
(Hukuk Müşavirliği)

İlgî : HAC.0.61.00.00/LE.SOR.5263-1595 30 Nisan 2012 sayılı yazınız

Konu : Soruşturma Hk.

İlgi yazı ile, Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipman alımı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım. Dosyanın kapsamlı olması nedeniyle, soruşturmanın yasal süresi içinde bitirilmesi mümkün olmadığından soruşturmanın tamamlanabilmesi için komisyonumuza, iki aylık sürenin bitmesini takiben iki ay ek süre verilmesini saygılarımla arz ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GENEL SEKRETERLİK

06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: 0 (312) 306 6142 - 305 1003 - 04
Faks: 0 (312) 311 0232
E-posta: gensek@hacettepe.edu.tr
www.hacettepe.edu.tr

Sayı: B.30.2.HAC.0.70.00.00/LE-Sor.5263.4532

27 Eylül 2012
... / 09 / 2012
GİZLİ

Sayın : Prof.Dr.Filiz ERCAN
Hacettepe Meslek
Yüksekokulu Müdürü

İlgi : a) 30.04.2012 tarih ve LE-SOR.5263-1595 sayılı yazımız.
b) 12.09.2012 tarih ve 410-3428 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız üzerine yürütmekte olduğunuz disiplin soruşturması ile ilgili olarak, soruşturma süresinin ilgi (b)'de kayıtlı yazınızda belirtilen talebiniz doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü uyarınca iki ay uzatılması uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Prof.Dr.A.Murat TUNCER
REKTÖR



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı : HAC.0.70.01.00 / 410-3428

12 Eylül 2012

H.Ü. Rektörlük Makamına,
(Hukuk Müşavirliği)

İlgi : HAC.0.61.00.00/LE.SOR.5263-1595 30 Nisan 2012 sayılı yazınız

Konu : Soruşturma Hk.

İlgi yazı ile, Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipman alımı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım. Dosyanın kapsamlı olması nedeniyle, soruşturmanın yasal süresi içinde bitirilmesi mümkün olmadığından soruşturmanın tamamlanabilmesi için komisyonumuza, iki aylık sürenin bitmesini takiben iki ay ek süre verilmesini saygılarımla arz ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan
Soruşturma Komisyonu Başkanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Müşavirliği
06100 Sıhhiye - ANKARA
Sayı : B. 30. 2. HAC. 0. 61. 00. 00/



T.C
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Meslek Yüksekokulu

11.05.2012

Sayı : B.30.2.HAC.0.M2.00.00 / 214
 Konu : Soruşturma Hk.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Makamı'na,

İlgi : B.30.2.HAC.0.61.00.00/LE.SOR.5263-1595 Sayı ve 30.04.2012 sayılı yazınız.

Yukarıda Sayı No'su belirtilen yazınıza istinaden, Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem makine, malzeme ve ekipmanla ilgili soruşturma kapsamında; tarafımızdan yapılan ön incelemede olayın anlaşılabilmesi için;

- 1) **Özellikle** 155 sayılı nolu TRP 6 Brakiterapi sisteminin (kuyu tipi (well-type) iyon odasını da içeren),
- 2) dozimetre sistemlerinin,
- 3) HKS-1 Hijyenik Klima Ekipmanlarının ve ayrıca toplamda 171 adet olduğu belirtilen diğer makine, malzeme ve ekipmana ait Teknik Şartnamelerin (Malzeme listeleriyle birlikte)
- 4) İdari Şartname'nin
- 5) İhale Komisyonu Kararları'nın
- 6) Sözleşme'nin

tarafımıza gönderilmesini ve gerçeğini bilgilerinize arz ederiz.

Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR
 ÖYP Koordinatörü
 Ecz. Fak. Öğretim Üyesi

Saygılarımızla,

 Prof. Dr. Filiz ERCAN
 HMYO Müdür

Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU
 Diş Hek. Fak. Öğr. Üyesi

11.05.2012 tarihinde evrakı elden
 teslim aldım. Sn. Prof. Dr. Murat Tuncer'e teslim



Hacettepe

HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ

Erişkin Hastanesi
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
Onkoloji Hastanesi



B.30.2.HAC.0.HD.00.00/-D- 1595

17.05.2012

Rektörlük Makamı' na,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile Marubeni Europe PLC. firmasından satın alınan 171 kalem makine, malzeme ve ekipmanla ilgili soruşturma kapsamında, talep edilen bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Prof.Dr. Ömer UĞUR
Hastaneler Genel Direktörü

ÖU/cd



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

02 Temmuz 2012

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/421.04-2638
Konu : Soruşturma Hk.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipman alımı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı kararıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Mutlu Aytemir ve Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Söz konusu soruşturmada yapılacak işlemlere esas olmak üzere, HKS-1 (Hijyenik klima sistemi), PET/BT sistemi ve Brekiterapi Cihazının sipariş, teslim ve ödemelerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin tarafımıza ivedilikle gönderilmesini rica ederim.

Filiz Ercan

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı : B.30.2.HAC.0.00.00.01 / 410 - 3034
Konu :

01/08/2012

Rektörlük Makamına,

Marubeni Europe PLC firması tarafından alınan 171 kalem malzeme alımı hakkında açılan soruşturma kapsamında, Soruşturma Komisyonuna bilgi ve belge sağlamak amacıyla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görevli memur Yaşar Andiç ve Hukuk Müşavirliğinde görevli Av.Mehmet Yalçın'ın sözkonusu soruşturma Komisyonumuza görevlendirilmesini saygılarımla arz ederim.

Filiz Ercan

Prof.Dr. Filiz Ercan
Komisyon Başkanı

*Unvanla ilgili bilgileri
gelince Rektör Yard.
Hukuk Müşavirliğine
gönderilecek*

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAZI İŞLERİ ŞEFLİĞİ	
Tarih	6.8-2012
No.	4239

*Hukuk Müşavirliği
İdari Mali İşler Daire Bek.
gönderildi.*

TUTANAK

Hacettepe Üniversitesi
Rektörlük Makamına,

17.05.2012 tarihinde Onkoloji Hastanesi
Başhekimliğinde B.30.2.HAC.0.61.00.00/LE. SOR. 5263/1595
sayılı yazınız kapsamında toplantı yapılmıştır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

Prof. Dr. Mustafa Cengiz



Prof. Dr. Filiz Ercan Filiz Ercan

Prof. Dr. Canan Hekimoğlu Canan Hekimoğlu

Prof. Dr. Mutlu Aytemiz Mutlu Aytemiz

TUTANAK


07.06.2012 tarihinde Prof. Dr. Ömer
Ufuk ve Prof. Dr. Mustafa Cengiz ile
Rektörlük Makamının 30. Nisan. 2012
tarihli ve SOR.5263-1595
sayılı yazısı kapsamında Sıhhiye
Rektöre Yardımcılığında görüşülmüştür.
Toplantıya önce Av. Hale İzbal ve
sonra Av. Gonca Muzat Hanım eşlik
etmiştir. Kısaca yazılacak davet
mektuplarının incelenmesi ve mevcut
sorunlar tespit edilmiştir.

(Onkoloji Hst.)

Başhekimliğe eksik malzeme listesi için

yazı yapılmasına karar verilmiştir.

Filiz Elcan
Filiz Elcan


Mutlu Aytemir


Canan Helimoğlu

TUTANAKTIR


12.07.2012

H.Ü. Rektörlük Makamına,

12.07.2012 tarihinde Doç. Dr. Tuzhan
Mentes ve avukatı ile yapılan bilgilere
başvurama toplantısında; Doç. Dr. Tuzhan
Mentes MARUBENİ ismini ilk defa duy-
dığını, bilmediğini ve hijyenik klimaların
H.Ü. Onkoloji Hastanesi park yerinde durduğunu
bilmediğini ifade etmiştir. Fakat kendisini
temsil eden avukatı bu söyleneni inkâr
edip tutanağa yazdırmamıştır. Bilgilerinize
sunarım.

Saygılarımla
Filiz Ercon
Prof. Dr. Filiz Ercon


Prof. Dr. Canan Hekimoğlu


Prof. Dr. Mutlu Aytemir


TUTANAKTIR

17.07.2012

H.Ü. Rektörlük Matamına,

Ecza. Nejat Ertürk 17.07.2012'de bilpi için davet edildiğinde "İngilizce metnin içeripinin Prof.Dr. Tejer Kutluk Bey tarafından açıklandığını , soruğunun da , doktoru olduğu için fuvendim , imgalama da biz mahsus fözmedim" şeklinde konuştu. Sonra söjel olarak söyledipi ifadeyi "belki ben imgalamamışım dı , belki bizilesi benim taşemi basmıştız" şeklinde depistirdi ve "siz benim söyledipimi depil yapıpımı tabul etmek zorundasınız" dedi. Ayrıca siz burada "savcı pibi" davzanıyorsunuz "pibi kelimeles kullandı. Bilpilesiniye saygılasımla sunarım.

Prof.Dr.Mutluolaytonir Prof.Dr.Filiz Elcan

 Filiz Elcan
 Prof.Dr. Canan Helimoğlu

Prof. Dr. Tuncalp Özgen

Cinnah Caddesi 52/3

Çankaya Ankara 0312 4418585

04 / 07 /2012

İlgi: Hacettepe Rektörlük

B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2629 sayı ve 2 /07 /2012 Tarih

Sayın Prof. Dr. Filiz Ercan

İlgili yazınızla bilgime başvurulmak üzere 17.07.2012 tarihinde Hacettepe Rektörlüğü'nde bulunmam istenmiştir.

Ancak 07/07/2012 tarihinden itibaren yurtdışı ve yurtiçinde olmak üzere Ankara dışında olacağımı ve 3 Eylül 2012 tarihinde döneceğimi bu nedenle belirlenen tarihte bulunamayacağımı bilgilerinize sunarım.



Prof. Dr. Tunçalp Özgen



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2629

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Tunçalp ÖZGEN,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 09:30'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Ek-116

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2630

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Uğur ERDENER,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 10:00'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Filiz Ercan

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Filiz Ercan
Soruşturma Komisyonu Başkanı

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile Marubeni Europe Plc firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipman ile ilgili göreve geldiğim 26 Aralık 2011 tarihinden itibaren H.Ü. Hastaneleri Genel Direktörlüğünce yapılan yazışmalar ekteyir.

Konu ile ilgili kanaatlerim aşağıdadır.

- 1) 2001 yılında yapılan bir ihalenin üzerinden bu kadar uzun süre geçmesine kadar iptal edilmeyip fiyat ve cihaz özellikleri açısından güncelleştirilmeden gerçekleştirilmesinde ısrar edilmiştir.
- 2) 2007 yılında Marubeni firması tarafından Hacettepe Üniversitesine teslim edilen cihazların kurulacağı mekanlarda yapılması gereken inşaat çalışmaları cihazların teslimatı ile eşgüdümlü olarak yürütülmemiştir. Bu nedenle bir çok cihazın kurulumu gecikmiştir.
- 3) Cihazlar montaja kadar uygun koşullarda korunmamıştır (ör: hijyenik klimalar). Hijyenik klimalar bu nedenle zarar görmüş ve çalışmamaktadır.
- 4) Marubeni firması bazı cihazlarla ilgili sözleşmedeki garanti, kurulum gibi yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Firmanın yerine getirmediği bu yükümlülüklerle ilgili Üniversitemiz tarafından firma zamanında uyarılıp yükümlülüklerini yerine getirmesi istenmemiştir.
- 5) Marubeni firmasına muayene ve geçici kabul sonrası teminatı tüm projenin gerçekleştirilmesi sonrası ödenmesi gerekirken, cihaz bazında teminat ödenmesi gerçekleştirilmiştir.
- 6) Marubeni firması tarafından yapılması gereken inşaat işlerinin bir kısmı Üniversitemiz tarafından ücret ödenerek Somut firmasına yaptırılmıştır. Yapı işlerince yapılacak resmi hesaplama sonrası Marubeni firmasından bu miktarın talep edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ömer UĞUR



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/ 410-2608

02.07.2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Ömer UĞUR,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 13.07.2012 günü saat 15:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO :45814549628

ADI VE SOYADI : M.TEZER KUTLUK

BABA ADI : NACİ

DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 1957 ILGIN KONYA

İKAMET ADRESİ : Ahmet Rasim Sk. 10/9 Çankaya

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 532 272 81 23

ÜNVANI : Prof.Dr.

BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük

TARİH VE SAAT : 16.07.2012 – 10.00

O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : 2007 Onkoloji Hastanesi Başhekimliği
2008-11 Hastaneler Genel Direktörü

ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV :

KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE :

Saat 10.00

FE: 2001 yılında ihalesi yapılmış bu komisyonunda varsınız. Daha sonraları Hastane Genel Koordinatörü olarak çalıştınız...

Onkoloji Hastanesi proje çalışmaları 83-85 yıllarında başlamış poliklinik 93 yılında açılabilmiştir. Yataklı kısım ise 2005 yılında açılabilmiştir. İnşaat sürecinin yavaş olması proje yürütülmesini doğal olarak güçleştirmektedir. 2001 yılında 21 Şubat ihale gününde ekonomik kriz çıkmıştır. Doğal olarak bu durum projenin neticelendirilmesinde zorluklar yaratmaktadır. Bunlara rağmen Hacettepe Hastanelerinde yıllık 5.000 yeni kanser hastası tanı almaktadır. Çok sayıda hasta tedavi görmekte olup, kamu yararının gerçekleştiği bir proje olmuştur.

PET-BT çalışıyor sıkıntı yok. Ancak bazı aksesuarlar verilmemesi nedeniyle geçici kabulü verilmemiştir. Nükleer Tıp ABD Başkanlığı ile birlikte bu firmalarla görüşülmüş, GE temsilcisi eksikleri getireceklerini söylemiştir. Sözel olarak getireceklerini taahhüt etmişlerdir. Nükleer tıp lisanslamak için PET-BT'nin olduğunu bildirmiştir. Gelmeyen parça aletin çalışmasına engel değildir. Hastaların yararı için cihaz çalıştırılmıştır.

Fily Ercan

SORU: İncekaralar firması, Hacettepe bir türlü yer göstermedi diyor. Hacim ve alanda siklotron için problem olduğu söyleniyor.

CEVAP: Siklotron için mekan gösterilmiştir. Yer görme belgesi ihaleden önce firmanın bu yeri gördüğünü ve kabul ettiğinin belgesidir.

2008 de malzeme gelmeye başlayınca GE ile siklotron için konuşulduğu zaman yurtdışından GE bir elemanı geldi. Toplantıda lisansta sıkıntı olur mu diye sorulduğunda yerin olacağını ancak zor bir uygulama olduğu söylenmiş, hijyenik lab için mekan içinde değişiklik önerilmiştir. Kolaylık göstermek için PET-BT için başka bir mekan gösterilmiş, böylelikle siklotron için kolaylık gösterilmeye çalışılmıştır. Beytepeye kurulma ihtimali bile konuşulmuştur. Ancak Nükleer tıp ABD, kısa ömürlü izotoplarda sorun olur deyip bunu uygun bulmamıştır. Mevcut mekana yapalım denildiğinde, uygulama projesinin eksik olduğu görülmüş, firma (GE-Marubeni-İncekara) uyarılmıştır. Bu nedenle uygulama projesi yaptırılmıştır. Firma uygulama projesinin maliyetini üstelenmiştir. Bu zaman almıştır. Uygulama projesi geldiğinde Yapı İşlerine gönderilmiştir. Siklotron kurulum ile ilgili olarak Nükleer Tıp ABD Başkanının koordinasyonunda defalarca toplantı yapılmış, proje başlama aşamasına gelmiş ancak bu sırada hastane yönetimi ve üniversite yönetimi değişmiştir.

SORU : Klimalar için ne düşünüyorsunuz. Firma defalarca üniversiteyi uyardığını, bu klimaların burada muhafazası konusunda uyarıldığını söylüyorlar.

CEVAP: Teknik şartname, idare şartname ve sözleşmede "cihazı bütün hava şartlarına dayanıklı olacak şekilde saklamak zorunda demektir. O alana indiren ve üzerini naylonlayan da örten de firmadır. Bir uyarı olsa idi cihaz onların istediği gibi bir yere alınırdı. Klimada hukuksal yola gidilip, firmadan tazmin etmesi istenmelidir. Bütün hava şartlarına ibaresi vardır hasara, darbe karşı korumalı diyor. Malzemelerin montajı yapıldıktan sonra teslimatı kadar herşeyden firma sorumlu. Sonuçta geçici kabul imzalanmamıştır. Şartnamelere göre "teslim" demek geçici kabul demektir.

Soru: Firma 3 yıl bekledi. Sözleşmede nakledilirken 4 ay süresi boyunca hava koşullarında korumak bize aittir, diyor. Sonraki zamanda kurulana kadar geçen sürede sözleşmede 11.10'da korumak idareye aittir diyorlar ve üniversiteyi uyardıklarını söylüyorlar.

CEVAP: Hayır zamanında uyarılmadık. Uyarsalardı başka bir yere alınırdı. Oraya koyanlar kendileri. Örneğin Lineer akseleratörler için yer konusu olunca hastane depo (Antrepo) kiralamıştır ve cihazlar bugün çalışmaktadır. Aynı şey klimalar içinde söz konusu olabilirdi. Ancak firmanın erken bir uyarısı söz konusu değildir.

Soru: Yıpranmış ambalajlar sökülüp keşke klimalar monte edilmeseydi. Ambalaj açılmasaydı. O şekliyle klimalar iade edilseydi. Niçin kuruldu?

Geçici kabul yok. Cihazlar aşağıda uygun yerde değil denince yukarıya yerlerine konulmuştur. Weiss haberi olup olmadığını bilmiyorum. Bahçede durmasın denildi, cihazlar yerine konuldu ve çalıştırılmadılar. Bu arada Kemik iliği servisinin inşaatı sürüyordu. İnşaat tamamlandığında muhtemeldir ki hukuksal bir yola gidilecek idi.

Fatih Ercan
Lanet
[Signature]
[Signature]

SORU: FE: Elektronik kartlar sökülmiş. Birileri gelip kartları alıyor. Test ediyorlar. Bu olay nasıl mümkün oluyor?

CEVAP: Konuyu şöyle anlamak gerekiyor. Firma malzemeyi her türlü koşula dayanıklı halde ambalajlamamış, geçici kabulü verilmemiş, sözleşmeye göre cihazlarını çalıştırmamışlardır. Sorumlu oldukları halde hem cihaz uygun yerde değil diyorlar, arızalı diyorlar hemde çalıştırmıyorlar. Kendilerinin gelip cihazlarını değiştirmeleri gerekiyor. Kartı götürdüklerini bende bilmiyorum. Klimalarla ilgili olarak yüklenici firmanın tazmin etmesi gerekmektedir.

SORU: Sözleşmede 11/10, 11.2 planlar 11.3 firmanın sorumlulukları ile ilgilidir. 11.8'e göre inşaattaki gecikmeler teslim süresine eklenir demektedir.

CEVAP: Sözleşmede 7/2 firmanın sorumlulukları ile ilgilidir. Cihazı o mekana indiren kendileri. Hasar olduğu kanatından sonra uyardılar. Daha önce bu yer uygun değil demediler. Zamanında erken ve doğru bir uyarı alınsa idi, lineer akseleratör gibi önlem alınabilirdi. Kartların gitmesinden haberim yok. Kemik iliği servisi hazır olmadığı için hukuksal sürece başlamadık. Olasıdır ki yönetim değişmese idi, yine hukuksal sürece gidilecek idi.

Firmanın aletine sahip çıkması gerekiyordu. Bizi uyarmadılar. Mevcut olan mekan kemik iliği servisi değildi. Bu servisi boşaltık, yerini hazırlamayı başlattık. Açsak daha çok hasta alabilirdik.

Teminatlarla ilgili konuları bilmiyorum. Firma talep ediyor idari mali işler devreye giriyor. Ben mali tarafın detayında bilmediğim konular olabilir. İnşaatlarla ilgili denetimler görev gereği yapı işleri dairesi başkanlığıca yapılmaktadır.

SORU : FE: Brakiterapi cihazı ile ilgili olarak, geçici kabulü yapılmış, eksik malzemeler var. Well type iyon odası ve başka diğer iki attachment yok. Kabul edilen cihazlarla ilgili olarak Cihaz açılırken başında bekleyen ekip var mı?

Firma cihazı hastaneye getiriyor. Açıldığı zaman eksik varsa ilgili bölüm kabul imzasını atmamalıdır. Sonuçta firma cihazı çalıştırana kadar, geçici kabul yapılmamalıdır. İlgili Fizikçi neden imzaladı bilmiyorum. Belki cihaz çalışıyor, kesin kabule kadar eksik getirilir diye düşünmüşlerdir, ama benim bu konuda bir bilgim yok. Sonuçta eksik varsa kesin kabul de yapılmamışsa firmadan eksik olan cihazlar talep edilmelidir. Cihazın gelmediğini yeni duydum. İlgili bölüme de sorulmalıdır.

2007- 2008 de malzemeler gelmeye başladı, yataklı kısım açıldı, CT, MR, Mammografi gibi çok sayıda cihaz çalışmakta ve insanlar yararlanmaktadır.

Soru: Siklotron için Lisans verme koşulları ve sınırları keskin ve bayağı zor. Hastanede onların istediği gibi bir alan zor. O yüzden Beytepe düşünüldü mü?

Beytepe düşünüldü, Nükleer Tıp ABD uygun bulmadı. Planlanan mekana kurulması için Anabilim dalı ile defalarca toplantılar yapıldı. Burda firmayla hukuksal bir çatışma durumuna gelinmedi. Uyarılarda bulunuldu. Uygulama projesi yapıldı. Uygulamaya başlanacağı sırada yönetim değişti.

Üniversitenin üstüne düşen gereken titizliği göstermiştir. Sorunlu kalemlerden klima, Siklotron gibi kalemler firmanın sorumluluğundadır.

SORU: FE: Klimalar olmadığı için daha az hasta kabul ediyoruz gibi bir durum var mı?

Fatih Ercan *Lance* *[Signature]* *[Signature]*

Mevcut alan kemik iliği servisi değildi, Kemik iliği nakline ihtiyaç olduğu için var olanı azaltmadık yeni bir alan açtık. Daha fazla hasta yarar görsün diye. İnşaat bitme noktasına yaklaşmıştı ancak tamamlanmadan Aralık 2012'de yönetim değişti.

SORU : PACS lerle ilgili garanti sözleşmesi bitmeden yeniden bakım onarım anlaşması yapıldığına dair bir durum olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında bilginiz var mı?

Cevap: Bilmiyorum.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN



Bilgi Veren


Prof. Dr. Tezer Kutluk



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2621

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Tezer KUTLUK,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 16.07.2012 günü saat 10:00'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

12 Temmuz 2012

Sayın Prof. Dr. Filiz ERCAN,
Soruşturma Komisyonu Başkanı

İlgi : 2 Temmuz 2012 tarih ve 410 - 2639 sayılı yazınız.

Konu : İlgi yazınız ile bildirilen hususlarda müvekkilimin beyanlarını sunabilmesi için bilgi ve belge istenilmesi Hk.


Ekte sunulan vekâletnamenin incelenmesinden de görüleceği üzere Prof. Dr. Turhan Menteş'i temsile tam yetkili vekiliyim.

Müvekkilime hitaben yazılan ilgili yazınızda, "Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmını teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksiklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof. Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof. Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım" denildikten sonra, müvekkilim konu ile ilgili olarak bilgisine başvurulacağı belirtilerek 12.07.2012 günü saat 11:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı salonunda hazır bulunmak üzere davet edilmiştir.

İlgi yazınızda belirtilen konu ile ilgili olarak müvekkilim bilgi sahibi olmadığından, ilgi yazınızda atıfta bulunulan Yasa ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde müvekkilime söz konusu dosyadan örnek verilmesi halinde, müvekkilim söz konusu belgeleri inceledikten sonra beyanlarını sunacaktır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Turhan Menteş
Adına Vekâleten
Av. Metin Kayaçağlayan



Eki : 1 adet oraylı vekaletname örneği.

21 Mayıs 2012

T.C.
ANKARA
55. NOTERLİĞİ

GENEL VEKALETNAME

VEKİL EDEN : TURHAN MENTEŞ

Üniversiteler Mah. 1637 Cad. 1/22 Çankaya/Ankara
T:05327037750VEKİL : Av. METİN KAYAÇAĞLAYAN 26794730862 T.C. Kimlik Nolu
Uğur Mumcu Cad. No:37/1 Çankaya AnkaraANKARA 55.
NOTERİ

AYSEN SARIYÜCE

BİLKENT PLAZA A-3
BLOK NO:53
ÇANKAYA/ANKARA
Tel : 0312 2661482
Fax: 0312 266 14 81

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarık ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, Avrupa İnsan hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK'nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, davadan feragatle, feragati kabule, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezuun ve yetkili olmak üzere Ankara barosu avukatlarından 26794730862 T.C. Kimlik Nolu Av. METİN KAYAÇAĞLAYAN vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN : TURHAN MENTEŞ T.C. No : 10185178944



Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği, Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 11.7.2007 tarih, 34845 kayıt, F11 seri ve 492845 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Yalova ili Yalova Merkez ilçesi Güneyköy mahallesi / köyü 14 cilt, 76 aile sıra, 14 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Abdül Halim, ana adı Sadiye, doğum tarihi 1.4.1955, doğum yeri Yalova olan ve halen Üniversiteler Mah. 1637 Cad. 1/22 Çankaya/Ankara adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 10185178944 T.C. kimlik numaralı TURHAN MENTEŞ, adli kişiye ait olduğunu ve dairede huzurunda imzalandığını onaylarım. İkibinoniki yılı Mayıs ayının yirmibirinci günü 21.05.2012

ANKARA 55. NOTERİ
AYSEN SARIYÜCEASLI GİNDİR
Av. Metin KAYAÇAĞLAYAN

TUTANAK


12 Temmuz 2012

Saat : 11:30


12 Temmuz 2012 tarihinde Dr. Turhan MENTEŞ ve vekili Av. Metin KAYAÇAĞLAYAN daha önce belirlenmiş saatte soruşturma kurulu tarafından belirlenmiş salona gelerek, bir dilekçe ve ekinde vekâletname ibraz ettikten sonra, ilgi yazıyla gündeme getirilen konularda beyanda bulunulabilmesi için dosya içeriğinin tüm örneği 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2 ve T.C. Anayasasının 36. maddeleri uyarınca taraflarına ibraz edilmesi talep edilmiştir.

Dr.Turhan MENTEŞ'in Av. Metin KAYAÇAĞLAYAN'ın talebi değerlendirilmek üzere komisyon tarafından alınmıştır.


Dr. Turhan MENTEŞ




Av. Metin KAYAÇAĞLAYAN




Prof.Dr. Filiz ERCAN



Prof.Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof.Dr. Mutlu AYTEMİR



02.07.2012


Sayı : B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2639

Konu : Soruřturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Turhan Menteř

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlölüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediğı halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inřaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiğı, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiğı, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğı hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruřturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 12.07.2012 günü saat 11:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.



Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruřturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO :10024188240
 ADI VE SOYADI : A.Faruk ZORLU
 BABA ADI : Mehmet Faik
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 9.5.1957-TOKAT
 İKAMET ADRESİ : Nihavent Sokak A2/6 Angora Evleri Mutlukent
 Mah. Çankaya 7 ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 225 28 27 0532 784 36 44
 ÜNVANI : Prof.Dr.
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu
 TARİH VE SAAT : 13 Temmuz 2012
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) :
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV :

KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU; İmmunohistokimya ve Flow Stometri Sort cihazıyla ilgili kabul komisyonunda uzman üye olarak imzanız var.

Marubeni ihaleyi aldı ve ihale devlet garantörlüğü ile ilgili bir takım olumsuzluklar nedeniyle gerçekleşemedi. Aradan uzun yıllar geçti. Ben 2006 mayıs anabilim dalı başkanı olarak geldim. İhale artık gerçekleşmeyecek diye düşünürken tahmin ediyorum 2007 sonu gibi Marubeni ihalesinin gerçekleşebileceği bilgisi bize verildi. 2008 yılında ihale ile ilgili bizim bölümü ilgilendiren maddelerin güncellemesiyle uğraştık. Bizim bölümü ilgilendiren cihazları satan firmaların bazıları el değiştirmiş, çoğu cihazın teknolojisi eskimiş. Bunları güncellemek ve olabileceğin en güncelini yakalayabilmek için uğraştık. İhale gerçekleşince cihazların yer sorunu olacağı için üniversitemiz idaresi ile bu konular halledildi. 2008 yılında Anabilim dalı başkanlığını bıraktım. Sonrası için bir fikrim yok.

Bazı cihazların geçici kabulleri yapılmış, bazıları yapılmamış, firma montaj yapmadığı halde süreç uzun olduğu için malın teslimini geçici kabul ediyor. Kabul komisyonunda cihazların sağlam alındığına dair belgeler var.

Fahri Ercan

Emek

for

O konuda benim bilgim yok. Anabilim dalı başkanlığını bıraktıktan sonra part time çalışmaya başladım, idari sorunlarla ilgim olmadı. Bizim kullandığımız cihazlarda çok fazla parçalı ve karışık/karmaşık cihazlar olduğu için onlarca ambalajlı kutu ve içlerinde yine onlarca ayrı ambalajlı birimler olur. Firma kutuları gelir açar montajını yapar, çalışır hale getirir bizim elemanlarımız kontörlünü yapar ve geçici kabul süreci başlar. Üniversitenin sorumluluğu gelen kutuların uygun şekilde muhafaza edilmesidir. 4 – 5 tır kutu geliyor onlar açılıyor. Yurtdışından gelen montaj ekibi o kutuları açıyor. Bizim görevimiz cihazı çalışır biçimde teslim almaktır. Bu süreç teknik servisin sorumluluğundadır. Çalışır durumda bize teslim etmekle yükümlü firmanın elemanı cihazı bize teslim edene kadar cihazdan sorumludur.

Well-type iyon odası hakkında bilgim yok. Klimalar hakkında işleri geciktirdiğini duydum .

Soru: İnşaatı hazır olmayan bir malzeme neden alınmış?

Cevap: Hastanenin yöneticilerinin bu ihale süreciyle alakalı umudu kalmadığı için böyle bir problem oluştuğu düşüncesindeyim.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN



Bilgi Veren


Prof. Dr. A. Faruk ZORLU



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/ 410-2622

02 ~~1~~ 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Faruk ZORLU,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 13.07.2012 günü saat 17:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 46399492736
 ADI VE SOYADI : Ayşegül ÜNER
 BABA ADI : Orhan
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 30.9.19637/İZMİR
 İKAMET ADRESİ : Mesa Koru Sitesi Mine Blok No:25
 Çayyolu/ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 312 240 65 34 / 305 29 50
 ÜNVANI : Profesör
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Odası
 TARİH VE SAAT : 12.7.2012/ 17:30
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Tümör Patolojisi Bilim Dalı Başkanı
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Tümör Patolojisi Bilim Dalı Başkanı

KONU :
 MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap: Bu Otomatik İmmunohistokimya Boyama Cihazı 16.4.2009 da kuruldu. Cihazla ilgili birçok kez sorun yaşadık. Bu aletin Türkiye'deki temsilcisi olan BIOS firması bu sorunların giderilmesi konusunda yardımcı oldu ve teknik servis verdi. En son problemlerin kaynağı olarak görünen tepsi 28.07.2011 tarihinde değiştirilerek sorun tamamen çözüldü.

Bu kapsamda yaşadığımız bir diğer problem de teknik şartname kapsamında verilmesi vadedilen 4000 tane saptama kiti ile ilgili yaşandı. BIOS şirketi ilk 1500 tancesini teslim ettikten sonra 'Geriye kalan kitleri vermeyeceğiz, sizin muhatabınız İncekaralar şirketi' dedi. Onkoloji Hastanesi Müdürü Meral Hanıma durumu bildirdik (Ocak 2012). Kendisinin ve Prof. Dr. Mustafa Cengiz'in gayretleri ile İncekaralar tüm kitleri teslim etti (20.03.2012). Bu kitlerin yarı ömürleri kısa olduğundan BIOS firmasına bu kitler borç olarak verildi ve ihtiyaç oldukça kendilerinden temin edilebileceğine dair bir belge alındı (kopyası komisyona teslim edildi).

Fulya Erkan

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Cihazın garanti süresi dolduktan sonra 05.09.2011 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. Alet son 1 yıldır Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Tümör Patolojisi Bilim Dalında aktif çalışır durumdadır.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN



Bilgi Veren


Prof.Dr. Ayşegül ÜNER



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bios

Küçükyaşı Y.D. 168 006 60 41

BYAQI:
Bios Biomedikal Sistemler
San. ve Tic. Odası.
Güneşli İmkan Sok. Nispetiye/Beşiktaş/İstanbul
H. Fışk. No: 14 / Marmara - 15146BİL.
Tel: (0212) 519 72 11 Fax: (0212) 519 72 82
E-posta: biyod@biyod.com.tr

Prof. Dr.
Ayşe Gül İnünce



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410 - 2613

02 ~~tem~~ 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Ayşegül ÜNER,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat. ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 12.07.2012 günü saat 17:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 23503890954

ADI VE SOYADI : ŞUAYİB YALÇIN

BABA ADI : ALİ

DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 20.02.1964 TİREBOLU

İKAMET ADRESİ : BAYRAKTAR MAH. İKİZDERE SK.
ELİTEVLER SİTESİ
C BLOK 19/1 GOP / ANKARA

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0505 378 06 39 - 446 49 96

ÜNVANI : PROF.DR.

BİLGİNİN ALINDIĞI YER : REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU /
ANKARA

TARİH VE SAAT : 16.07.2012

O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : BAŞHEKİM YARDIMCISI – BAŞHEKİM
VEKİLİ- BAŞHEKİM

ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : TIP FAKÜLTESİ - İÇ HASTALIKLARI –
ONKOLOJİ ÖĞRETİM ÜYESİ

KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap:

S: Brakiterapi sistemi kabul komisyonunda (Onkoloji Hastane Başhekimliği) imzanız var, 2001 döneminde göreviniz nedir?

C: 2001'de idari görevim yoktu.

S: Brakiterapi sisteminin geçici kabulü yapılmış, fakat Well-Type İyon odasının olmadığı tespit edilmiş, sizin bazı cihazların kabulünde imzanız olduğu için bilginize başvurduk. Rektörlüğe yazılan dilekçede bu cihazın welltype iyon odasının olmadığına dair dilekçe yazılmıştır.

C: İlgili birimlerden tamam denildiğinde ve herkes imzaladıktan sonra ben imza attım. Benim bilgin dahilinde eksiklik olduğunu bilseydim imzalamazdım.

Fatih Ercaz *[Signature]* *[Signature]*

S: 2010 da kurulmuş, 2012 welltype iyon odasının olmadığı farkedilmiş, teknik şartnamede bunlar var. Demet hanım 3 attachmentın olmadığını söyledi.

C: Aynı şekilde ilgili birimlerden tamam denildiği ve imzalandığı için en son ben imzalamışım.

S: Eski cihazın bakım onarım anlaşması devam ediyormuş, eskisinde daha farklı geniş skalada hastalar kabul ediliyormuş, iki yıl cihaz kurulu durmuş ve iyon odasının olmadığı da anlaşılmamış.

C: Bilgim yok.

S: Bazı cihazların kabul yazıları yok bilginiz var mı?

C: Bu konuda bilgim yok.

S: Bu ihalede klimalarla ilgili sıkıntı hakkında bilginiz?

C: Klimalarla ilgili sorundan sonradan haberim oldu, ilgili firmadan gelen malzemelerin uygun şekilde kendilerinin bizzat gözetiminde yerleştirilmiş olduğunu biliyorum. Hassas cihazlar ve hastanede yer olmayan malzemeler için ayrıca bir antrepo kiralanmıştı.

S: Firma 2007 de klimaları onkoloji hastanesine getirmiş. 3 yıl açık havada duruyor, Weiss sorumluluk almıyor. Firma üniversiteyi uyardığını söylüyor, cihazları kuramam, fotoğraflar var ambalajlar su almış, bu şekilde cihazlar kuruluyor, ambalajlar açılmadan iade edilseydi olmaz mıydı?

C: Daha önce hiç uyarı olmadı, 1 kez haber verildiğinde hemen gereği yapıldı, içeri alındı. Çalışmadığı bozuk olduğu bilinmiyordu

S: Elektronik kartları götürmek istediklerini söylediler mi?

C: Benim bu konuda bilgim bulunmamaktadır.

S: Firma cihazı çalıştırmadan cihazın çalışmadığını nereden biliyor?

C: Kimsenin bunu bilme durumu olamaz.

S: Malzemeler indirilmiş, 3 yıl beklemiş, kurulmuş, mekanik aksamı bağlanmış, Beyaz firması inşaatı Somut firmasına yaptırmış, 3 tanesi Beyaz firması tarafından kurulmuş, odaların anahtarları hangi firmada duruyor?

C: Bu kapıların ve yapıların bir inşaat süresi var. Her aşamada firma hastanede mevcuttu. Firmanın cihazlara erişimi mümkündü.

S: Aletlerin montajından haberiniz var mıydı?

C: Montajdan çok yerine yerleştirildiğini biliyorum, güvenlik nedeni ile yerine alınma kararı olduğunu biliyorum. Şu zaman şu yapılacak kısmını bilmiyorum.

S: Bu klimalar kurulsaydı hasta kabul sayımız artacak mıydı?

C: Klimalar kurulsaydı, yoğun bakım, kemik iliği çalışabilir hale gelebilirdi

S: Marubeni firmasıyla üniversitemiz bir sözleşme imzalıyor. 5 firma ortaya çıkıyor fonksiyonları nedir? İncekara operasyon, beyaz teknik, somut, Weiss, Marubeni?

Fatih Ercan

C: 2001 de yapılan bir ihale, Marubeni'nin deęişik konularda birçok firmadan tedarik aldığını ancak ihaleden üniversitemize Marubeni'nin sorumlu olduğunu biliyorum.

S: Sözleşmeyi böyle yapmışız ama somut firmasına neden para ödeniyor, sözleşme Marubeni ile yapılmıştır?

C: Bu amaçla ayrıca para ödendiğini bilmiyorum.

S: Başkaca bize yardımcı olacak bilgi ve belge var mı?

C: İhale 2001 yılında başlamış 2012 kadar gelmiş ama sonuçta birçok detay var, büyük çoğunluğu tamamlanmış, hastane faaliyete geçmiş.

S: Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

C: Burada bazı sorunlar olabilir ama sonuçta çok büyük bir proje gerçekleştirilmektedir. Ülkenin koşullarından da kaynaklanan sorunlar var, isteyerek bir şey olduğuna inanmıyorum, kurumumuzda çalışan herkesin kurumun çıkarına göre davrandığına inanıyorum, göze çarpan bir hata olsaydı herkesin ona engel olacağına inanıyorum. Her iş uzun dönemde birçok nedenlerden ötürü sorunlar yaşayabilir ama sonuçta ülkemizde örnek hale gelmiş bir onkoloji hastanesinin kurumumuza yakışır olduğunu inanıyorum.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

PROF.DR. SUAYİB YALÇIN





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/ 410 - 2620

02 TEMİZ 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Şuayip YALÇIN,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 16.07.2012 günü saat 11:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 34171948366
 ADI VE SOYADI : Erol BELGİN
 BABA ADI : Mehmet Refik
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 24.04.1947 - Konya
 İKAMET ADRESİ : Melis Sitesi B Blok 37 Ümitköy –ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 312 235 48 00 – 532 211 25 33
 ÜNVANI : Prof.Dr.
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Hacettepe Rektörlük Toplantı Salonu Sıhhiye -
 TARİH VE SAAT : 17.12.2012 Saat: 10:10
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Rektör Yrd.
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : KBB Öğretim Üyesi
 KONU :
 MARUBENİ'den alınan 117 kalem hakkında.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap: Ayrıntıya giremeyeceğim, çünkü o kısmını pek hatırlayamıyorum. Hatırladığım konu sadece kredinin düzgün gelmemesinden dolayı Marubeni firması ile sıkıntılar yaşandı. Çok fazla bilgi hatırlamıyorum. Ancak toplantılarda konuşulan bu sıkıntının giderilemediği, ondan kredinin sağlanamaması gibi konular vardı.

Dediğim gibi sonraki süreci pek bilmiyorum. Bu proje hibe değil, dış kredi ile desteklenmiştir ve Üniversite bunu ödeyecektir (emin değilim.) . Yüksel Beyin son döneminde başlayıp yaklaşık 18 yıl süren bir süreçtir bu.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı malzemeyi teslim aldıktan sonra , bu cihazlar onların kontrolü altında oluyor, denetlemesi de bunlar tarafından yapılıyor. Teknik tarafı ile hiç ilgilenmedim, ondan sonrası safhasını pek bilmiyorum.

Eskiden taşınır kayıt yoktu. Mutemedin zimmetine geçiriliyordu. Mutemetler ilgileniyordu.

Ayrıca ben 2007 yılında Kasım ayında görevden ayrıldım. Sonraki gelişmeler hakkında bir bilgi sahibi değilim.


Fatih Erkan
Ranex

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Prof.Dr. Erol BELGİN





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı : B.30.2.HAC.0.00.00.01/410 - 2801
Konu :

12 / 7 / 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Erol BELGİN,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 10:10'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 11224149598
ADI VE SOYADI : Orhan Macit ARIYÜREK
BABA ADI : Ahmet Sacit
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 01.01.1956
İKAMET ADRESİ : Galip Dede Sokak 9-6
 Çankaya – ANKARA

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 532 466 50 65
ÜNVANI : Prof. Dr., Öğretim Üyesi
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu
TARİH VE SAAT : Saat: 19:30, 16 Temmuz 2012
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011): Öğretim Üyesi, Anabilim Dalı Başkanı
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Öğretim Üyesi, Anabilim Dalı Başkanı

KONU :
MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında.


Brakiterapi sistemi 13 Aralık 2010 Kabul Komisyonu Üyesi (Uzman Üye)

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap: Biz Hastanede çalışırken imza için bir dosya karşımıza geliyor, Şuayip Bey'in ve Fadıl Bey'in imzası olduğundan dosyada tanımlanan cihazların doğru şekilde alındığını kabul ediyoruz.

Onkoloji Hastanesinin cihazları Radyolojiyi ilgilendirmemektedir. Brakiterapi cihazının Radyoloji ile hiçbir alakası yoktur. Bu cihazın nasıl çalıştığını bilemeyeceğimiz gibi bir eksisinin olup olmadığını da anlama şansımız yoktur.



Komisyon Başkanı Şuayip Bey görülüyor. Şuayip Beyin ilgili kişileri toplayıp cihazlar ile ilgili eksikliklerin olup olmadığını öğrendikten sonra imza açması gerekiyordu. Bu konu ile ilgili komisyon toplanmadan imzaya açılmıştır. Diğer kişilerin imzasının olması nedeniyle cihazların doğru alındığına inanarak imza atılmıştır.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Bilgi Veren

Prof.Dr.Orhan Macit ARIYÜREK



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410 - 2628

02 TEMİZ 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Macit ARIYÜRÜK,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 16.07.2012 günü saat 16:00'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 48508411652
 ADI VE SOYADI : Osman Koray BODUROĞLU
 BABA ADI : Mehmet Haluk
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 10.04.1964 - Eskişehir
 İKAMET ADRESİ : Ortadoğu Çamlık Sitesi No: 88
 Çiğdem Mahallesi – ANKARA

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : Ev: 287 69 91 İş: 305 11 73
 ÜNVANI : Prof.Dr.
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Sıhhiye Kampüsü Rektörlük
 TARİH VE SAAT : 16.12.2012 18:50
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekim
 Yardımcısı – 2008 – 2010 Haziran Ocak’tan itibaren Başhekim
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV :

KONU :
 MARUBENİ’den alınan 171 kalem hakkında

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Aslında İmmunohistokimya Cihazı ve Flow sitometri sorting Cihazı geçici kabul belgesinde imzanız olması nedeniyle bilginize başvurmak amacıyla sizi davet ettik. Bu konuda bilginiz nedir?

CEVAP: Açıkçası yukarıda sayılan iki cihaz dışındaki kalemler sorumluluk alanımda olmadığı için bilmiyorum, şimdi siz söyleyince hayal meyal hatırladım. Çünkü 2010 Haziran ayında Başhekimlikten istifa ederek ayrıldım , ne zaman olmuş bilmiyorum açıkçası ,

Genel olarak söylemek gerekirse Kabul Komisyonları o aletten anlayan kişilerden oluşur, bu uzman kişi veya cihazın kurulduğu anabilim dalı başkanlığı ilk imzayı atar, komisyonun diğer üyeleri bu kişilerin değerlendirmesini esas alarak kabulü onaylar.

Bu ihalenin diğer cihazlarla ilgili kapsamını bilmiyorum ama değişik toplantılarda konuşulduğuna şahit oldum.

Fatih Erkan

Can

Mehmet Haluk

Osman Koray

Klimaların ilgili bölümlerin inşaat çalışmaları tamamlanmamış olduğu için yerleştirilmesinde sorun olduğunu biliyorum, ancak henüz geçici veya kesin kabulü yapılmamış olduğu için hala firmanın sorumluluğunda olan bir şey olduğunu düşünüyorum.

Bu durumu aydınlatacak daha detaylı bir bilgiye sahip değilim.

Ancak, klimalar genel olarak Yapı İşlerinin sorumluluğunda olan bir konudur. Kabulünde esas etkili olacak birim Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığıdır.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Prof.Dr.Ösman Koray BODUROĞLU





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2627

02 TEMUZ 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Koray BODUROĞLU,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 16.07.2012 günü saat 17:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı


TUTANAK

12 Temmuz 2012

Saat: 14:30

Benim hatırladığım kadarıyla birtakım radyoterapi cihazları için depo tutuldu. Konuyla ilgili olarak Hastaneler Genel Direktörü (Prof.Dr. Tezer KUTLUK) net bir bilgi alınabileceğini belirtti. 2001 krizi nedeniyle ihale süresinin uzadığı belirtildi. 2001 yılında kurum kendi binasını yapabilirken 2008 de kurumun böyle bir şansının olmadığını belirtti. PACS Cihazların tesliminin eksik olduğunun belirtilmesinin üzerine; kesinlikle PACS cihazlarının eksiksiz teslim edilip bir problem olmadığını bildirdi. Sistemin çok iyi çalıştığını ve şikayet olmadığını belirtti.


Klimalarla ilgili olarak detayını Prof.Dr. Tezer KUTLUK (Hastaneler Genel Direktörü) hocamızdan alınabileceğini belirtti.



Prof. Dr. Mustafa ÖZMEN



Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2616

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Mustafa N. ÖZMEN,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 12.07.2012 günü saat 14:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 28252700646

ADI VE SOYADI : Mustafa CENGİZ

BABA ADI : Celal

DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 5.10.1968- Gaziantep

İKAMET ADRESİ : 1470. Sok. No: 2-A 41, Çukurambar, Ankara

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 305 2918 (iş)- 532.307 5974 (cep)

ÜNVANI : Prof. Dr.

BİLGİNİN ALINDIĞI YER : HÜ Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası

TARİH VE SAAT : 19.7.2012 – 11.30

O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi

ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : HÜ Onkoloji Hastanesi Başhekimi

KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?


Cevap: Ocak 2012 tarihinden itibaren Onkoloji Hastanesi Başhekimi olarak görevlendirilmiş bulunuyorum. Göreve ilk atandığım tarihten birkaç gün sonra Radyasyon Onkolojisi Anabilim dalında, -2. Katta kurulu bulunan Linak 3 cihazında arıza oldu. Bakımı yapan Varinak şirketi cihaz garantisinin dolduğunu ve yönetim tarafından bakım anlaşması yapılmadığından cihazın tamirini kabul etmediklerini belirttiler. Cihazların Radyasyon Onkolojisi AD kurulumundan itibaren 1 yıllık bir süre geçmiş olduğundan, genel kural olarak 2 yıllık garanti sürelerinin olması gerekir düşüncesiyle, sorunun nereden kaynaklandığını araştırmaya başladım. Bu arada aynı ihale kapsamında hastaneye alınan KİT ünitesinde kullanılacak olan Hijyenik klima sisteminin de çalışmadığını ve kartlarıyla ilgili problem olduğunu öğrendim.

Bu iki konuyu ve olası diğer problemleri net olarak öğrenebilmek için Marubeni firmasıyla yapılan sözleşmeyi o dönemdeki hastane müdürü Meral Sakızlı'dan istedim. Meral hanım sözleşmeyi temin ederek getirdi. Elimizdeki belgelere ve sözleşmeye göre Linak cihazlarının kabulü 13.10.2010 tarihindeydi ve cihazın kabulü yapıldıktan sonra 2 yıllık süreyle garanti kapsamında olması gerekiyordu. Bu nedenle 20.1.2012 tarihinde Marubeni ve Türkiye temsilcisi İncekara şirketine cihazın tamiri ve garantisinin devamıyla ilgili ihtar, durumun aciliyeti nedeniyle, direk olarak gönderildi. Aynı yazı Hastaneler genel direktörlüğüne ve Rektörlüğe de

gönderildi. Marubeni ve Türkiye temsilcisi İncekara şirketi cevaplarında cihazların idareden kaynaklanan sebeplerle geç kurulduğunu, bu nedenle üretici firma garantisinin bittiğini kendilerinin de ek garanti vermeyeceklerini iletiler. Bu dönemde İdari Mali İşleri arayarak Marubeni firmasının ne kadarlık teminatının elimizde olduğunu öğrendim. Bu güne kadar Marubeni firması teslim ettiği kalemlere karşılık gelen teminatın Hacettepe Üniversitesi yönetimi tarafından kendilerine iade edildiğini öğrendim. Daha sonra Hukuk Bürosuyla yapılan görüşmelerde bunun uygun olmadığını, sözleşmenin bir bütün olduğunu ve tüm kalemler teslim edildikten sonra ancak geçici teminatın serbest bırakılabileceğini öğrendim.

Şubat veya mart ayı içinde firmanın talebi üzerine, rektörlükte firma yetkilileriyle toplantı yapıldı. Bu toplantılar günümüze dek 4-5 kez tekrarlandı. İlk toplantıya İncekara şirketinden Genel müdür Murat Bey, Marubeni Firmasından Steve Newton, Türkiye mümşesili İbrahim Kılıç bey, Hacettepe'den Rektör yardımcısı Ömer Uğur, Ben, Başhekim yardımcısı Evren Özdemir katıldı. Firma KİT ünitesine kurulacak hijenik klima sistemlerinde saklama koşullarına uyulmadığından arızalar ortaya çıktığını ve bunun sözleşmeye göre idarenin suçu olduğunu belirterek herhangi bir sorumluluk almayacaklarını belirttiler. Biz firmaya saklama koşullarının uygun olmadığını belirten herhangi yazılı bir uyarıda bulunup bulunmadıklarını sordüğümüzda, sadece sözel uyardıklarını söylediler. Ayrıca 20.1.2012 tarihinde benim yazdığım ihtarın Hacettepe'den bugüne kadar aldıkları tek yazı olduğunu söylediler. Lineer akseleratör 3,4 (TRP1) ve Novalis cihazlarıyla ilgili olarak, bunların üretici garantilerinin dolduğunu, kendilerinin ek garanti yapmayacaklarını belirttiler. Cihazların kurulumunun çok geciktiğini, bunun idarenin suçu olduğunu, üretici garantisinin (cihazın tesliminden itibaren 2.5 yıl, kurulumundan itibaren 2 yıl) cihazlar paketteyken eridiğini ve Novalis cihazında ise cihaz kurulduğunda garanti süresinin tamamlanmış olduğunu söylediler. Bu 3 cihazla ilgili herhangi bir adım atmayacaklarını beyan ettiler. PET/BT cihazındaki eksiklerle ilgili GE firmasıyla görüştüklerini belirttiler, ancak biz PET/BT'yi kullandığımızdan bunun uygun olmadığını cihazın geçici kabulunu yapmamızı istediler. Biz cihazdaki eksiklikler giderilmeden geçici kabulunu yapmayacağımızı beyan ettik. Siklotron cihazıyla ilgili yönetimin gösterdiği kurulum alanında projelendirme çalışması yaptıklarını söylediler. Firma yetkilileri, birçok İngilizce yazı gösterdiler, bunlarla Hacettepe Üniversitesi yönetimini uyardıkları, gecikmelerin ortaya çıkacağı zararları üstlenmeyeceklerini, biten cihaz garantileriyle ilgili Hacettepe yönetimini uyardıkları yazılar olduğunu ifade ettiler. Yazıların bir kısmı bana daha önce Tezer Kutluk hoca tarafından bir zarf içinde iletilmişti. Ancak tamamı yoktu, bunların birer örneğini rica ettik. Biz sözleşmeye göre yazışma dilimiz Türkçe olmalıdır, dolayısıyla yazılan İngilizce yazıların geçerli olmayacağını belirttik.

Nisan ayı içinde Marubeni firmasıyla tekrar toplantı yapıldı. Toplantıya Marubeni firmasından Steve Newton, Türkiye Temsilcisi İbrahim Kılıç, İncekara Şirketinden yetkili, Rektör Yardımcısı Ömer Uğur, ben ve Rektör bey katıldı. Toplantıda firma yetkilileri daha önce söyledikleri hususları tekrar ettiler. İngilizce olarak Hacettepe Üniversitesine yazılmış birçok yazı gösterdiler. Bu yazılarla yönetimi gecikmeler ve oluşabilecek zararlar konusunda uyardıklarını belirttiler. Bu yazılar içinde klimaların saklanma koşulları ile ilgili uyarı yazısı yoktu; ancak Hacettepe Üniversitesi o dönemki İdari Mali İşler Başkanı Nejat Bey'in imzası olan İngilizce, Marubeni antetli bir yazı gösterdiler. Bu yazıda klimaların kuru ortamda, uygun şekilde saklandığı belirtiliyordu. Bunun üzerine Rektör bey Nejat beyi çağırarak yazıyı gösterdi. Bu yazıda ne anlatıldığını söylemesini istedi. Nejat Bey yazıya bakarak İngilizce bilmediğini ifade etti ve mektubun içeriğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine Rektör Bey niçin imzaladığını sordu. Nejat Bey Tezer Hoca'nın talimatıyla imzaladığını söyledi. Bu toplantıda siklotron cihazının önceki idarece belirlenen yerinin çok uygun olmadığı söylendi. Ömer Uğur




hoca hastanenin bütün su tesisatının bu bölümden geçtiğini ve hepsinin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun hem ekonomik olarak pahalı olduğunu, hem de hastanenin bu süreç içerisinde susuz kalacağını belirtti. Ayrıca ilk belirlenen yerin küçük olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından ruhsatlanmayacağını belirtti. Bu nedenle yeni yer aranmasına karar verildi. Toplantı sonrası ben, Marubeni ve İncekara firma yetkilileri hastaneyi dolaşarak - 2. Katta bulunan ve Kafe olarak çalışan bölümün en uygun yer olduğuna karar verdik.

Marubeni firması yükümlülüklerini yerine getirmediğinden hastanemizde oluşacak ve oluşan zararları önlemek için cihaz bakım anlaşmalarını ve klimalarını tarafımızca yapılabilmesi yolu düşünüldü. Firma yetkilileri, PET/BT eksikliklerini tamalayacaklarını ve siklotronu kuracaklarını belirtmeleri nedeniyle, sözleşme feshedilmeden anlaşmazlık olan konularla ilgili mahkeme yoluna gidilebileceği tartışıldı. Firmaya noter kanalıyla ihtarname yazıldı. Bu ihtarname ve cevabı ihtarname hukuk bürosundan temin edilebilir. Cevabi ihtarname eski iddialarını tekrar etmekle yetindiler. Daha sonra Weiss Klimalarla ilgili bilirkişi atanarak durum tespiti yapılması için mahkemeye başvurduk. Garantiler için de kimin sorumluluğunda olduğunun belirlenmesi amacıyla hukuk büromuz vasıtasıyla mahkemeye başvuruldu. Sanıyorum Nisan ayı içinde bilirkişi Weiss klimalar için geldi ve tespitte bulundu. Klimaların elektronik kartlarının ve eksiklerinin olduğunu belirttiler. Doktor Evren Özdemir Yapı İşleri Dairesi ile toplantı yaptı. Cihazları yukarıya kimin kurdurduğunu ve kimin bilgisi dahilinde elektronik kartların söküldüğünü sordu. Yapı İşleri Dairesi ve eski hastane idaresi kendilerinin bilgilerinin dışında olduğunu belirttiler. Anladığım kadarıyla Hacettepe Üniversitesi dahilinde kimsenin bu klimaların nasıl yukarı çıkarılıp kurulduğu, nasıl kartlarının sökülerek Beyaz Teknik isimli firmaya gönderildiğini bilmediği anlaşılıyordu. Hastaneye ilk Başhekim olarak atandığımda bölümleri gezerken Hijyenik klimaların olduğu bölümün anahtarlarının inşaat nedeniyle Somut firmasında olduğu söylenmişti, bu odaları görememiştim. O dönemdeki Hastane Müdürü Meral Sakızlı hanıma o anahtarların hemen Somut firmasından alınması talimatını verdim. Somut firmasından Celal Beyle görüşmemde Hacettepe Üniversitesi yönetiminin bozulmuş olan klimaları Beyaz Teknik Firmasına kendileri aracılığıyla yaptırılmasını istediklerini belirttiler. Celal Bey, Beyaz Teknik Firmasıyla hijyenik klimaların tamiri için 90.000 Euroya anlaştıklarını ifade ettiler.

Klimalarla ilgili Tezer Kutluk hocayla görüştüğümde saklama koşullarıyla ilgili Marubeni firmasının kendilerini bilgilendirmediğini belirtti. Lineer akseleratör cihazlarının kiralık depoda saklandığını, eğer uyarılsaydı klimaların da aynı depoda saklanabileceğini söyledi. Ayrıca Tezer Kutluk hoca inşaatlarla ilgili İncekara firmasının Somut firmasına Hacettepe adına 200.000 TL verdiğini, 200.000 TL daha vereceğini belirtti. Bunun inşaatların tek elden, aynı kalite ve estetik ölçüde yapılması için gerekli olduğunu söyledi. Bunu Marubeniyle yapılan toplantıların birinde Ömer Uğur hoca, Firma yetkilisi İbrahim Kılıç beye sordu. İbrahim bey, Marubeni firmasının ilgisi olmadığını İncekara şirketinin bu parayı verdiğini söyledi.

Ben başhekim olarak atandığım dönemde, Brakiterapi cihazının kurulumundan ve kabulü üzerinden yaklaşık bir yıllık süre geçmişti, hasta aplikatör çeşitliliğinin az olması nedeniyle (bazı hastalara aplikatörlerin uymayacağı düşüncesiyle) kullanılmadığını öğrendim. Ancak bu eksikler cihazı kullanmaya engel değildi ve cihaz kullanıldıkça eksikleri daha da iyi anlaşılacak hasta aplikatörlerinin tamamlanacağını düşündüm. Ayrıca eski brakiterapi cihazının bakım masrafları ve kaynak masrafları dikkate alınarak yeni cihazın kullanılmasını düşündüm ve bölümdeki hocalarla görüşerek bu doğrultuda karar aldım. Bununla ilgili görüştüğüm Fizik Mühendisi Demet Yıldız hanım cihazın kuyu tipi iyon odasının olmadığını belirtti. Normalde cihazla birlikte gelmesi gereken bu aletin paketten çıkmadığını söyledi. Bu durumu cihazın



montajını yapan Varinak firması mühendisinin teyid ettiğini belirttiler. Bunun üzerine geçici kabul belgesinde imzasının olduğunu ve cihazı niçin kabul ettiklerini sordum. Demet hanım diğer komisyon üyesi hocaların hepsinin imzaladığını kendisinin de bunu görünce imzaladığını belirtti. Marubeni firmasıyla yaptığımız toplantıda bu durumu firma yetkililerine de sordum. Firma Türkiye Temsilcisi İbrahim Bey kendilerinin tam olarak teslim ettiklerini ve bu konuyla ilgili herhangi bir yardımlarının olmayacağını ifade ettiler. Varinak Firması (Brakiterapi cihazı Türkiye temsilcisi) ile görüşüldü. Firma kuyu tipi iyon odasını geçici olarak kendilerinin temin edeceğini ancak bölümün buna kalıcı olarak ihtiyacı olduğunu belirttiler. Brakiterapi cihazına ilk kaynak takıldıktan sonra Varinak firması kuyu tipi iyon odası getirerek ölçümlerin yapılmasını sağladı.

Marubeni firmasının yapmayı taahhüt ettiği siklotron cihazının kurulumunu geciktirmesi, bununla ilgili çalışma programını vermemesi nedenleriyle Rektörümüzce ihalenin feshedilmesi gündeme geldi. Bu dönemde Marubeni firmasıyla birkaç görüşme daha yapıldı. Ancak firma daha önceki toplantılarda belirttikleri hususları tekrarladılar. -2. Katta siklotron için ayrılan bölümün tavan yüksekliğinin yetersiz olduğunu belirttiler. Ancak bu bilgi için neden iki ay beklediklerini tatmin edici şekilde izah edemediler. Dolayısıyla sözleşmenin feshi yoluna gidildi.

Yukarıdaki hususlardan ayrı olarak Marubeni firmasınca temin edilen ve geçici kabul yapılan 8 adet kabul belgesinin aslının Üniversitemizde bulunmadığını öğrendim. Hastane müdürümüz Yasin bey, elimizde fotokopisi olan geçici kabul belgelerinin 8 tanesinin fotokopilerinin net olmadığını belirterek bunların asıllarını istememizi önerdi. Ben de hastaneler genel direktörü Ömer Uğur Hoca'ya yazarak bunların asıllarını istedim. Ömer Uğur hoca idari mali işler dairesine yazarak bu belgelerin asıllarını istedi. Gelen cevabi yazıda bu belgelerin asıllarının kendilerinde olmadığını, bu işle ilgilenen şahsın iznli olduğu dönemde Onkoloji Hastanesinin o zaman ki müdürü Meral Sakızlı tarafından belgelerin hazırlandığını ifade etmişlerdi. Bununla ilgili daha sonra ne yapıldı bilmiyorum. Ancak bu şüpheli durum üzerine Hastane müdürümüz Yasin bey'den bu 8 adet belgede adı geçen cihazların gerçekten elimizde olup olmadığının teyidini istedim. Yasin bey bana sözel olarak bu cihazların elimizde olduğunu beyan etti.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Mustafa Cengiz





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410 - 2609

02 Eylül 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Mustafa CENGİZ,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 13.07.2012 günü saat 14:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 29131879910
 ADI VE SOYADI : Evren ÖZDEMİR
 BABA ADI : Mehmet
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 11.04.1969
 İKAMET ADRESİ : Kazakistan Cad. 14. Sokak. 18/6 Emek/ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 312 3052865 / 533 7374612/ 215 89 85
 ÜNVANI : Doç.Dr.
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Yönetim Kurulu Odası
 TARİH VE SAAT : 13.7.2012- 13:30
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Öğr. Üyesi
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Onkoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı
 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
 KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU:

Cevap : Ocak 2012 başından itibaren Onkoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak çalışıyorum. Onkoloji Hastanesinde Medikal Onkoloji kök hücre nakli ünitesinden de sorumluyum. Şu anda kök hücre nakli ünitemiz yok. Onkoloji Hastanesi 5. katında 3 odaya mobil hepa filtre koydurduk, o şartlarda yapılabilecek nakilleri yapıyoruz. Kompleks nakilleri, ünitemiz olmadığından yapamıyoruz. Bundan dolayı hasta mağduriyeti ve kamu zararı var. Hastalara bekle diyemiyoruz, nüks riski nedeniyle başka merkezlere yönlendiriyoruz. Nakiller paket programlardır, SGK tarafından oldukça uygun fiyatlandırılmıştır, bundan hastanelerin kar yapması beklenir. Önceki idare döneminde Bölüm 94, 16 yataklı kök hücre nakli ünitesi olarak planlanmış ve bazı tadilatlarla başlanmıştı. Bu nedenle önceki yönetim ile birkaç yıldır kök hücre nakli ünitesinin ne zaman bitirileceği konusunda görüşmelerimiz olmuştur. Hijyenik klimalar, Onkoloji Hastanesinde açılması planlanan KİT ve yoğun bakım ünitelerine hijyenik, bakteri, mantar sporu içermeyen hava sağlamak için şarttır. Önceki yönetim tarafından ünitenin ekonomik nedenlerle zamanında açılmadığı söylenmişti. Radyasyon Onkolojideki cihazlarla ilgili sorunları da alanı olduğu için Mustafa hoca da muhtemelen kısmen biliyordu.

Yönetime gelince, sorun oluşturan cihazlarla ilgili dosyayı istedik. Onkoloji Hastanesi'nin o dönemdeki müdürü Meral Kirazlı idi. Bize bu konuda hiçbir dosya verilemedi, Onkoloji

Fahri Ercan

Lam

[Signature]

Hastanesi'nde hiçbir doküman yoktu. Ancak, hijyenik klimaların monte edilmiş olduğunu ancak çalışmadığını öğrendik. Hijyenik klimaların monte edildiği odaların anahtarlarının da monte eden Somut adlı firmada olduğunu öğrenerek, anahtarları derhal istettik. Marubeni firması ile yapılan sözleşmeyi ekleriyle birlikte İdari Mali İşler'den getirttik. Sözleşmeyi gördük. Yaklaşık 10 kalemde geçici kabul yapılmadığını anladık. En büyük kalemler, hijyenik klimalar, novalis cihazı, lineer akseleratör cihazları, PET-BT ve siklotron cihazı idi. Diğer küçük kalemler ise otoklav cihazları, etilen oksit sterilizatör, endoskopi yıkama cihazları, hastabaşı monitörleri gibi kalemlerdi. Bunların bir kısmı kurulamadığı için geçici kabulleri yapılmamıştı. Önceki yönetimler zamanında Onkoloji Hastanesi'nde ameliyathane de kurulması planlanmış, ancak sonra bu fikirden vazgeçilmiş. Küçük kalemlerin bir kısmı bu ameliyathanede kullanılmak üzere alınmış, ancak, kullanılmadığı için depoya kaldırılmış. Bunların depoda geçici kabülü yapılmamış şekilde bulunduğunu öğrendik. Sözleşmeye göre İncekaralar adlı firmanın, Marubeni firmasına yardımcı olacağı yazıyor, ancak bu firmanın hiçbir dökümanda imzası yok. İncekaralar firmasının pozisyonunu tam olarak anlayamadık. Belgeleri inceledikten sonra, 4 ana kalemle ilgili sorun olduğunu gördük. Bunlar, hijyenik klimaların çalışmaması, radyoterapi lineer akseleratör cihazları ile novalis cihazının garanti sorunları, PET-BT'nin eksik software ve garanti sorunu ile siklotron cihazının kurulması idi. Bunlarla ilgili Ömer hoca ve Mustafa hoca, eski Hastaneler Genel Direktörü Tezer beyle bir iki kez görüştü. Bu toplantılarda ben bulunmadım. Takiben, Marubeni firmasına mevcut eksik işleri ile ilgili ihtarname çektik. Sanıyorum Şubat ayı içinde firma tarafından bir toplantı istendi. Toplantı, Ömer hocanın rektörlükteki odasında oldu. Toplantıya Ömer hoca, Mustafa Cengiz hoca, ben, Marubeni Avrupa temsilcisi Steve adlı şahıs, Marubeni firmasının danışmanı olduğunu söyleyen sanıyorum İbrahim bey adlı bir şahıs, İncekaralardan Murat bey adlı bir kişi katıldı. Hacettepe Üniversitesi'nden bu ihale ile ilgili ilk defa yazılı bir belge aldıklarını söylediler. Bu toplantıda, bir dış kredi sağlanarak, 2001 yılında, Marubeni firması ile 170'den fazla kalem cihazı içeren sözleşme yapıldığı, ancak ekonomik kriz nedeniyle hazine tarafından bu para serbest bırakılmadığı için, 2007 yılında ödeme yapıldığı, 2007 yılından sonra da ilgili cihazların getirilmeye başlandığı belirtildi. Marubeni firması danışmanı tarafından hijyenik klimaların çalışmadığı söylendi. Klimalar teslim edildikten sonra saklama şartlarının uygun olmaması nedeniyle, klimaların hava koşullarına maruz kaldığı, bu nedenle, elektronik kartlarının yandığı iletili. Hatta, elektronik kartlar sökülerek, Almanya'ya Weiss firmasına gönderildiği, firmanın cihazın çalıştırılmasını istemediği söylendi. Hijyenik klimalar teslim edilirken, uygun şartlarda saklanmasına dair teslim alanların uyarılıp uyarılmadığını, yazılı bir uyarı yapıp yapılmadığını sorduğumuzda, firma danışmanı tarafından böyle yazılı bir uyarı olmadığı söylendi. Radyoterapi cihazları ile ilgili olarak, cihazlar geldikten sonra kuruluncaya kadar beklediği, bu nedenle garanti sürelerinde sıkıntı olduğu ancak cihazların alındığı Varinak firması ile görüşecekleri ifade edildi. PET-BT ile ilgili bazı softwarcilerin eksik olduğu kendilerine iletili. Bununla ilgili olarak GE firması ile görüşeceklerini söylediler. Siklotron cihazı ile ilgili olarak da, eski yönetim tarafından gösterilen yerin, hastane ısıtma ve su borularında ciddi altyapı tadilatı gerektirdiğinden uygun olmadığını söyleyerek, kendilerine yeni bir yer göstermeyi taahhüt ettik. Nisan ayı başında yeni bir toplantı daha yapmak üzere anlaşarak, toplantı sonlandırıldı. Eski hastane müdürü ve yardımcıları ile bir toplantı yaparak, hijyenik klimaların kim tarafından teslim alındığını sordum, bu konuda bir bilgilerinin olmadığını söylediler, hastanede de bununla ilgili bir belge veya tutanak yoktu. Hijyenik klimaların elektronik kartları alınırken herhangi bir kayıt veya tutanak olup, olmadığını sordum. Cevap verilemedi. Ancak, kartların Beyaz Teknik adlı Weiss firmasının Türkiye temsilciliğinde olduğu söylendi. Bu arada hastane müdürü değiştirildi ve Yasin bey müdürlüğe atandı. Yeni hastane müdüründen kartların derhal getirilmesi istendi ve başhekimliğe getirtildi.

Fahri Ercan

Emre

Mustafa Cengiz

Steve

İkinci toplantı, sanıyorum Nisan ayı başında, yine Ömer hocanın odasında başladı ve rektör beyin odasında devam etti. Bu toplantıda hijyenik klimalarla ilgili bir şey yapamayacaklarını bildirdiler. Hijyenik klimaların o dönemde çekilmiş fotoğraflarını gösterdiler. Radyoterapi cihazlarının garantileri ile ilgili Varinak firması ile görüştüklerini ancak anlaşılmadıklarını ilettiler. PET-BT softwareleri ile ilgili GE firması ile görüştüklerini, muhtemelen olumlu adımlar atılacağı söylendi. Siklotron yeri olarak da kendilerine şu anda Melon kafenin bulunduğu yer gösterildi, bu yeri inceleteceklerini belirttiler. Firma danışmanı, ikinci toplantıda, Üniversite tarafından Marubeni firmasına yazıldığı iddia edilen ve hijyenik klimaların uygun şartlarda korunduğunu taahhüt eden, altında İdari Mali İşler Müdürü Nejat beyin imzası olan İngilizce bir mektup gösterdi. Bunun üzerine rektör bey Nejat beyi çağırdı, bu imzayı niye attığını sordu. Rektör bey Nejat beye İngilizce bilip bilmediğini sordu. Nejat bey hayır dedi. O zaman bilmediğin bir belgeye niye imza attın dedi. Nejat bey bana imzayı atmam Tezer bey tarafından söylendi dedi. Bu olaydan sonra Nejat bey, rektör bey tarafından görevden alındı. Sözleşmeye göre yazışma dilinin Türkçe olması gerekiyor, belki sözleşmedeki bu hüküm lehimize olabilir. Bu arada hukuk müşavirliği kanalıyla, hukuki süreci başlattık. Hijyenik klimalarla ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi geldi, cihazları inceledi, fotoğraflarını çekti. Bilirkişi raporu mahkemeye verildi. Hukuk müşavirliği aracılığıyla raporu biz de gördük. Raporda hijyenik klimaların çalışır hale getirilebilmesi için tamiratlar gerektiği, yaklaşık maliyetleri yer alıyordu. Buna istinaden hasta mağduriyeti ve kamu zararını düşünerek, hijyenik klimaların tamiri için ihale sürecini başlattık. Bir an önce üniteyi açıp, hasta mağduriyetini gidermek istiyoruz. Bu arada hukuki süreç devam ediyor, üniversite davayı kazanırsa Marubeni firmasından bu giderlerin rücu edilmesi planlanıyor. Radyoterapi cihazlarının garantisi ile ilgili olarak da hukuki süreci başlattık. Ancak, cihazlar sık sık bozulduğu için bakım anlaşması yapmak gerekiyor, yine hasta mağduriyeti ve kamu zararı düşünülerek bakım anlaşmaları süreci de başlatıldı. Mahkeme sonucunda üniversitenin kazanması halinde Marubeni firmasından giderlerin rücu edilmesi planlanıyor. Haziran ayında siklotron için gösterdiğimiz şu anda Melon kafenin bulunduğu yerin yüksekliğinin uygun olmadığı Marubeni firması tarafından iletili.

Yaklaşık iki hafta önce Ömer hocanın Genel Direktörlükteki odasında, Mustafa hoca, ben, Marubeni ve İncekara firması yetkilileri bir toplantı daha yaptık. Bu toplantıda, Ömer hoca, rektör beyin sürecin yavaş ilerlemesinden rahatsız olduğunu, sözleşmeyi feshetmek istediğini ve KİK'e de bildirimde bulunacağını söyledi. Firmanın ne yapacaksa bir an önce yapması gerektiği kendilerine iletili. Bundan firma yetkilileri tedirgin oldular. Bir hafta önce Ömer hocanın Genel Direktörlükteki odasında bir toplantı daha yapıldı. Toplantıya Ömer hoca, ben, Yasin bey, Marubeni firmasının danışmanı, İncekaralar firmasının yetkilisi ve GE firmasından bir yetkili katıldı. Siklotron kurulması için firma yetkililerine Melon kafe önündeki alan gösterildi. Bu alan ile ilgili çalışacaklarını ilettiler. PET-BT'nin eksik softwarelerinin GE firması tarafından verileceği söylendi.

Onkoloji Hastanesi'nde Marubeni ihalesi ve sonrasındaki bizim yönetimimize kadarki süreçle ilgili ciddi bir kayıt, tutanak ve doküman olmadığını gördüm. Hijyenik klimaların elektronik kartlarının sökülüp götürülmesine rağmen ve bununla ilgili hiçbir kayıt veya tutanak yok. Bozuk olduğu bilinen hijyenik klimaların Somut adlı bir firma tarafından monte edildiği ve bunun için bu firmaya üniversite tarafından ödeme yapıldığını duydum. Sözleşmeye göre montaj işlerinin Marubeni firması tarafından yapılması gerekmekte. Daha önceki bir tarihte, eğer sözleşme feshedilirse, firmanın teminat mektubunda belirtilen miktarın, kalan eksik ve giderleri karşılayıp karşılamayacağını anlamak için, İdari Mali İşler'e teminat mektubunu sorduk. Buna göre teminatın yarısının önceki yönetim sırasında firmaya teslim edildiğini

Fatih Ercan

Levent


Ali

Ali

öğrendik. Sözleşmeye göre tüm kalemlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra teminatın yarısının, kesin kabul yapıldıktan sonra da diğer yarısının serbest bırakılması gerekiyor. Ancak, tüm kalemlerin geçici kabulü yapılmadan teminatın yarısının verilmesi sözleşmeye aykırı bir husus.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Doç.Dr.Evren Özdemir





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı : B.30.2.HAC.0.00.00.01 / 410 - 2800
Konu :

12.7.2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Doç.Dr. Evren ÖZDEMİR,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 9:30'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2615

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Şevket RUACAN,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 12.07.2012 günü saat 15:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı



**KOÇ
ÜNİVERSİTESİ**

Prof. Dr. Şevket Ruacan
Dekan
Tıp Fakültesi

Rumelifeneri Yolu,
34480 Sarıyer-İstanbul-Türkiye
Telefon : (0-212) 338 16 66
Faksimile : (0-212) 338 15 59
e-mail : sruacan@ku.edu.tr

EL - 24

10.Temmuz.2012

Sayın Prof.Dr.Filiz Ercan
Soruşturma Komisyonu Başkanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
Ankara

Üniversiteniz Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım)tamamı dış kredili ihale ile ilgili işlemler konusunda açılmış olan soruşturma kapsamında bilgime başvurulması için gönderdiğiniz belgeyi bugün (10 Temmuz 2012, saat 10.00) itibariyle tebellüğ ettim.

12 Temmuz 2012 günü Koç Üniversitesi'ndeki sorumluluklarım nedeniyle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde bulunmam imkanı olmadığından ifademini yazılı olarak alınmasını, bu mümkün olmadığı takdirde 18 Temmuz 2012 günü belirteceğiniz saatte Hacettepe Üniversitesi'nde bulunabileceğimi ifade ederim.

Saygılarımla.

Prof.Dr.Şevket Ruacan
Dekan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 17884015464
 ADI VE SOYADI : MEHMET ÖZEN
 BABA ADI : ŞAKİR
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 01.01.1954 - ANKARA
 İKAMET ADRESİ : ÇALDIRAN MAH. 492. CAD. 524. SOK. 3/13
 KEÇİÖREN/ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0535 460 92 25
 ÜNVANI : EMEKLİ
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU
 TARİH VE SAAT : 17.07.2012 Saat: 15:15
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI
 SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANI
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : EMEKLİ
 KONU :
 MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap:

S:Siz 2001 yılında Satınalma Komisyonunda üye olarak bulunmuşsunuz. Görevinizde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanısınız. Ne zaman emekli oldunuz?

C: 16.01.2009 yılında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan emekli oldum. 01.03.2007 tarihinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı oldum. Nejat Beyle yer değiştirmiş oldum. Marubeninin Rektörlükteki toplantılarından biliyorum. Marubeni 2007 Mart ayında cihazları teslim edeceğim. Hangi cihazlara öncelik istiyorsunuz diye söylediğinde şifaen bilgi sahibi oldum.

S: İdari ve Mali İşler Dairesi bu tarz bir ihalenin neresindedir?

C: İhaleyi hazırlayan birimdir. İlgili birimler teknik şartnameyi hazırlar ve bize gönderirler. Bu ihale olduğunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yürürlükte idi. Bu tür alımlarda ilk çıkışı 176 kalemdir. İlk teklifler geldiğinde Hazinesin müsaadesi 28 milyon dolar idi. 176 kalem bu miktara sağlamadığı için 5 kalem malzeme eksildi yeniden ihaleye çıkıldı.

S: Bütün teknik şartnameler size geliyor?

Fahri Erman *M. Özen* *...* *...*

C: İhaleye çıkılır. Bu Uluslararası ihale. Bu tür firmalar o nedenle müracaat ederler.

S: Sizde toplanan bilgileri belgeleri Genel Sekreterliğe mi sunuyor sunuz?

C: Rektörlüğe. İta amir olduğu için Genel Sekreter paraflar.

S: O zaman Genel Sekreter kimdi?

C: Atilla Konaç idi. Ben SKS Başkanı olduğumda Atilla Konaç idi.

S: Bize başka ne söylemek istersiniz. Para ödemedeki fonksiyonunuz nedir?

C: İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı aracı görevi yapar. Çünkü bu Uluslararası ihalede böyledir. Normal ihale şartlarında esas görevini yapar.

S: Yani para şöyle ödensin, para serbest bırakılsın sizin işiniz mi?

C: Talimatla olur.

S: Dış krediyle gelen ürünlerin gümrükten çekilmesi var bu İdari Mali İşlerin görevi mi?

C: Evet.

S: Teslimatlar da kim yetkilidir?

C: İdari Mali İşler Dairesi elemanı. Adrese teslim 2 türdür Cif ve Fot. Fabrika çıkış Fot. Cif teslimi Ankara teslimine kadar mal gelir. Kurumdan biri gider alır. Burda ilgili birim nere ise teslim eder.

S: Bu şartnameleri siz hazırlıyordunuz dimi? Peki teknik şartnameyi kim hazırlıyor?

C: Teknik şartnameyi ilgili birim hazırlar

S: Siz gözden geçiriyor muydunuz?

C: Evet.

S: Sözleşmeyi kim hazırlıyor.

C: Biz hazırlarız. Ama bu sözleşmede Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı devreye girer

S: Belgeler nerede tutuluyor.

C: İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığında.

S: Konuyla ilgili herşey bulunur dimi?

C: Evet. Sadece normal prosedür değil. İhale ile ilgili işlemlerin asılları İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunur. Bu ihale ile ilgili gerek Maliye, Sayıştay ve Hazine Müsteşarlığı tarafından inceleme yapıp düzenleme yapılmıştır.

S: Bu düzenlemeler her dosyada olabilecek düzenlemeler mi?

C: Tabi. Dış alımlarla ilgi evet.

Fahri Erca
Caner
Atilla Konaç

[Signature]

Personel Dairesi Başkanlığı Tayin ve Terfî onayına istinaden Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına 23.02.2007 tarihinde atandığına dair evrak tarafımıza ibraz edilmiştir.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Bilgi Veren

Mehmet ÖZEN



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2633

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Mehmet ÖZEN,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 14:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Filiz Ercan
Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 10225182696
ADI VE SOYADI : SÜREYYA ÖZER
BABA ADI : MUSTAFA
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : ERZİNCAN - 1941
İKAMET ADRESİ : Akyüz Sok. 55/11 Küçükesat/ANKARA
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : Ev: 418 18 79 Cep: 0532 433 72 28
ÜNVANI : Emekli
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu
TARİH VE SAAT : 17.07.2012 saat: 14:30
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Emekli (25.11.2006)
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Emekli
KONU :
MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap:

2001 de yapılan ihalede Satınalma Komisyonu Başkanıyım. 2001 hem Genel Sekreter Yardımcısı idim şu anda emekliyim. Prof.Dr.Tunçalp Özgen hocamın zamanında emekli oldum. Kasım 2006 da yaş haddinden emekli oldum.

S:Marubeni firmasından tamamen dış krediyle alınan 171 kalem malzemenin bazılarında problem var. Bize söyleyeceğiniz bir şey var mı?

C:Satınalma Komisyonu Başkanı olmaktan başka bir görevim yok. 02.04.2001 tarihinde ihaleye Simed, Nissho, Marubeni ve Fritz firmaları katıldı (21 Şubat 2001 de , 26 Mart 2001 ve son olarak 02 Nisan 2001 tarihinde ihale sonuçlandı). Üniversitemizin 2001 yılı bütçesi yaklaşık 74 trilyon idi. Bu ihale ise yaklaşık 38 milyon dolar dış kredi olarak Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına belirlenmişti.

S:Bu ihaledeki parayı üniversite mi ödedi?

C:Herhalde hazine ödedi. İhaleyi kazanan firma dış kredi bulup yapıyor. Para daha sonra devlet borcu oluyor.

S:Hazine Hacettepeyi borçlandırıyor ama

Fahri Ercan

28

28

28

28

C:Söz konusu ihale Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının onayı ve bilgisi dahilinde yürütülmüştür.

S: Sonuçta bu borcu Üniversite ödemiıyor mu?

C: Yasal uygulamayı hatırlamıyorum.

S:Yani üniversitenin bütçesine eşdeğer bir ihale yapıyor. Bunu bir başarı olarak mı görüyorsunuz. İhale bölünerek yapılsaydı ikiye üçe bölerek daha mı kolay olurdu?


C: Söz konusu ihale Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının onayı ve bilgisi dahilinde yürütülmüştür.

S: Siz emekli olana kadar bu ihale kapsamında gelen cihaz var mı?

C: Hayır mal teslimi hakkında bir bilgim yok çünkü 25 Kasım 2006 tarihinde emekli oldum.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Bilgi Veren

Süreyya ÖZER



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 10225182696
ADI VE SOYADI : SÜREYYA ÖZER
BABA ADI : MUSTAFA
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : ERZİNCAN - 1941
İKAMET ADRESİ : Akyüz Sok. 55/11 Küçükesat/ANKARA
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : Ev: 418 18 79 Cep: 0532 433 72 28
ÜNVANI : Emekli
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu
TARİH VE SAAT : 17.07.2012 saat: 14:30
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Emekli (25.11.2006)
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Emekli
KONU :
MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap:

2001 de yapılan ihalede Satınalma Komisyonu Başkanım. 2001 hem Genel Sekreter Yardımcısı idim şu anda emekliyim. Prof.Dr.Tunçalp Özgen hocamın zamanında emekli oldum. Kasım 2006 da yaş haddinden emekli oldum.

S:Marubeni firmasından tamamen dış krediyle alınan 171 kalem malzemenin bazılarında problem var. Bize söyleyeceğiniz bir şey var mı?

C:Satınalma Komisyonu Başkanı olmaktan başka bir görevim yok. 02.04.2001 tarihinde ihaleye Simed, Nissho, Marubeni ve Fritz firmaları katıldı (21 Şubat 2001 de , 26 Mart 2001 ve son olarak 02 Nisan 2001 tarihinde ihale sonuçlandı). Üniversitemizin 2001 yılı bütçesi yaklaşık 74 trilyon idi. Bu ihale ise yaklaşık 38 milyon dolar dış kredi olarak Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca belirlenmişti.

S:Bu ihaledeki parayı üniversite mi ödedi?

C:Herhalde hazine ödedi. İhaleyi kazanan firma dış kredi bulup yapıyor. Para daha sonra devlet borcu oluyor.

S:Hazine Hacettepeyi borçlandırıyor ama

Filiz Ezeran *Lanet* *Mutlu* *S*

C:Söz konusu ihale Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının onayı ve bilgisi dahilinde yürütülmüştür.

S: Sonuçta bu borcu Üniversite ödemiyor mu?

C: Yasal uygulamayı hatırlamıyorum.

S:Yani üniversitenin bütçesine eşdeğer bir ihale yapıyor. Bunu bir başarı olarak mı görüyorsunuz. İhale bölünerek yapılsaydı ikiye üçe bölerek daha mı kolay olurdu?

C: Söz konusu ihale Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının onayı ve bilgisi dahilinde yürütülmüştür.

S: Siz emekli olana kadar bu ihale kapsamında gelen cihaz var mı?

C: Hayır mal teslimi hakkında bir bilgim yok çünkü 25 Kasım 2006 tarihinde emekli oldum.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Süreyya ÖZER





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2632

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Süreyya ÖZER,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 13:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı


TUTANAKTIR

Estüpsül Kale 17.07.2012'deki
bilgisine başvurmak için Hacettepe
Rektörlük toplantı salonunda verildiği
bilgi ifadesini imzalamadan gitmiştik.


Prof. Dr. Canan Helimoğlu

Prof. Dr. Filiz Ercan

Filiz Ercan

Mutlu Aytemir


BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 14839083882
 ADI VE SOYADI : ERTUĞRUL KALE
 BABA ADI : HALİM
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 04.09.1955 - VİRANCIK
 İKAMET ADRESİ : CEMAL GÜRSEL CAD. KALE APT. 8/5
 GÖLBAŞI/ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0532 711 78 20
 ÜNVANI : EMEKLİ
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU
 TARİH VE SAAT : 17.07.2012 Saat: 16:00
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : H.Ü. ONKOLOJİ HASTANESİ - HASTANE MÜD.
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : EMEKLİ
 KONU :

MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap:

1998 yılından 2007 yılına kadar Onkoloji Hastanesi Müdür Yardımcısı 2008 yılında da Müdür olarak görev yaptım. 15 Mart 2010 yılına kadar Müdürlük yaptım. Uğur bey kızağa çekmek istedi Yapı işlerinde bir yere vereceklerdi kabul etmedim emekli oldum.

S: Onkoloji Hastane Müdürünün görevi nedir?. Cihazlar Hastaneye gelmeye başladığından itibaren süreç nasıl oldu?

C: Geçici kabulleri yapıyorduk. Kutular açılırken cihazların yanında duruyorduk Meral hanımla birlikte. Ambalajla beraber geliyordu cihazlar İncekaralar parka koydu. Yer istediler. Yönetimde parka konulmasını söyledi. Onkoloji Hastanesi başhekimisi parka konmasını söyledi. Nasıl söylendiğini bilmiyorum.

S: Hastane müdürü olarak şuraya koy buraya koy dediniz mi? Siz sadece başında mı duruyordunuz?

C: Şuayip beyle yeri keşfediyorduk. İncekaralar bize sevkiyat listesi veriyordu

S: Tezer bey sizi arıyordu şuraya indirin diye öyle mi?

Fily Erman

la

C: Evet. Başhekim ve Tezer beyle keşfediyorduk.

S: Paketlerle beraber nasıl karşılaşıyordunuz?

C: Aynı anda Yılmaz Bey Aylin hanım, ve Özgür Çivi oluyordu.

S: Hastaneyi temsilen kimler vardı

C: Meral hanım Ben ve İncekaralar firmasından 3 kişi oluyordu. İndirici elemanlar oluyordu.

S: Esenboğadan kim getirdi.

C: İncekaralar firması.

S: Esenboğadan gümrükten çekilmesi gerekiyor kim çekiyordu malzemeyi?

C: Üniversiteden İdari Mali İşlerden Yaşar bey çekiyordu.

S: Siz bu cihazlar depolandığı yerden montaj yerine eşlik ettiniz değil mi?

C: Evet

S: Klimaların Tezer bey yada Şuayip bey söylediği için mi oraya kondu

C: Yönetim söylediği için koyduk. Şuayip beyde söylemiş olabilir Tezer beyde.

S: Üniversitenin genel direktörü bir cihaz geldiğinde nereye konacağını size mi bildiriyor?

C: Ya yüzyüze ya telefonla bildiriyor. Sekreter bağlıyor Tezer beyle görüşüyorduk.

S: İncekaralar kendisi mi naylonladı?

C: Evet. Bakıyorlardı yağmur var mı diye değiştirilmesi gerekiyorsa naylonları değiştiriyorlardı.

S: Hacettepenin kendi naylonu yok muydu İncekaralar naylonladı.

c: Evet İncekaralar naylonlamıştı.

S: Üniversitenin park yerine konulan bir cihaz Üniversitenin malı mıdır? Firmanın malı mıdır?

C: Kabulü yapılmadıysa Firmanın malıdır.

S: Gümrükten Üniversitemiz çekildiği için üniversitenin malı olmuyor mu?

C: Evet.

S: İncekaralar naylonlama işini kaç yıl süre ile yaptı?

C: Cihaz yukarı çıkana kadar yapıldı. 3 yıl gibi bir süre, gerektiğçe.

S: Cihazları kontrol ettiler mi pas kir var mı diye?

C: Evet ettiler.

S: Park yerinden alıp yukarı çıkarma işini kim yaptı?

C: Somut yaptı.

Filiz Erkan

Lu

[Signature]

S: İncekaralar ve Beyazın elemanları var mıydı çıkarma işi yapılırken?

C: İncekalardan ve Beyaz firmasının geldiğini gördüm Beyaz firmasını görmedim. Beyaz firmasından kimseyi görmedim.

S: Bu süreçte Beyazdan biri gelmiş olsa tanır mıydınız?

C: Hayır.

S: Yukarı çıkarılırken orda mıydınız? Bu cihazlar su almış gibi konuşmalar oldu mu?

C: Evet konuşuldu. Ondan sonra yukarı çıkardılar.

S: Klimalar açıldığı anda oradamıydınız?

C: Somut firmasından Celal bey açtı su almış dedi. İncekaralarada söyledi. Montajın yapılıp yapılmadığını görmedim.

S: Ambalajından açılarak mı çıkarıldı?

C: Evet. Somut ve İncekaralar beraber çıkardı. Somut firması taşıyıcıları getirdi 4. Kata çıkardılar. Bölüm 94

S: Daha sonra kuruldu mu kurulmadı mı bilginiz yok. Yapı İşlerinden kimse varmıydı?

C: Hayır yok. Yapı İşlerinden kimse yoktu. Yapı İşlerinden kimseyi çağırmamıştınız.

S: Hastane Başhekimi değil de Genel Direktör mü bildirdi cihazların geleceğini?

C: Evet. Cihazları ölçüyorduk boyutlarını kapıdan sığar mı diye Meral hanımla sonra bilgi veriyorduk.

S: Arızalı paketi açtılar yani? Tezer bey mi açın dedi kim dedi?

C: Bilmiyorum.

S: Kimin aç dediğine dair tutanak yok mu?

C: Bilmiyorum.

S: Oto parkta bekleyen cihazları 4. Kata çıkmasını kim söyledi.

C: Tezer bey söyledi. Haftasonu çıkardık.

S: Bize başka söylemek istediğiniz bilgi belge var mı? Bütün cihazlar kapalı alana konulmuş Klimalar Park yerine konulmuş bunu size söyleyen Prof.Dr.Tezer Kutluk öyle mi?

C: Evet

S: Siz hastane müdürü olarak Özgür beyi hiç uyardınız mı? Cihazlar kar altında duruyor diye uyardınız mı?

C: Yağmurda küfleneceğini bilemem ki.

S: Ama ıslanıyor?

Fatih Erkan

C: Teknik eleman değilim ki bilemem ki.

S: İncekaraları da siz uyardınız bir depo kiralayalım şeklinde?

C: Hayır.

S: Tezer bey mi o park yerine koyun dedi Şuayip bey mi?

C: Tezer bey söyledi.

S: Bu klimaları oraya kim koydurdu açık havaya?

C: Ben kafamdan koymadım ki Tezer bey söyledi. İncekaraların müdürü Yılmaz bey geldi parka koycaz dedi. Tezer beyle konuştuk parka koycaz dedi. Ben klimalara yer arıyordum. İncekaraların müdürü Yılmaz bey geldi parka koyalım dedi. Kapatma işleminin maliyeti fazla tutar diye naylonlandı. Oluklu çatı gibi yapmayı düşünüyorlardı. Meteksana maliyet hesabı çıkartmışlar fazla tutunca naylonlandı. *la kapatmış. yapmadılar ve*

S: Çok mu fazla maliyetliydi. Miktar belli mi?

C: Bilmiyorum.

S: Üniversiteden değil de neden firmadan naylonlanması istendi?

C: Cihazın firmanın diye firmadan istedin.

S: 2007 yılında Klimalar yukarı çıkarken cihazın su aldığını gördünüz mü?

C: Evet. *Azıkla cihaza içinde su vardı. Evet paslanmış. Su aktığını gördük. Benden önce klimaların su aldığını fark etmedim*

S: Paketin açmadan anlayamadınız mı zarar gördüğünü?

C: Hayır teknik eleman olmadığım için anlayamadım.

S: Siz hiyerarşik olarak Başhekiye mi bağlısınız?

C: Evet

S: Tezer bey gördü mü indirdikten ve çıkardıktan sonra?

C: Tezer beyin hepsinden haberi var.

S: Naylonla muhafaza edildiğin malların böyle olduğunu başka bilen varmıydı?

C: Klimalar geldiğinde Rektörün haberi var mı bilmiyorum. Tezer beyin Şuayip beyin haberi vardı.

S: Şuayip bey biliyodu dediniz. Meral hanımda biliyormuydu cihazların durumu naylonlandığını?

C: Tabi vardı.

S: Yetkililerin cihazların nereye konduğunu gezerken gördünüz mü?

C: Hayır görmedim.

S: Böyle bakınca kutunun ıslanıp ıslanmadığını anlamadınız mı?

Fahri Ercan

*İncekaralar
Firması
→ Yılmaz Bey
kapatılmadan
vazgeçti,
klimaları
naylonladı,
Tezer Bey'in
bundan haberi
var.*

C: Su alan yerler ıslaktı alt taraflar.

S: Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?


C: Hayır yok.

S: Mutemetler kimlerdi o zamanlar?

C: Memurda var hemşire de var. Her bölümün mutemedi var.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Ertuğrul KALE



BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 14839083882
ADI VE SOYADI : ERTUĞRUL KALE
BABA ADI : HALİM
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 04.09.1955 - VİRANCIK
İKAMET ADRESİ : CEMAL GÜRSEL CAD. KALE APT. 8/5
GÖLBAŞI/ANKARA
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0532 711 78 20
ÜNVANI : EMEKLİ
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU
TARİH VE SAAT : 17.07.2012 Saat: 16:00
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : H.Ü. ONKOLOJİ HASTANESİ - HASTANE MÜD.
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : EMEKLİ
KONU :
MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap:

1998 yılından 2007 yılına kadar Onkoloji Hastanesi Müdür Yardımcısı 2008 yılında da Müdür olarak görev yaptım. 15 Mart 2010 yılına kadar Müdürlük yaptım. Uğur bey kızağa çekmek istedi Yapı işlerinde bir yere vereceklerdi kabul etmedim emekli oldum.


S: Onkoloji Hastane Müdürünün görevi nedir?. Cihazlar Hastaneye gelmeye başladığından itibaren süreç nasıl oldu?

C: Geçici kabulleri yapıyorduk. Kutular açılırken cihazların yanında duruyorduk Meral hanımla birlikte. Ambalajla beraber geliyordu cihazlar İncekaralar parka koydu. Yer istediler. Yönetimde parka konulmasını söyledi. Onkoloji Hastanesi başhekimisi parka konmasını söyledi. Nasıl söylendiğini bilmiyorum.

S: Hastane müdürü olarak şuraya koy buraya koy dediniz mi? Siz sadece başında mı duruyordunuz?

C: Şuayip beyle yeri keşfediyorduk. İncekaralar bize sevkiyat listesi veriyordu

S: Tezer bey sizi arıyordu şuraya indirin diye öyle mi?



C: Evet. Başhekim ve Tezer beyle keşfediyorduk.

S: Paketlerle beraber nasıl karşılaşıyordunuz?

C: Aynı anda Yılmaz Bey Aylin hanım, ve Özgür Çivi oluyordu.

S: Hastaneyi temsilen kimler vardı

C: Meral hanım Ben ve İncekaralar firmasından 3 kişi oluyordu. İndirici elemanlar oluyordu.

S: Esenboğadan kim getirdi.

C: İncekaralar firması.

S: Esenboğadan gümrükten çekilmesi gerekiyor kim çekiyordu malzemeyi?

C: Üniversiteden İdari Mali İşlerden Yaşar bey çekiyordu.

S: Siz bu cihazlar depolandığı yerden montaj yerine eşlik ettiniz değil mi?

C: Evet

S: Klimaların Tezer bey yada Şuayip bey söylediği için mi oraya konu

C: Yönetim söylediği için koyduk. Şuayip beyde söylemiş olabilir Tezer beyde.

S: Üniversitenin genel direktörü bir cihaz geldiğinde nereye konacağını size mi bildiriyor?

C: Ya yüzyüze ya telefonla bildiriyor. Sekreter bağlıyor Tezer beyle görüşüyorduk.

S: İncekaralar kendisi mi naylonladı?

C: Evet. Bakıyorlardı yağmur var mı diye değiştirilmesi gerekiyorsa naylonları değiştiriyorlardı.

S: Hacettepenin kendi naylonu yok muydu İncekaralar naylonladı.

C:Evet İncekaralar naylonlamıştı.

S. Üniversitenin park yerine konulan bir cihaz Üniversitenin malı mıdır? Firmanın malı mıdır?

C: Kabulü yapılmadıysa Firmanın malıdır.

S: Gümrükten Üniversitemiz çekildiği için üniversitenin malı olmuyor mu?

C: Evet.

S: İncekaralar naylonlama işini kaç yıl süre ile yaptı?

C: Cihaz yukarı çıkana kadar yapıldı. 3 yıl gibi bir süre, gerektikçe.

S: Cihazları kontrol ettiler mi pas kir var mı diye?

C: Evet ettiler.

S: Park yerinden alıp yukarı çıkarma işini kim yaptı?

C: Somut yaptı.



S: İncekaralar ve Beyazın elemanları var mıydı çıkarma işi yapılırken?

C: İncekalardan ve Beyaz firmasının geldiğini gördüm Beyaz firmasını görmedim. Beyaz firmasından kimseyi görmedim.

S: Bu süreçte Beyazdan biri gelmiş olsa tanır mıydınız?

C: Hayır.

S: Yukarı çıkarılırken orda mıydınız? Bu cihazlar su almış gibi konuşmalar oldu mu?

C: Evet konuşuldu. Ondan sonra yukarı çıkardılar.

S: Klimalar açıldığı anda oradamıydınız?

C: Somut firmasından Celal bey açtı su almış dedi. İncekaralarada söyledi. Montajın yapıp yapılmadığını görmedim.

S: Ambalajından açılarak mı çıkarıldı?

C: Evet. Somut ve İncekaralar beraber çıkardı. Somut firması taşıyıcıları getirdi 4. Kata çıkardılar. Bölüm 94

S: Daha sonra kuruldu mu kurulmadı mı bilginiz yok. Yapı İşlerinden kimse varmıydı?

C: Hayır yok. Yapı İşlerinden kimse yoktu. Yapı İşlerinden kimseyi çağırmaştınız.

S: Hastane Başhekimi değil de Genel Direktör mü bildirdi cihazların geleceğini?

C: Evet. Cihazları ölçüyorduk boyutlarını kapıdan sığar mı diye Meral hanımla sonra bilgi veriyorduk.

S: Arızalı paketi açtılar yani? Tezer beyi açın dedi kim dedi?

C: Bilmiyorum.

S: Kimin aç dediğine dair tutanak yok mu?

C: Bilmiyorum.

S: Oto parkta bekleyen cihazları 4. Kata çıkmasını kim söyledi.

C: Tezer bey söyledi. Haftasonu çıkardık.

S: Bize başka söylemek istediğiniz bilgi belge var mı? Bütün cihazlar kapalı alana konulmuş Klimalar Park yerine konulmuş bunu size söyleyen Prof.Dr.Tezer Kutluk öyle mi?

C: Evet

S: Siz hastane müdürü olarak Özgür beyi hiç uyarmadınız mı? Cihazlar kar altında duruyor diye uyarmadınız mı?

C: Yağmurda küfleneyeceğini bilemem ki.

S: Ama ıslanıyor?

Fatih Ercan

le

C: Teknik eleman değilim ki bilemem ki.

S: İncekaraları da siz uyardınız mı? bir depo kiralayalım şeklinde?

C: Hayır.

S: Tezer bey mi o park yerine koyun dedi Şuayip bey mi?

C: Tezer bey söyledi.

S: Bu klimaları oraya kim koydurdu açık havaya?

C: Ben kafamdan koymadım ki Tezer bey söyledi. İncekaraların müdürü Yılmaz bey geldi parka koyacaz dedi. Tezer beyle konuştuk parka koyacağız dedi. Ben klimalara yer arıyordum. İncekaraların müdürü Yılmaz bey geldi parka koyalım dedi. Kapatma işleminin maliyeti fazla tutar diye naylonlandı. Oluklu çatı gibi yapmayı düşünüyorlardı. İncekaralar firması Meteksana maliyet hesabı çıkarttırmışlar fazla tutunca yapmadılar ve naylonla kapattılar. Yılmaz Bey kapattırmaktan vazgeçti, klimaları naylonladılar. Tezer bey'in bundan haberi var.

S: Çok mu fazla maliyetliydi. Miktar belli mi?

C: Bilmiyorum.

S: Üniversiteden değil de neden firmadan naylonlanması istendi?

C: Cihaz firmanın diye firmadan istedim.

S: 2007 yılında Klimalar yukarı çıkarken cihazın su aldığını gördünüz mü?

C: Açtıklarında cihazın içinde su vardı, Bundan önce klimaların su aldığını farketmedim.

S: Paketin açmadan anlayamadınız mı zarar gördüğünü?

C: Hayır teknik eleman olmadığım için anlayamadım.

S: Siz hiyerarşik olarak Başhekime mi bağlısınız?

C: Evet

S: Tezer bey klimaları gördü mü indirdikten ve çıkardıktan sonra?

C: Tezer beyin hepsinden haberi var.

S: Naylonla muhafaza edildiğini, klimaların ıslandığını başka bilen var mıydı?

C: Klimalar geldiğinde Rektörün haberi var mı bilmiyorum. Tezer beyin Şuayip beyin haberi vardı.

S: Şuayip bey biliyordu dediniz. Meral hanımda biliyormuydu cihazların durumu naylonlandığını?

C: Tabi vardı.

S: Yetkililerin cihazların nereye konduğunu gezerken gördünüz mü?

C: Hayır görmedim.

Fily Erkan *En* *[Signature]*

S: Böyle bakınca kutunun ıslanıp ıslanmadığını anlamadınız mı?

C: Su alan yerler ıslaktı alt taraflar.

S: Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?

C: Hayır yok.

S: Mutemetler kimlerdi o zamanlar?

C: Memurda var hemşire de var. Her bölümün mutemedi var.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Ertuğrul KALE



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2634

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Ertuğrul KALE,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 15:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 40711165544
 ADI VE SOYADI : M. NEJAT ERTÜRK
 BABA ADI : ABDULLAH
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 1948 - KALAN
 İKAMET ADRESİ : ÜÇEV SOK. NO: 16-5 YENİMAHALLE/ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0532 633 86 59
 ÜNVANI : ECZACI
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU
 TARİH VE SAAT : 17.07.2012 Saat: 16:50
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : DAİRE BAŞKANI
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : ECZACI
 KONU :
 MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap:

İdari ve Mali İşler Dairesi Gümrüğe gelen malzemeyi Gümrük işlerini takip eden memur Yaşar Andıç eşliğinde Gümrükten çekerek ilgili yer olan Onkoloji Hastanesine getirir. Buradaki işlemlerin işleyişi şöyledir. Malzeme Onkolojiye teslim edildikten sonra geçici taşınır işlem fişi ilgili birimce kesilir. 03.08.2007 tarihli Ek (2) belgesi (geçici taşınır işlem fişi) düzenlenince Malzemenin sorumluluğu Taşınır Kayıt Kabul yetkilisinin üzerindedir. Daha sonra Muayene Komisyonunun gelen malzemeyi kontrol etmesi ve siparişe uygunluğunu onaylayan raporu düzenlenir. 26.01.2009 tarihli Muayene Komisyon raporu Ek (3).

Bu rapora istinaden yine ilgili birim Tanışır Kayıt Kabul yetkilisi, Taşınır İşlem Fişini ve Tanışır İcmal Listesini düzenler ve ilgili birimlere gönderir Ek(4) ve Ek(5). Anlaşılacağı üzere fatura tarihi 13.07.2007 dir. Geçici Taşınır İşlem belgesi ise 03.08.2007 dir. Yani İdari ve Mali İşlerin yaklaşık 20 günlük bir işlem sonunda malzemeyi koruma ile ilgili sorumluluğu bitmiştir.

S: Sizin imzaladığımız İngilizce bir belge var. Klimalar 26.06.2007'den itibaren kuru yerde bekletilmiştir diye. Siz bu İngilizce metni niçin imzaladınız?

C: Burada amaç malzemenin garanti süresinin uzatılmasıdır. Bu üniversitenin menfaatinedir.

Fatih Ercan *Can* *SE* *[Signature]*

S: Yalnız burada Marubeninin yolladığı yazıda. Hacettepe Üniversitesi Rektörünün imzalaması gereken belgeyi siz imzalamışsınız?

C: Tezer hoca bu yazı beni ilgilendirmiyor Nejat bey imzalayabilir demiş. Beni aradı diye hatırlıyorum garanti süresi uzatılıyor dedi. Bende imzaladım diye hatırlıyorum. Islak imza olup olmadığını bilmiyorum. Islak imza olmayabilir de. Klimaların nerede olduğunu bilmiyordum. Kuru yerde olduğunu düşünerek imzaladım. Çünkü saklama koşullarından Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi sorumludur. Benim sorumluluğumda değil. 2007 de bitmesi gereken garanti 2009 sonuna kadar uzatıldı güvene dayalı olarak imzaladım.

S: Siz kuru bir yerde saklandığını nereden biliyorsunuz?

C: Evet bana söylenen malzemeler şurada hiçbir sıkıntı yok denildi diye hatırlıyorum.

S: Turgut beyin imzası sizin imzanızdan sonra?

C: Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi imza atıp malzemeyi aldım diye imzalamış Komisyon raporundan sonra kesin işlem yapılıyor Stratejiye bildirilip icmal yapılıyor. 3 Ağustos 2007, 26.01.2009, 30.01.2009 tarihli belgeler.

S:İngilizce metin derki 11 Nisan 2007'deki tedarik sözleşmesi uyarınca ürünler için olan yazı sizin tarafınızdan imzalanmış, ne zaman imzalandınız?

C: Bilmiyorum.

Marubeni firmasından İbrahim Beyin anlattığına göre; Prof.Dr.Uğur Erdener Bey'e yazıyı götürdük o da Tezer Hocaya götürün demiş oda beni aradı diye hatırlıyorum. Hacettepenin burada kârı var garanti 2 yıl uzatacak dedi. Bende imzaladım. Bu mektup iyi niyet mektubu burada karşı tarafında imzası yok.

S: Bu belgeyi imzalamakla hem kendinizi hem Üniversiteyi bağlamış oluyorsunuz?

C: Bunların bir hukuki gerekçesinin olmadığını tahmin ediyorum. Zaten karşı tarafında imzası yok. Bu Protokol değil diye düşünüyorum

S: Marubeniden geliyor bu Marubeninin imzası yok sizin imzanız var.

C: Hatırlamıyorum.

S: Bu belge sahte mi?

C: Bilmiyorum. Bu belge Hacettepe ve Marubeni tarafından Weiss'e yazılmış mektuptur. Marubenin de imzası yok. Burada parafta yok. İmzalamış olabilirim ama ıslak imzayı isteriz. Tam net hatırlamıyorum: Ya da kaşem basıldı.

S: Kaşeniz varsa herkes rahat ulaşabiliyor mu?

C: Kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. Islak imza olup olmadığını anladıktan sonra gerekli bilgileri o zaman verebilirim.

S: İngilizce metni imzalamanız için size verilen resmi bir görevlendirme var mı?

C: Yok. Yazı Rektörlükten gelirse/görevlendirilmiş sayılırım.

S: Sonuç olarak ne diyorsunuz?

S: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak sizin bir üstünüz Atilla Konaç mıydı?

C: Evet. Muhtemelen.

S: O sizin amiriniz durumunda değil mi? Rektör adına bu belgeyi imzaladığınızdan haberi var mı?

C: Hatırlamıyorum. Ama Tunçalp hoca zamanında her akşam 17:30 gibi toplantı yapılırdı bu toplantılarda bahsetmiş olabilirim.

S: Oraya kurulan klimalar Mali İşlerin gözünde kimin malı?

C: Bilemem o konuda fikir beyan edemem.

S: Klimalar böyle. Bu klimalar gelip oraya kondu. Park yerinde 3 yıl durdu. Klimaları 3 yıllık süre zarfında orada gördünüz mü?

C: Hiç görmedim. Dediğim gibi Taşınır İşlem Fişi kesildikten sonra İdari ve Mali İşlerin sorumluluğu yok.

S: Bu klimaların 3 yıldır park yerinde durduğuna dair hiçbir şey duymadınız mı?

C: Hayır bu konuyla ilgili hiç bilgi verilmedi bana.

S: Siz 2010 yılında mı emekli oldunuz?

C: 2012 yılında emekli oldum.

S: Peki bu eksik olan malzemeler var bunları hiç bilmiyor musunuz?

C: Biz teslimi yaparız bizim işimiz biter. Bunları alan geçici muayene komisyonu ve kesin muayene komisyonları bilir.

S: Klimaların yerine taşınacağından haberiniz var mı?

C: Bize hiçbir şey söylemediler. Bilgim yok.

S: Brakiterapi – PET-BT eksik malzemeler hakkında bilginiz var mı?

C: Bilmiyorum. Bunları muayene komisyonunda imzası olanlar bilir.

S: 9 tane cihazın kesin kabulü yok.

C: Bilemem bunları ilgili birimlere sormak gerekir.

S: Teminatlar neye göre iade edilir.

C: Firma bütün sorumluluklarını yerine getirip ve malzemeyi teslim ettiğini beyan edince Hastaneler Genel Direktörlüğüne teminatların iadesi hakkında resmi yazı yazılarak yapılacak işleme esas olmak üzere görüş sorarız. Bu işlemler resmi yazı ile yapılır. Gelen cevaba göre teminatların iadesi talimatı verilirse işlem yapılmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir.

S: Bize söyleyeceğiniz başka bilgi belge var mı?

Fulya Eren *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*


C: Anlattığım gibi biz İdari Mali İşler olarak Gümrükten malı İncekaralar firmasından bir eleman ile beraber ilgili memurumuz çeker, Geçici Taşınır İşlem fişi kesildikten sonra malzemeyi korumak taşınır kontrol yetkilisi kişiye aittir.

EKLER :

- 1- 13.07.2007 tarihli Marubeni Euro Plc'ye ait fatura.
- 2- 03.08.2007 Taşınır Geçici Alındı belgesi.
- 3- 26.01.2009 tarih, 17 sayılı Muayene Komisyon Raporu.
- 4- 30.01.2009 tarih, 17 Fiş sıra nolu Taşınır İşlem Fişi.
- 5- 30.01.2009 tarih, 17 sıra no'lu Taşınır İcmal Cetveli.

Soruşturmacı


Prof.Dr. Filiz ERCAN



Prof.Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof.Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

M. Nejat ERTÜRK



BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 40711165544
ADI VE SOYADI : M. NEJAT ERTÜRK
BABA ADI : ABDULLAH
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 1948 - KALAN
İKAMET ADRESİ : ÜÇEV SOK. NO: 16-5 YENİMAHALLE/ANKARA
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0532 633 86 59
ÜNVANI : ECZACI
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU
TARİH VE SAAT : 17.07.2012 Saat: 16:50
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : DAİRE BAŞKANI
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : ECZACI
KONU :

MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap:

İdari ve Mali İşler Dairesi Gümrüğe gelen malzemeyi Gümrük işlerini takip eden memur Yaşar Andıç eşliğinde Gümrükten çekerek ilgili yer olan Onkoloji Hastanesine getirir. Buradaki işlemlerin işleyişi şöyledir. Malzeme Onkolojiye teslim edildikten sonra geçici taşınır işlem fişi ilgili birimce kesilir. 03.08.2007 tarihli Ek (2) belgesi (geçici taşınır işlem fişi) düzenlenince Malzemenin sorumluluğu Taşınır Kayıt Kabul yetkilisinin üzerindedir. Daha sonra Muayene Komisyonunun gelen malzemeyi kontrol etmesi ve siparişe uygunluğunu onaylayan raporu düzenlenir. 26.01.2009 tarihli Muayene Komisyon raporu Ek (3).

Bu rapora istinaden yine ilgili birim Tanışır Kayıt Kabul yetkilisi, Taşınır İşlem Fişini ve Tanışır İcmal Listesini düzenler ve ilgili birimlere gönderir Ek(4) ve Ek(5). Anlaşılacağı üzere fatura tarihi 13.07.2007 dir. Geçici Taşınır İşlem belgesi ise 03.08.2007 dir. Yani İdari ve Mali İşlerin yaklaşık 20 günlük bir işlem sonunda malzemeyi koruma ile ilgili sorumluluğu bitmiştir.

S: Sizin imzaladığınız İngilizce bir belge var. Klimalar 26.06.2007'den itibaren kuru yerde bekletilmiştir diye. Siz bu İngilizce metni niçin imzaladınız?

C: Burada amaç malzemenin garanti süresinin uzatılmasıdır. Bu üniversitenin menfaatinedir.

Fatih Erkan *Erkan* *SE* *Mutlu*

S: Yalnız burada Marubeninin yolladığı yazıda. Hacettepe Üniversitesi Rektörünün imzalaması gereken belgeyi siz imzalamışsınız?

C: Tezer hoca bu yazı beni ilgilendirmiyor Nejat bey imzalayabilir demiş. Beni aradı diye hatırlıyorum garanti süresi uzatılıyor dedi. Bende imzaladım diye hatırlıyorum. Islak imza olup olmadığını bilmiyorum. Islak imza olmayabilir de. Klimaların nerede olduğunu bilmiyordum. Kuru yerde olduğunu düşünerek imzaladım. Çünkü saklama koşullarından Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi sorumludur. Benim sorumluluğumda değil. 2007 de bitmesi gereken garanti 2009 sonuna kadar uzatıldı güvene dayalı olarak imzaladım.

S: Siz kuru bir yerde saklandığını nereden biliyorsunuz?

C: Evet bana söylenen malzemeler şurada hiçbir sıkıntı yok denildi diye hatırlıyorum.

S: Turgut beyin imzası sizin imzanızdan sonra?

C: Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi imza atıp malzemeyi aldım diye imzalamış Komisyon raporundan sonra kesin işlem yapılıyor Stratejiye bildirilip icmal yapılıyor. 3 Ağustos 2007, 26.01.2009, 30.01.2009 tarihli belgeler.

S: İngilizce metin derki 11 Nisan 2007'deki tedarik sözleşmesi uyarınca ürünler için olan yazı sizin tarafınızdan imzalanmış, ne zaman imzaladınız?

C: Bilmiyorum.

Marubeni firmasından İbrahim Beyin anlattığına göre; Prof.Dr.Uğur Erdener Bey'e yazıyı götürdük o da Tezer Hocaya götürün demiş oda beni aradı diye hatırlıyorum. Hacettepenin burada kârı var garanti 2 yıl uzatacak dedi. Bende imzaladım. Bu mektup iyi niyet mektubu burada karşı tarafında imzası yok.

S: Bu belgeyi imzalamakla hem kendinizi hem Üniversiteyi bağlamış oluyorsunuz?

C: Bunların bir hukuki gerekçesinin olmadığını tahmin ediyorum. Zaten karşı tarafında imzası yok. Bu Protokol değil diye düşünüyorum

S: Marubeniden geliyor bu Marubeninin imzası yok sizin imzanız var.

C: Hatırlamıyorum.

S: Bu belge sahte mi?


C: Bilmiyorum. Bu belge Hacettepe ve Marubeni tarafından Weiss'e yazılmış mektuptur. Marubenin de imzası yok. Burada parafta yok. İmzalamış olabilirim ama ıslak imzayı isteriz. Tam net hatırlamıyorum: Ya da kaşem basıldı.

S: Kaşeniz varsa herkes rahat ulaşabiliyor mu?

C: Kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. Islak imza olup olmadığını anladıktan sonra gerekli bilgileri o zaman verebilirim.

S: İngilizce metni imzalamanız için size verilen resmi bir görevlendirme var mı?

C: Yok. Yazı Rektörlükten gelirse görevlendirilmiş sayılırım.



S: Sonuç olarak ne diyorsunuz?

S: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak sizin bir üstünüz Atilla Konaç mıydı?

C: Evet. Muhtemelen.

S: O sizin amiriniz durumunda değil mi? Rektör adına bu belgeyi imzaladığınızdan haberi var mı?

C: Hatırlamıyorum. Ama Tunçalp hoca zamanında her akşam 17:30 gibi toplantı yapılırdı bu toplantılarda bahsetmiş olabilirim.

S: Oraya kurulan klimalar Mali İşlerin gözünde kimin malı?

C: Bilemem o konuda fikir beyan edemem.

S: Klimalar böyle. Bu klimalar gelip oraya kondu. Park yerinde 3 yıl durdu. Klimaları 3 yıllık süre zarfında orada gördünüz mü?

C: Hiç görmedim. Dediğim gibi Taşınır İşlem Fişi kesildikten sonra İdari ve Mali İşlerin sorumluluğu yok.

S: Bu klimaların 3 yıldır park yerinde durduğuna dair hiçbir şey duymadınız mı?

C: Hayır bu konuyla ilgili hiç bilgi verilmedi bana.

S: Siz 2010 yılında mı emekli oldunuz?

C: 2012 yılında emekli oldum.

S: Peki bu eksik olan malzemeler var bunları hiç bilmiyor musunuz?

C: Biz teslimi yaparız bizim işimiz biter. Bunları alan geçici muayene komisyonu ve kesin muayene komisyonları bilir.

S: Klimaların yerine taşınacağından haberiniz var mı?

C: Bize hiçbir şey söylemediler. Bilgim yok.

S: Brakiterapi – PET-BT eksik malzemeler hakkında bilginiz var mı?

C: Bilmiyorum. Bunları muayene komisyonunda imzası olanlar bilir.


S: 9 tane cihazın kesin kabulü yok.

C: Bilemem bunları ilgili birimlere sormak gerekir.

S: Teminatlar neye göre iade edilir.

C: Firma bütün sorumluluklarını yerine getirip ve malzemeyi teslim ettiğini beyan edince Hastaneler Genel Direktörlüğüne teminatların iadesi hakkında resmi yazı yazılarak yapılacak işleme esas olmak üzere görüş sorarız. Bu işlemler resmi yazı ile yapılır. Gelen cevaba göre teminatların iadesi talimatı verilirse işlem yapılmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir.

S: Bize söyleyeceğiniz başka bilgi belge var mı?




C: Anlattığım gibi biz İdari Mali İşler olarak Gümrükten malı İncekaralar firmasından bir eleman ile beraber ilgili memurumuz çeker, Geçici Taşınır İşlem fişi kesildikten sonra malzemeyi korumak taşınır kontrol yetkilisi kişiye aittir.

EKLER :

- 1- 13.07.2007 tarihli Marubeni Euro Plc'ye ait fatura.**
- 2- 03.08.2007 Taşınır Geçici Alındı belgesi.**
- 3- 26.01.2009 tarih, 17 sayılı Muayene Komisyon Raporu.**
- 4- 30.01.2009 tarih, 17 Fiş sıra nolu Taşınır İşlem Fişi.**
- 5- 30.01.2009 tarih, 17 sıra no'lu Taşınır İcmal Cetveli.**

Soruşturmacı


Prof.Dr. Filiz ERCAN



Prof.Dr. Canan HEKİMOĞLU




Prof.Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

M. Nejat ERTÜRK





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/ 410 - 2635

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Ecz. M. Nejat ERTÜRK,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 16:00'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 34471248340
 ADI VE SOYADI : Meral KİRAZLI
 BABA ADI : İbrahim
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : Çorum-01.01.1977
 İKAMET ADRESİ : Şehit Bahadır Demir Sok. 5/12 Maltepe- Çankaya-Ankara
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : İş : 305 41 56 Cep :0 535 877 77 34
 ÜNVANI : Sözleşmeli Memur
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
 TARİH VE SAAT : 16.07.2012 15:30
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : 2007 – İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Şef
 2007-2008 – Onkoloji Hastanesi, Şef
 2008-2010 – Onkoloji Hastanesi, Hastane Müdür Yard.
 2010-2012 – Onkoloji Hastanesi, Hastane Müdürü

ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Maliyet Muhasebesi birimi, Memur

KONU :
 MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında

VERİLEN BİLGİDE :

S: 171 kalem malzemeler alındığında hangi görevde bulunuyordunuz?

C: Çocuk Hastanesindeydim.

S: Cihazlar alındığında hep ordamıydınız ?

C: 2007 nin Eylül ayından beri Onkoloji Hastanesindeyim

S: Alım satımlarda göreviniz ne idi?

C: Malzeme geldiği zaman indirim ve depolanmasında orada bulunuyordum.

S: Malzemelerin tam ve eksiksiz olduğunu siz mi kontrol ediyordunuz?

C: Ben sadece gelen malzemelerin yükleme listesinde belirtilen kutu ya da koli sayısına göre teslim alıyordum. Kutunun içinde ne olduğuna dair bilgimiz olmazdı.

S: Klimaların ana üniteleri dışarıda duruyordu. Cihazların niçin dışarıda durduğunu hiç sorguladınız mı? Bununla ilgili bir yazı yazdınız mı?

C: Resmi yazı yazmadık. Sözel olarak Genel Direktörlüğe iletilti. İncekaralar Firması uyarı üzerine yeniden naylon getirip ambalajladılar. Bazı cihazların (Linak vs.) dışarıda kalmaması gerektiği söylendiği için onlara depo kiralanarak oraya konuldu. Klimalarla ilgili böyle bir uyarı yapılsaydı klimalarda o depoya konulabilirdi.

S: Parkta olanlar ne zaman binanın içine alındı? Beyaz Firması taşıma sırasında oradamıydı?

C: Ben Onkoloji Hastanesi'ne geldiğimde ana üniteler dışarıda idi fakat Onkoloji Hastanesi deposunda filtre, motor gibi parçaları vardı bunları beyaz teknik firmasından gelen bir yetkili ile inşaat esnasında montajlanacak olanları Somut firmasına tutanakla teslim ettim. 2011 yılında kemik iliği ünitesinin inşaatı bitti. Tutanak karşılığı Beyaz Teknik ile birlikte parçaları Somut firmasına verdim. Parkta olanlar 2009 yılında yerine çıkartılmış olmalı, çok emin değilim. İncekaralar firması yetkilisi ve Beyaz Teknik firması yetkilisi gözetiminde cihazlar ilgili katlardaki yerlerine taşındı.

S: Bize tutanakları verir misiniz?

C: Oradan ayrıldım. Ulaşabildiğim ölçüde evrakları vermeye çalışırım.

S: Somuta bu görevi kim verdi?

C: Bilgim yok. Klimalar kurulmadı diye biliyorum. Beyaz Teknik bunları kurması gerek. İnşaat işlerini Yapı İşleri denetler.

S: Klimalar niye çalıştırılmadı?

C: İnşaatlar tamamlanmadığı için olabilir. Beyaz tekniği sadece cihazlar yerine taşınırken ve yedek parçaları teslim ederken gördüm. Benim gördüğüm kanalların çekildiği cihazların çalıştırmayı firmanın reddettiğini bilmiyorum. Monte kısmını bilmiyorum. Ben teknik kişi değilim. Montajı bilmiyorum. Sadece bakıyoruz. Ana cihazların bulunduğu alan kapalı. Tavana motorun konduğunu, kanalların çekildiğini gördüm. Ama niye çalıştırılmadığını bilmiyorum. İnşaat bitmediği için olabilir. Doğum izninden döndüğümde kemik iliği ünitesi bitmemişti. Yoğun bakım ünitesi bitmişti. Yeni Rektörlük döneminde bitti. 15 gün çalıştım (26 Aralık) sonra gittim.

S: Klimanın Elektronik Kartlarının alındığından haberiniz var mı?

C: Yok.

S: Brakiterapi cihazı kurulduğunda görevdeydiniz. Kurulumda kontrolü kim yapmıştır? Bu cihazın malzemelerinde eksik olduğunu biliyor musunuz?

C: Radyasyon Onkolojisi yaptı. Doğum izninden döndükten sonra bir yazı geldiğini gördüm ondan önce başka bir duyumum olmadı. Malzemeleri görmedim. Birimlere çıkarılmasında vardım. 2010 yılında kuruldu.

S: İncekaralar bu işin neresinde?

C: İncekaralar yüklenici firma.

S: Somut firması da montajı yaptı sizde oradaydınız. Sistem çalıştırdılar mı?

C: 2009 da klimalar sadece yukarı çıkartıldı. İnşaat birlikte giden bir çalışma. Sistemi denemek için çalıştırıp çalıştırmadıklarını bilmiyorum.

S: Siz hastane müdürüydünüz Bu klimalar neden açık alanda duruyor diye düşünmediniz mi?

C: Ben cihazlar indirilirken orada değildim. Mutlaka o cihazlar indirilirken İncekaralar firması çalışanları ve firma yetkilisi orada bulunmuştur. Dışarıda durmaması gerekiyorsa söylemeleri gerekirdi.

S: Bir buzdolabı alsanız 3 yıl kapının önünde tutar mıydınız?

C: Hayır hocam. Bunlar içinde depo tutulması söyleneşeydi, dışarda durmaması gerekiyor dense idi onlarda alınırdı diye düşünüyorum.

S: Firma sorumluluk kabul etmeyip bu klimaların montajını reddettiğini biliyor musunuz?

C: Ocakta işe başladım. 6 ay yoktum. Ben cihazları çalıştırmayı firmanın reddettiğini bilmiyorum.

S: Borusu bağlanmış mı bağlanmamış mı anlayamıyor musunuz?

C: Hayır anlayamıyorum. Montajında eşlik etme gibi bir zorunluluğum ve teknik bilgim yok. Bu benim işim değil.

S: 6 ay yokluğunuzda mı bu işlemler yapıldı?

C: Ben döndüğümde henüz kemik iliği inşaatı bitmemişti.

S: Siz 2010 Ocakta döndüğünüzde inşaatlar bitmemiş miydi?

C: Evet Kemik iliği ben geldiğimde henüz bitmemişti.

S: Brakiterapi cihazı var bu cihaz kurulurken şu malzemeside var bu malzemeside var diye bilginiz var mı?

C: Hayır teknik malzemeler olduğu için bilmiyorum.

S: 9 kalem cihazın geçici kabul belgelerinde sorun var garanti sürelerinde sıkıntı var, bununla birlikte ilgili neler biliyorsunuz?

C: PET BT nin geçici kabulü yapılmadı, ama cihaz çalışıyor.

S: Geçici kabulü yapılmayan cihaz nasıl çalışıyor?

C: Bilmiyorum.

S: Geçici kabullerle ilgili evraklar var mı?

C: Ordan ayrılırken Mustafa hocaya teslim ettim. Teknik servis raporları var. Hepsi dosyanın içinde

S: Mesela brakiterapi ile ilgili taşınır kayıt kontrol yetkilisi kim ?

C: Mutemedi İdris Ballı.

S: Brekiterapiyi kime teslim ettiniz?

C: Kutuları biz götürdük. İlgili firmadan Levent bey vardı birde Demet hanım vardı. Fadıl beyin bilgisi dahilinde Demet hanım gelmişti.

S: Demirbaş kayıtlarını kim yaptı?

C: Tayfun Turan taşınır kayıt yetkilisi. Cihazı teslim alırken belirli şartlar var. Artık bu cihaz çalışır dendiikten sonra komisyon kuruluyor. Cihaz kurulup teslim alındıktan sonra geçic kabulden sonra Tayfun bey taşınır kayıt kontrolü Taşkın bey cihazı görüyor. Mutemet evrakları düzenliyor. Cihazı bölüm teslim alıyor. Bu kontrol işi teknik şartnameye göre yapılır ilgili bölüm bilmek zorunda onlar kontrol ettikten sonra bende imzaladım. Onların tam olduğuna güvenerek imzaladım.

S: O zaman geçici kabul komisyonu kimse bu eksikliklerin sorumlusu o diyorsunuz?

C: Evet

S: Sonuçta sende Fadıl Beye, Fadıl beyde Şuayip beye güvenmiş?

C: Demet hanım ve Fadıl Beyde imzaladığı için imzaladım.

S: Hastaneler Genel Direktörlüğüne İdari Mali İşler bir yazı yazıyor. Yazışmalar Başhekimlik üzerinden yapılıyor. Yani siz diyorsunuz ki ben Müdürüm ama bu malzemeler eksik mi değil mi? Bilgim yok diyorsunuz.

C: Belgelerin asılları İdari Mali İşlerde bulunuyordu. Ertuğrul Kale emekli olunca düzenli olmayan evrakları düzenlemek için bir klasör yapmaya çalıştım. O çalışma sırasında bazı cihazların depomuzda dururken geçici kabul belgelerinin birer nüshasının olduğunu gördüm. İdari Mali İşlere belgelerin asıllarının kendilerinde olup olmadığını sordum. Onlarda da asılların olmadığını öğrenince elimdeki kopyadan bir kopyada onlara gönderdim ve durumu Tezer Kutluk'a ilettim.

S: Bunların asılları nerede? Ertuğrul Kale'ye sordunuz mu belgeler nerede diye?

C:Ertuğrul Kale bana gelen asıllar evrakların içinde dedi. İdari Mali İşlere sordum.

S: Daha önce aslı var olan belgelerin daha sonra aslının olmadığını gördünüz?

C: Her geçici kabulün bir asıl kopyası da Ertuğrul Kale'ye gelirmiş. Birçok malzemenin kabulünün asıl kopyası varken bazılarının ki yoktu.

S: Daha sonradan bu belgelerin aslı geldi mi?

C: İdari Mali İşler asılları ellerinde bulunanları gönderdiler.

S: Siz doğum iznine giderken yerinize birini bıraktınız mı?

C: Yücel Deniz bey.

S: Firma gelip kartları götürüp test ediyor yerinize bıraktığınız Yücel beyin haberi yok.

C: Elektronik kartların götürüldüğünden bilgim yok.

S: Bize söylemek istediğiniz teslim etmek istediğiniz belge var mı?

C: Hayır yok. Klimalar ile ilgili bazı parçaları ben teslim ettiğim için o belgeleri getireceğim.

S: İncekaraların pozisyonu ne?

C: Marubeni firmasının ortağı mı bilmiyorum.

S: Bu malzemelerin eksikliği İncekaralara mı söyleniyordu?

C: Evet.

S: Linak cihazı yeni bir cihaz neden çalışmadığını biliyormusunuz?

C: Cihaz arızalanmıştı. Bölümden bir kişiyle beraber tutanak altına aldık Başhekimlik vasıtasıyla firmaya ilettik.

S: Komisyon üyelerine şu komisyonda yer alınıyorsunuz diye bilgi veriliyor muydu?

C: Sözel şekilde bildiriliyordu.

S: Yazılı olarak bildirilmiyor muydu?

C: Hayır.

S: Klimalarla ilgili 5 firma var. Bunlar ne yapıyordu?


C: Ben Somut'un inşaatın ne kadarını yapacak Beyaz bunun neresinde bilmiyorum.

S: Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?

C: Biz işin neresinde olduğumuzu söylemek isterim. Biz önceden depoladığımız yerlerden ilgili firma tarafından alınarak kurulacak yere götürülmesi ve cihaz kurulduktan sonra idari mali işler dairesinden temin ettiğimiz teknik şartnameleri ilgili bölüme vererek onlar tarafından uygunluk kontrolleri yapıldıktan sonra geçici kabulünü uygun bulmaları durumunda yapılacak yazışmaları takip etmekle görevliydim.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Meral KİRÂZLI



BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 34471248340
ADI VE SOYADI : Meral KİRAZLI
BABA ADI : İbrahim
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : Çorum-01.01.1977
İKAMET ADRESİ : Şehit Bahadır Demir Sok. 5/12 Maltepe- Çankaya-Ankara
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : İş : 305 41 56 Cep :0 535 877 77 34
ÜNVANI : Sözleşmeli Memur
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
TARİH VE SAAT : 16.07.2012 15:30
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : 2007 – İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Şef
2007-2008 – Onkoloji Hastanesi, Şef
2008-2010 – Onkoloji Hastanesi, Hastane Müdür Yard.
2010-2012 – Onkoloji Hastanesi, Hastane Müdürü

ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Maliyet Muhasebesi birimi, Memur

KONU :
MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında

VERİLEN BİLGİDE :

S: 171 kalem malzemeler alındığında hangi görevde bulunuyordunuz?

C: Çocuk Hastanesindeydim.


S: Cihazlar alındığında hep ordamıydınız ?

C: 2007 nin Eylül ayından beri Onkoloji Hastanesindeyim

S: Alım satımlarda göreviniz ne idi?

C: Malzeme geldiği zaman indirim ve depolanmasında orada bulunuyordum.

S: Malzemelerin tam ve eksiksiz olduğunu siz mi kontrol ediyordunuz?

C: Ben sadece gelen malzemelerin yükleme listesinde belirtilen kutu ya da koli sayısına göre teslim alıyordum. Kutunun içinde ne olduğuna dair bilgimiz olmazdı.

S: Klimaların ana üniteleri dışarıda duruyordu. Cihazların niçin dışarıda durduğunu hiç sorguladınız mı? Bununla ilgili bir yazı yazdınız mı?

C: Resmi yazı yazmadık. Sözel olarak Genel Direktörlüğe iletilmişti. İnecaralar Firması uyarı üzerine yeniden naylon getirip ambalajladılar. Bazı cihazların (Linak vs.) dışarıda kalmaması gerektiği söylendiği için onlara depo kiralanarak oraya konuldu. Klimalarla ilgili böyle bir uyarı yapılsaydı klimalarda o depoya konulabilirdi.

S: Parkta olanlar ne zaman binanın içine alındı? Beyaz Firması taşıma sırasında oradamıydı?

C: Ben Onkoloji Hastanesi'ne geldiğimde ana üniteler dışarıda idi fakat Onkoloji Hastanesi deposunda filtre, motor gibi parçaları vardı bunları beyaz teknik firmasından gelen bir yetkili ile inşaat esnasında montajlanacak olanları Somut firmasına tutanakla teslim ettim. 2011 yılında kemik iliği ünitesinin inşaatı bitti. Tutanak karşılığı Beyaz Teknik ile birlikte parçaları Somut firmasına verdim. Parkta olanlar 2009 yılında yerine çıkartılmış olmalı, çok emin değilim. İnecaralar firması yetkilisi ve Beyaz Teknik firması yetkilisi gözetiminde cihazlar ilgili katlardaki yerlerine taşındı.

S: Bize tutanakları verir misiniz?

C: Oradan ayrıldım. Ulaşabildiğim ölçüde evrakları vermeye çalışırım.

S: Somuta bu görevi kim verdi?

C: Bilgim yok. Klimalar kurulmadı diye biliyorum. Beyaz Teknik bunları kurması gerek. İnşaat işlerini Yapı İşleri denetler.

S: Klimalar niye çalıştırılmadı?

C: İnşaatlar tamamlanmadığı için olabilir. Beyaz tekniği sadece cihazlar yerine taşınırken ve yedek parçaları teslim ederken gördüm. Benim gördüğüm kanalların çekildiği cihazların çalıştırmayı firmanın reddettiğini bilmiyorum. Monte kısmını bilmiyorum. Ben teknik kişi değilim. Montajı bilmiyorum. Sadece bakıyoruz. Ana cihazların bulunduğu alan kapalı. Tavana motorun konduğunu, kanalların çekildiğini gördüm. Ama niye çalıştırılmadığını bilmiyorum. İnşaat bitmediği için olabilir. Doğum iznimden döndüğümde kemik iliği ünitesi bitmemişti. Yoğun bakım ünitesi bitmişti. Yeni Rektörlük döneminde bitti. 15 gün çalıştım (26 Aralık) sonra gittim.

S: Klimanın Elektronik Kartlarının alındığından haberiniz var mı?

C: Yok.

S: Brakiterapi cihazı kurulduğunda görevdeydiniz. Kurulumda kontrolü kim yapmıştır? Bu cihazın malzemelerinde eksik olduğunu biliyor musunuz?

C: Radyasyon Onkolojisi yaptı. Doğum izninden döndükten sonra bir yazı geldiğini gördüm ondan önce başka bir duyurum olmadı. Malzemeleri görmedim. Birimlere çıkarılmasında vardım. 2010 yılında kuruldu.

S: İnecaralar bu işin neresinde?

C: İnecaralar yüklenici firma.

S: Somut firması da montajı yaptı sizde oradaydınız. Sistem çalıştırdılar mı?

C: 2009 da klimalar sadece yukarı çıkartıldı. İnşaat birlikte giden bir çalışma. Sistemi denemek için çalıştırıp çalıştırmadıklarını bilmiyorum.

S: Siz hastane müdürüydünüz Bu klimalar neden açık alanda duruyor diye düşünmediniz mi?

C: Ben cihazlar indirilirken orada değildim. Mutlaka o cihazlar indirilirken İncekaralar firması çalışanları ve firma yetkilisi orada bulunmuştur. Dışarıda durmaması gerekiyorsa söylemeleri gerekirdi.

S: Bir buzdolabı alsanız 3 yıl kapının önünde tutar mıydınız?

C: Hayır hocam. Bunlar içinde depo tutulması söyleneşeydi, dışarda durmaması gerekiyor dense idi onlarda alınırdı diye düşünüyorum.

S: Firma sorumluluk kabul etmeyip bu klimaların montajını reddettiğini biliyor musunuz?

C: Ocakta işe başladım. 6 ay yoktum. Ben cihazları çalıştırmayı firmanın reddettiğini bilmiyorum.

S: Borusu bağlanmış mı bağlanmamış mı anlayamıyor musunuz?

C: Hayır anlayamıyorum. Montajında eşlik etme gibi bir zorunluluğum ve teknik bilgim yok. Bu benim işim değil.

S: 6 ay yokluğunuzda mı bu işlemler yapıldı?

C: Ben döndüğümde henüz kemik iliği inşaatı bitmemişti.

S: Siz 2010 Ocakta döndüğünüzde inşaatlar bitmemiş miydi?

C: Evet Kemik iliği ben geldiğimde henüz bitmemişti.

S: Brakiterapi cihazı var bu cihaz kurulurken şu malzemeside var bu malzemeside var diye bilginiz var mı?

C: Hayır teknik malzemeler olduğu için bilmiyorum.

S: 9 kalem cihazın geçici kabul belgelerinde sorun var garanti sürelerinde sıkıntı var, bununla birlikte ilgili neler biliyorsunuz?

C: PET BT nin geçici kabulü yapılmadı, ama cihaz çalışıyor.

S: Geçici kabulü yapılmayan cihaz nasıl çalışıyor?

C: Bilmiyorum.

S: Geçici kabullerle ilgili evraklar var mı?

C: Ordan ayrılırken Mustafa hocaya teslim ettim. Teknik servis raporları var. Hepsi dosyanın içinde

S: Mesela brakiterapi ile ilgili taşınır kayıt kontrol yetkilisi kim ?

C: Mutemedi İdris Balh.

S: Brekiterapiyi kime teslim ettiniz?

C: Kutuları biz götürdük. İlgili firmadan Levent bey vardı birde Demet hanım vardı. Fadıl beyin bilgisi dahilinde Demet hanım gelmişti.

S: Demirbaş kayıtlarını kim yaptı?

C: Tayfun Turan taşınır kayıt yetkilisi. Cihazı teslim alırken belirli şartlar var. Artık bu cihaz çalışır dendiikten sonra komisyon kuruluyor. Cihaz kurulup teslim alındıktan sonra geçic kabulden sonra Tayfun bey taşınır kayıt kontrolü Taşkın bey cihazı görüyor. Mutemet evrakları düzenliyor. Cihazı bölüm teslim alıyor. Bu kontrol işi teknik şartnameye göre yapılır ilgili bölüm bilmek zorunda onlar kontrol ettikten sonra bende imzaladım. Onların tam olduğuna güvenerek imzaladım.

S: O zaman geçici kabul komisyonu kimse bu eksikliklerin sorumlusu o diyorsunuz?

C: Evet

S: Sonuçta sende Fadıl Beye, Fadıl beyde Şuayip beye güvenmiş?

C: Demet hanım ve Fadıl Beyde imzaladığı için imzaladım.

S: Hastaneler Genel Direktörlüğüne İdari Mali İşler bir yazı yazıyor. Yazışmalar Başhekimlik üzerinden yapılıyor. Yani siz diyorsunuz ki ben Müdürüm ama bu malzemeler eksik mi değil mi? Bilgim yok diyorsunuz.

C: Belgelerin asılları İdari Mali İşlerde bulunuyordu. Ertuğrul Kale emekli olunca düzenli olmayan evrakları düzenlemek için bir klasör yapmaya çalıştım. O çalışma sırasında bazı cihazların depomuzda dururken geçici kabul belgelerinin birer nüshasının olduğunu gördüm. İdari Mali İşlere belgelerin asıllarının kendilerinde olup olmadığını sordum. Onlarda da asılların olmadığını öğrenince elimdeki kopyadan bir kopyada onlara gönderdim ve durumu Tezer Kutluk'a ilettim.

S: Bunların asılları nerede? Ertuğrul Kale'ye sordunuz mu belgeler nerede diye?

C:Ertuğrul Kale bana gelen asıllar evrakların içinde dedi. İdari Mali İşlere sordum.

S: Daha önce aslı var olan belgelerin daha sonra aslının olmadığını gördünüz?

C: Her geçici kabulün bir asıl kopyası da Ertuğrul Kale'ye gelirmiş. Birçok malzemenin kabulünün asıl kopyası varken bazılarının ki yoktu.

S: Daha sonradan bu belgelerin aslı geldi mi?

C: İdari Mali İşler asılları ellerinde bulunanları gönderdiler.

S: Siz doğum iznine giderken yerinize birini bıraktınız mı?

C: Yücel Deniz bey.

S: Firma gelip kartları götürüp test ediyor yerinize bıraktığınız Yücel beyin haberi yok.

C: Elektronik kartların götürüldüğünden bilgim yok.

S: Bize söylemek istediğiniz teslim etmek istediğiniz belge var mı?

C: Hayır yok. Klimalar ile ilgili bazı parçaları ben teslim ettiğim için o belgeleri getireceğim.

S: İncekaraların pozisyonu ne?

C: Marubeni firmasının ortağı mı bilmiyorum.

S: Bu malzemelerin eksikliği İncekaralara mı söyleniyordu?

C: Evet.

S: Linak cihazı yeni bir cihaz neden çalışmadığını biliyormusunuz?

C: Cihaz arızalanmıştı. Bölümden bir kişiyle beraber tutanak altına aldık Başhekimlik vasıtasıyla firmaya ilettik.

S: Komisyon üyelerine şu komisyonda yer alınıyorsunuz diye bilgi veriliyor muydu?

C: Sözel şekilde bildiriliyordu.

S: Yazılı olarak bildirilmiyor muydu?

C: Hayır.

S: Klimalarla ilgili 5 firma var. Bunlar ne yapıyordu?

C: Ben Somut'un inşaatın ne kadarını yapacak Beyaz bunun neresinde bilmiyorum.

S: Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?

C: Biz işin neresinde olduğumuzu söylemek isterim. Biz önceden depoladığımız yerlerden ilgili firma tarafından alınarak kurulacak yere götürülmesi ve cihaz kurulduktan sonra idari mali işler dairesinden temin ettiğimiz teknik şartnameleri ilgili bölüme vererek onlar tarafından uygunluk kontrolleri yapıldıktan sonra geçici kabulünü uygun bulmaları durumunda yapılacak yazışmaları takip etmekle görevliydim.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Meral KIRAZLI





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Konu : Soruşturma Hk.
Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2626

02 Temmuz 2012

Sayın Meral KİRAZLI,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 16.07.2012 günü saat 12:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 49426599682
ADI VE SOYADI : Hasan BEYTAŞ
BABA ADI : Doğan
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 01.01.1944- HINIS
İKAMET ADRESİ : Simon Bolivar Cad. Duyu Sok. No. 12-7

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0 537 447 13 63
ÜNVANI : Emekli Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu

TARİH VE SAAT :
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Emekliye ayrılmıştım.

ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Emekli

KONU :
MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında

VERİLEN BİLGİDE :


SORU: 2007 yılında gelmeye başlayan MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında konusunda bilginiz nedir?

Cevap:

Alımlar sırasında 2001'de yapılan ihale komisyon üyesiydim. Maliye Bakanlığının temsilcisi olarak katıldım. 2003'te Hacettepe Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığından ayrıldım. Adnan Menderes Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığına tayinim çıktı ve kısa bir süre sonra emekli oldum. Bu bahsedilen konularla uzaktan yakından hiç alakam yoktur.

Maliye Bakanlığı tarafından Hacettepe Üniversitesine yazılmış bir evrak ve Maliye Bakanlığında Adnan Menderes Üniversitesine yazılmış evrak tarafımıza teslim edilmiştir.






Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Filiz Ercan

Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU

Canan

Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

Mutlu Aytemir

Bilgi Veren

Hasan BEYTAŞ

Hasan Beytaş

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 49426599682
ADI VE SOYADI : Hasan BEYTAŞ
BABA ADI : Doğan
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 01.01.1944- HINIS
İKAMET ADRESİ : Simon Bolivar Cad. Duyu Sok. No. 12-7

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0 537 447 13 63
ÜNVANI : Emekli Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu

TARİH VE SAAT :
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Emekliye ayrılmıştım.

ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Emekli

KONU :
MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: 2007 yılında gelmeye başlayan MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında konusunda bilginiz nedir?

Cevap:

Alımlar sırasında 2001'de yapılan ihale komisyon üyesiydim. Maliye Bakanlığının temsilcisi olarak katıldım. 2003'te Hacettepe Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığından ayrıldım. Adnan Menderes Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığına tayinim çıktı ve kısa bir süre sonra emekli oldum. Bu bahsedilen konularla uzaktan yakından hiç alakam yoktur.

Maliye Bakanlığı tarafından Hacettepe Üniversitesine yazılmış bir evrak ve Maliye Bakanlığından Adnan Menderes Üniversitesine yazılmış evrak tarafımıza teslim edilmiştir.

Fahri Ercan *Lanet* *Mutlu* *Refik*

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Filiz Ercan

Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU

Canan

Bilgi Veren

Hasan BEYTAŞ

Hasan Beytaş

Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

Mutlu Aytemir



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı : B.30.2.HAC.0.00.00.01 /410-2831
Konu :

13/07 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Hasan BEYTAŞ,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 10:30'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 11959294044
ADI VE SOYADI : Demet Yıldız
BABA ADI : Mir Ahmet
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 06.01.1981-ANKARA
İKAMET ADRESİ : Sancak Mah. 13.Cad. 530.Sok 8/9 Yıldız Çankaya
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0532-570 15 88
ÜNVANI : Uzman (Fizik Müh.)
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu
TARİH VE SAAT : 12.07.2012 Saat : 10:00
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Araştırma Gör.(2007) Uzman (2008)
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Uzman
KONU : Brakiterapi Cihazı

VERİLEN BİLGİDE :

Brakiterapi cihazının aksesuarı olarak görünen well-type iyon odasının teslimatta, montaj sırasında ve daha sonrasında olup olmadığı kendisine sorulduğunda;

Fizik Müh.Demet Yıldız, ki kendisi 13.12.2010 tarihinde geçici kabulü yapılan Brakiterapi sistemi ile ilgili Muayene ve Kabul Protokolü üyesidir, well-type iyon odasını hiç görmediğini söylemiştir. Well-Type İyon odası bu sistemin bir aksesuarıdır. Demet Yıldız cihazın kullanılabilmesi için bu iyon odasının gerekli olmadığını farklı yöntemlerle de radyoaktif kaynak aktivite ölçümünün yapılabileceğini belirtmiştir. 11.11.2010 yılında Brakiterapi cihazının montajı tamamlanmıştır. Kabul testleri de (Acceptance) firma ile yapıp cihaz çalıştırılmıştır. 13.12.2010 tarihinden önce cihazın çalışır durumda olduğu ve kabul testlerinin de yapıldığı Demet Yıldız tarafından tesbit edildiği için ve Meral Kirazlı hariç diğer komisyon üyelerinin imzası bulunduğundan dolayı komisyonun sunduğu muayene ve kabul protokolünü imzaladığını bildirmiştir. Cihazın kimin üzerine kayıtlı olduğunu bilmediğini ve o tarihe kadar teknik şartnameyi görmediğini ifade etmiştir.

Komisyon Üyesi olarak seçildiğinin daha önceden kendisine tebliğ edilmediğini ve buna ait bir evrakının olmadığını bildirdi. Well-Type iyon odasını hiç görmediğini, cihazın ambalajının açılımlında ve kurulumunda kendisinin orda olmadığını ifade etti. Aralık 2011 yılına kadar teknik şartnameyi görmediğini aksesuarların tesbiti için teknik şartnamenin tarafına verildiğini ve iyon odasının bulunmadığını tesbit ederek 12.01.2012 tarihinde bir dilekçeyle Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı Başkanlığına bildirmiştir. Cihaza ait olan orijinal ambalajın nerede olduğuna dair hiçbir bilgisinin olmadığını ifade etti.

Fatih Erkan

Demet Yıldız

Demet Yıldız

Demet Yıldız

Firma tarafından ücretsiz olarak ilk kaynak yüklemede ve Fizik Mühendisleri Odası Kalite Uygunluk Belgesi Ölçümlerinde kullanılmak üzere Well-type iyon odası iki kez geçici olarak Varinak Firma yetkilisi Kemal Ay tarafından temin edilmiştir. Demet Yıldız verdiği bilgide, Varinak firma yetkilileri Kemal Ay ve Ercan Yiğit tarafından Well-type iyon odasının Hacettepe Üniversitesine tesliminin cihazla birlikte yapıldığının tarafına sözel olarak söylendiğini ifade etmiştir. Brakiterapi cihazının montajı 11.10.2010 tarihinde tamamlanmış fakat hasta alımına 2012 Mayıs ayında başlanmıştır.

Komisyunun elinde bulunmayan VARİAN Acceptance Certificate, Test Protokole ait 11.11.2010 ve VARİAN Medical systems 16 Ekim 2007 tarihli 2 farklı belge tarafımıza sunulmuştur.

Soruşturmacı

Bilgi Veren

Prof. Dr. Filiz ERCAN




Uzman Demet Yıldız



Prof.Dr.Canan HEKİMOĞLU



Prof.Dr.Mutlu AYTEMİR



BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 11959294044
ADI VE SOYADI : Demet Yıldız
BABA ADI : Mir Ahmet
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 06.01.1981-ANKARA
İKAMET ADRESİ : Sancak Mah. 13.Cad. 530.Sok 8/9 Yıldız Çankaya
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0532-570 15 88
ÜNVANI : Uzman (Fizik Müh.)
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu
TARİH VE SAAT : 12.07.2012 Saat : 10:00
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Araştırma Gör.(2007) Uzman (2008)
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Uzman
KONU : Brakiterapi Cihazı

VERİLEN BİLGİDE :

Brakiterapi cihazının aksesuarı olarak görünen well-type iyon odasının teslimatta, montaj sırasında ve daha sonrasında olup olmadığı kendisine sorulduğunda;

Fizik Müh.Demet Yıldız, ki kendisi 13.12.2010 tarihinde geçici kabulü yapılan Brakiterapi sistemi ile ilgili Muayene ve Kabul Protokolü üyesidir, well-type iyon odasını hiç görmediğini söylemiştir. Well-Type İyon odası bu sistemin bir aksesuarıdır. Demet Yıldız cihazın kullanılabilmesi için bu iyon odasının gerekli olmadığını farklı yöntemlerle de radyoaktif kaynak aktivite ölçümünün yapılabileceğini belirtmiştir. 11.11.2010 yılında Brakiterapi cihazının montajı tamamlanmıştır. Kabul testleri de (Acceptance) firma ile yapıp cihaz çalıştırılmıştır. 13.12.2010 tarihinden önce cihazın çalışır durumda olduğu ve kabul testlerinin de yapıldığı Demet Yıldız tarafından tesbit edildiği için ve Meral Kirazlı hariç diğer komisyon üyelerinin imzası bulunduğundan dolayı komisyonun sunduğu muayene ve kabul protokolünü imzaladığını bildirmiştir. Cihazın kimin üzerine kayıtlı olduğunu bilmediğini ve o tarihe kadar teknik şartnameyi görmediğini ifade etmiştir.

Komisyon Üyesi olarak seçildiğinin daha önceden kendisine tebliğ edilmediğini ve buna ait bir evrakının olmadığını bildirdi. Well-Type iyon odasını hiç görmediğini, cihazın ambalajının açılımında ve kurulumunda kendisinin orda olmadığını ifade etti. Aralık 2011 yılına kadar teknik şartnameyi görmediğini aksesuarların tesbiti için teknik şartnamenin tarafına verildiğini ve iyon odasının bulunmadığını tesbit ederek 12.01.2012 tarihinde bir dilekçeyle Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı Başkanlığına bildirmiştir. Cihaza ait olan orijinal ambalajın nerede olduğuna dair hiçbir bilgisinin olmadığını ifade etti.

Filiz Esen

Demet Yıldız

Demet Yıldız

Meral Kirazlı

Firma tarafından ücretsiz olarak ilk kaynak yüklemede ve Fizik Mühendisleri Odası Kalite Uygunluk Belgesi Ölçümlerinde kullanılmak üzere Well-type iyon odası iki kez geçici olarak Varinak Firma yetkilisi Kemal Ay tarafından temin edilmiştir. Demet Yıldız verdiği bilgide, Varinak firma yetkilileri Kemal Ay ve Ercan Yiğit tarafından Well-type iyon odasının Hacettepe Üniversitesine tesliminin cihazla birlikte yapıldığının tarafına sözel olarak söylendiğini ifade etmiştir. Brakiterapi cihazının montajı 11.10.2010 tarihinde tamamlanmış fakat hasta alımına 2012 Mayıs ayında başlanmıştır.

Komisyunun elinde bulunmayan VARİAN Acceptance Certificate, Test Protokole ait 11.11.2010 ve VARİAN Medical systems 16 Ekim 2007 tarihli 2 farklı belge tarafımıza sunulmuştur.

Soruşturmacı

Bilgi Veren

Prof. Dr. Filiz ERCAN




Uzman Demet Yıldız



Prof.Dr.Canan HEKİMOĞLU



Prof.Dr.Mutlu AYTEMİR





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2619

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Uzm. Demet YILDIZ,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 12.07.2012 günü saat 10:00'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Filiz Ercan

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

Sayın Prof. Dr. Filiz ERCAN,
Sorumlu Kurul Başkanı

02 Temmuz 2012 tarih ve 410-2628 sayılı

Yazınarda Üniversitemiz 1990I001900 no'lu Orkestrasi

Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası Hale

tanımlanmış olan dis kredi olarak 02.08.2011

görevi ile tamamlanmış olan, MAREKSEVI EUROPE PLC

tarafından yapılan sözleşme ile, MAREKSEVI EUROPE PLC

firmasından satın alınan 171 Kalem, malzeme, malzeme

elbise korusu ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir

belirtilen 16.07.2012 saat 14.00 de H.Ü. Silahlar

Komposu Rektörlük toplantı salonunda bulunmak üzere

devlet ediliş bulundurulmuştur.

Yazınarda belirtilen konular ile ilgili bilgi

Saklı: olunduktan sonra, söz konusu dosyadan önce

verilmesi halinde, söz konusu belgeyi inceleyip daha

Sonra beyanlarını sunacağım. 16.7.2012

Seydi İsmail,
M. Sabri ÜSTÜN
Dare Başkanı

Görev Yeri
Polatlı Teftiş Kurulu
Polatlı/ANKARA
M.Y.O.

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 32572750854

ADI VE SOYADI : Mehmet Sabri ÜSTÜN

BABA ADI : Mehmet Ali

DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 03.04.1960 - Şarkikaraağaç

İKAMET ADRESİ : Fatih Sultan Mahallesi 2364 Sok. No:8
Etimesgut – ANKARA

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 234 11 23 Cep Tel : 0533 347 25 14

ÜNVANI : Daire Başkanı

BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Toplantı
Salonu Sıhhiye – ANKARA

TARİH VE SAAT : 16.07.2012 17:10

O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Yapı İşleri Daire Başkan Yardımcısı
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı

ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Polatlı Meslek Yüksekokulu Daire Başkanı

KONU :

MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında


VERİLEN BİLGİDE :

2000-2008 Yapı İşleri Daire Başkan Yardımcısı

2008-2012 Yapı İşleri Daire Başkanı

SORU: 2007 yılında gelmeye başlayan MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında konusunda bilginiz nedir?

Cevap: Görevlendirildiğimizde alım, montaj her şeyden sorumluyuz. Burada farklı bir uygulama bulunmaktadır. İhale tarihinden itibaren uzun bir süre geçtiği için ifademini doğru olabilmesi için her şeyi hatırlayamadığım için dosyanın bir örneğinin tarafıma verilmesini, akabinde doğru ifadeler verebileceğim.



SORU: Klimalar hakkında bilginiz var mı?

CEVAP: Klimaların gelişi ile ilgili bilgim yok. Çünkü taşınır kayıt kontrol yetkilisi Başkanlığımız personeli değildir.

Satın alınan cihazlar geçici kabul yapıldı kadar firmanın sorumluluğundadır. Cihaz çalıştırılıp kontrol edildikten sonra, sonra geçici kabulü görevlendirilen komisyonca yapılır. Klima cihazlarının hatırladığım kadariyle geçici kabulü yapılmamıştır.

SORU : Marubeni firması ile yapılan bu ihalede Yapı İşleri neresindedir?

CEVAP: Söz konusu ihale 2001 yılında yapılmış, idare ve teknik şartname hazırlanması aşamasında Yapı İşleri olarak biz yoktuk. Ancak görevlendirildiğimiz kısımda vardık.

Marubeni ve İncekara firmalarının aralarındaki bağlantıyı bilmiyorum. Klima cihazlarının Weiss Firmasından alındığını biliyorum. Beyaz teknik firmasının Weiss firmasının Türkiye temsilcisi olduğunu biliyorum.

Ekstra denilen 400 milyarı biz ödemedik, zaten bu paranın Devlet imkanlarıyla ekstra ödeme yapılması mümkün değildir. Bu ödeme ilgili firmanın yapmakla yükümlü olduğu işler için anlaştığı taşeron firmaya yaptığı ödeme olabilir.

Yazıda söz edilen Marubeninin yapması gereken işlerin başka firmaya ihale edildiği doğru değildir. 2008 de yapılan ihale Onkoloji Hastanesinin tadilatlarının tamamlanmasına yönelik olup bunun içinde İdarenin yapmakla yükümlü olduğu alt yapı işleri ile 2001 yılında Marubenin kazandığı ihale de mevcut durumdan 2008 yılında yapılan değişiklikler nedeniyle doğan farklarda bulunmaktadır. Ancak sehven yapılan bir hata neticesinde Marubeni firmasının yapması gerektiği işler yer aldıysa bu tarafımda başlatılan ancak görevim yeri değişikliği nedeniyle yarım kalan somut firmasının kazandığı ihalenin kesin hesap işlemleri esnasında tenzil edilerek düzeltilecektir. Böylelikle hiçbir kamu zararından bahsedilemeyecektir.


Klima sisteminin klima cihazlarından ayrı olan VAV cihazları, frekans konvertör gibi elektronik malzemelerin ayrı kapalı hacimde tutulduğunu biliyorum.

Klimaların bazı mekanizmalarının sökülüp test edilmesi tamamen ilgili firmanın sorumluluğundadır.

Onkoloji Hastanesinin 2000 yılındaki mevcut durumunu gösterir projeler ile yapılan değişiklikleri gösterir projeler Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığından istenir.

2 ihale bulunmaktadır. İlki Marubenin aldığı ihale, 2. ise yaklaşık 14 milyon somut firmasına yaptırılan ihaledir. Bu iki ihale birbirinden farklı ihalelerdir.

Yukarıda belirttiğim gibi ekli dilekçede istediğim dosya verilirse yukarıda hatırladığım kadariyle cevap verdiğim sorulara daha net cevap verebileceğim. Saygılarımla.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a simple, stylized line. The middle signature is more complex, with the name 'Fahri Ercan' clearly visible. The third signature on the right is also complex and stylized, with a circular flourish at the end.

Sorusturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Filiz Ercan

Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU

Canan

Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

Mutlu Aytemir

Bilgi Veren

M. Sabri ÜSTÜN

M. Sabri Üstün



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-262S

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Mak.Müh. M.Sabri ÜSTÜN,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 16.07.2012 günü saat 14:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 23728517162
 ADI VE SOYADI : Yücel Deniz
 BABA ADI : Ferdi
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 03.06.1974 -BURSA
 İKAMET ADRESİ : İçli Sok. 3/8 Örnek Mah. Telsizler Ankara
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 305 2909 / 0506-409 76 56
 ÜNVANI : Müdür Yardımcısı
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlül Toplantı Salonu
 TARİH VE SAAT : 13.07.2012 / 16:30
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Müdür Yardımcısı (2010)
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Müdür Yardımcısı
 KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE : Yücel Deniz Onkoloji Hastanesi Müdür Yardımcısı 2010 yılında göreve başladım. Kemik İliği ve yoğun bakım ünitelerine hizmet verecek olan hijyenik klimalarla ilgili, üst yönetimin sorumlu firmayla yapmış olduğu hiçbir toplantıya katılmadım ve çağrılmadım. Firma ve Başhekimlik arasında yapılan toplantılardan sonra, cihazın içindeki kartların problemleri nedeniyle alındığını duyumlardan öğrenmiş bulundum. Konuyla Hastane Müdürü Meral Kirazlı ilgilenmekteydi.

Soruşturmacı

Bilgi Veren

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Filiz Ercan

Yücel DENİZ

Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU

Canan

Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

Mutlu Aytemir



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2623

02 08 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Yücel DENİZ,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 13.07.2012 günü saat 16:00'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 14020090972
 ADI VE SOYADI : Ekrem Ateşoğlu
 BABA ADI : İzzet
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 01.10.1967 Demirci-Çubuk/ANKARA
 İKAMET ADRESİ : Merkez Mahallesi Alperen Caddesi Kısmetli Sitesi
 A Blok 23/8 Pursaklar/ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0533 474 81 13
 ÜNVANI : Gözetmen
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük
 TARİH VE SAAT : 17.07.2012
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Gözetmen
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Gözetmen

KONU :
 MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

S: Klimaları park yerinden yukarıya kim taşıdı biliyor musunuz?

C: İncekaralara haber veriyoruz oda yetkili servisine haber veriyor. Yetkili servis ile birlikte iki kapı söküp şu anki yerlerine konuldu. Kanalların yerleşimini Somut firması yaptı. Cihazların yerine yerleştiğini gördüm ama çalışıp çalışmadığından bir bilgim yok. Ambalajlar açılırken oradaydım. Klimalar parçalı tahta içinde naylonluydu. Klimaların pak yerinde durduğu 3 yıl boyunca İncekaralar firması bize naylon temin ediyordu İncekaralar firması elemanları ile klimaların yıpranmış naylonlarını yeniliyorduk. Aletler çok büyük olduğu için içeri girmedi. İncekaralar firması aletlerin park yerine yerleştirildiğini biliyordu. Bu nedenle İncekaralar naylon getiriyordu. Naylonlar yıprandıkça ne zaman olursa olsun onları firma elemanları ile beraber değiştiriyorduk.

S: İncekaralar bu aletin kapalı alanda olması gerektiğini size söyledi mi?

C: Bana öyle bir şey söylenmedi. Duymadım. Kurulacak aletlerin açılımlında yerine konulmasına eşlik ediyordum. Yüklenici firmaya kurulacağı zaman haber veriliyordu. Onlarda gelip kuruyorlardı. Soyisimlerini bilmediğim İncekaralar firmasının malzemelerin gelişinde eşlik eden firma yetkilileri olan Yılmaz bey, Aylin hanım, Özgür bey vardı. Şu anda Murat bey ilgileniyor.

Fahri Erman
 Lany
 [Signature]
 [Signature]

Klimalar yerlerine konurken İncekaralar firmasından Özgür Bey vardı ve eşlik etti. Brakiterapi aletinin yerini firmaya ben gösterdim İncekaralar firması yetkilileri teslim aldı. İncekaralar firması gelir malzemeyi depodan alıp kurulacak yere kadar firmaya yerini göstermede eşlik ediyoruz. Onlarda montajını yaparlar. Ben malzemeyi depodan yada bulunduğu yerden alıp teknik servise teslim ediyorum. Malzemeler hastane dışına çıkmadığı için tutanak tutmadık. Kutular açılırken ben başında olmuyorum. Kurulum tamamen firmaya ait. Ben olmadığım zamanlarda Müdürlerimizde yer gösterebiliyordu.

S: Kutunun içinden çıkan aksesuarın kontrolünü yapan kim?

C: Bilmiyorum. Kutu içinden ne çıkıyor kim ilgileniyor bir bilğim yok. Ben sadece vermekle yükümlüyüm.

S: Teslimde sizlerin başında sizden başka kim var?

C: Hastane müdürlerinden Meral Kirazlı, Ertuğrul Kale ve benimle birlikte firma yetkilileri oluyor.

S: Bölüm yetkililerinin olması gerekmiyor mu?

C: Bilmiyorum. Ben malzemeleri vermekle yükümlüyüm. İncekaralar her aşamada var. Ben teslim ederek görevimi yapıyorum. Ambalaj içeri bilmiyorum .

S: Klimaların elektronik kartları götürülmüş haberiniz var mı? Nasıl alıp götürdüler biliyor musunuz?


C: Bilğim yok.

S: Bu aletler kime zimmetli.

C: Hangi bölüme kurulmuşsa bölüm mutemetine zimmetlidir. Ya sekreter ya da hemşireleri mutemetleri olabilir. Geçici kabulde değil kesin kabulde kişiler üzerine zimmetleniyor. İncekaralar firmasının bilgisi dahilinde ancak hastaneye girebilir yoksa giremez. Tam kapalı olmayan tahta ambalajlar içindeydi. Firma dışarıda söktü. Ben herhangi bir ıslaklık, küf herhangi bir hasar birebir görmedim. Tır geldiğinde İncekaralar geldi Ben de oradaydım. Araçları karşılıyorduk. Refakat edilip sabah erken ya da akşam saatlerinde getirilip portif getirilip malzeme indiriliyor. Küçükse içeri alıyorduk. İndirileceği yeri hastane yönetimi bildiriyor. Sözlü olarak bize idareden bilgi verilip ondan sonra indirilip içeri alıyorduk. Klimaların içeri alınmasında herhangi bir hasar konusunda hiçbir şey görmedim, duymadım bilmiyorum.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN




Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Bilgi Veren

Ekrem ATEŞOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 14020090972
ADI VE SOYADI : Ekrem Ateşoğlu
BABA ADI : İzzet
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 01.10.1967 Demirci-Çubuk/ANKARA
İKAMET ADRESİ : Merkez Mahallesi Alperen Caddesi Kısmetli Sitesi
A Blok 23/8 Pursaklar/ANKARA
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0533 474 81 13
ÜNVANI : Gözetmen
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük
TARİH VE SAAT : 17.07.2012
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Gözetmen
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Gözetmen

KONU :
MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında

VERİLEN BİLGİDE :


SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

S: Klimaları park yerinden yukarıya kim taşıdı biliyor musunuz?

C: İncekaralara haber veriyoruz oda yetkili servisine haber veriyor. Yetkili servis ile birlikte iki kapı söküp şu anki yerlerine konuldu. Kanalların yerleşimini Somut firması yaptı. Cihazların yerine yerleştiğini gördüm ama çalışıp çalışmadığından bir bilgim yok. Ambalajlar açılırken oradaydım. Klimalar parçalı tahta içinde naylonluydu. Klimaların pak yerinde durduğu 3 yıl boyunca İncekaralar firması bize naylon temin ediyordu İncekaralar firması elemanları ile klimaların yıpranmış naylonlarını yeniliyorduk. Aletler çok büyük olduğu için içeri girmedi. İncekaralar firması aletlerin park yerine yerleştirildiğini biliyordu. Bu nedenle İncekaralar naylon getiriyordu. Naylonlar yıprandıkça ne zaman olursa olsun onları firma elemanları ile beraber değiştiriyorduk.

S: İncekaralar bu aletin kapalı alanda olması gerektiğini size söyledi mi?

C: Bana öyle bir şey söylenmedi. Duymadım. Kurulacak aletlerin açılımlında yerine konulmasına eşlik ediyordum. Yüklenici firmaya kurulacağı zaman haber veriliyordu. Onlarda gelip kuruyorlardı. Soyisimlerini bilmediğim İncekaralar firmasının malzemelerin gelişinde eşlik eden firma yetkilileri olan Yılmaz bey, Aylin hanım, Özgür bey vardı. Şu anda Murat bey ilgileniyor.



Klimalar yerlerine konurken İncekaralar firmasından Özgür Bey vardı ve eşlik etti. Brakiterapi aletinin yerini firmaya ben gösterdim İncekaralar firması yetkilileri teslim aldı. İncekaralar firması gelir malzemeyi depodan alıp kurulacak yere kadar firmaya yerini göstermede eşlik ediyoruz. Onlarda montajını yaparlar. Ben malzemeyi depodan yada bulunduğu yerden alıp teknik servise teslim ediyorum. Malzemeler hastane dışına çıkmadığı için tutanak tutmadık. Kutular açılırken ben başında olmuyorum. Kurulum tamamen firmaya ait. Ben olmadığım zamanlarda Müdürlerimizde yer gösterebiliyordu.

S: Kutunun içinden çıkan aksesuarın kontrolünü yapan kim?

C: Bilmiyorum. Kutu içinden ne çıkıyor kim ilgileniyor bir bilgim yok. Ben sadece vermekle yükümlüyüm.

S: Teslimde sizlerin başında sizden başka kim var?

C: Hastane müdürlerinden Meral Kirazlı, Ertuğrul Kale ve benimle birlikte firma yetkilileri oluyor.

S: Bölüm yetkililerinin olması gerekmiyor mu?

C: Bilmiyorum. Ben malzemeleri vermekle yükümlüyüm. İncekaralar her aşamada var. Ben teslim ederek görevimi yapıyorum. Ambalaj içeriğini bilmiyorum .

S: Klimaların elektronik kartları götürülmüş haberiniz var mı? Nasıl alıp götürdüler biliyor musunuz?

C: Bilgim yok.

S: Bu aletler kime zimmetli.

C: Hangi bölüme kurulmuşsa bölüm mutemetine zimmetlidir. Ya sekreter ya da hemşireleri mutemetleri olabilir. Geçici kabulde değil kesin kabulde kişiler üzerine zimmetleniyor. İncekaralar firmasının bilgisi dahilinde ancak hastaneye girebilir yoksa giremez. Tam kapalı olmayan tahta ambalajlar içindeydi. Firma dışarıda söktü. Ben herhangi bir ıslaklık, küf herhangi bir hasar birebir görmedim. Tır geldiğinde İncekaralar geldi Ben de oradaydım. Araçları karşılıyorduk. Refakat edilip sabah erken ya da akşam saatlerinde getirilip portif getirilip malzeme indiriliyor. Küçükse içeri alıyorduk. İndirileceği yeri hastane yönetimi bildiriyor. Sözlü olarak bize idareden bilgi verilip ondan sonra indirilip içeri alıyorduk. Klimaların içeri alınmasında herhangi bir hasar konusunda hiçbir şey görmedim, duymadım bilmiyorum.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Ekrem ATEŞOĞLU





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı : B.30.2.HAC.0.00.00.01
Konu :

/410-2836

16/07/2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Ekrem ATEŞLIOĞLU,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 09:40'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 12040167988
 ADI VE SOYADI : Murat KARAAĞAÇ
 BABA ADI : Fahri
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : Şebinkarahisar/1962
 İKAMET ADRESİ : A.Eğlence Mah. Atadan CAd. Sivelan Sok.3/2
 Etlik/ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0 312 322 97 37 - 0530 204 96 94
 ÜNVANI : Daire Başkanı
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük / Merkez
 TARİH VE SAAT : 12 Temmuz 2012 16:30
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Strateji Geliştirme Daire Başkanı
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Daire Başkanı

KONU

MARUBENİ'den alınan.....171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap: Strateji Geliştirme Daire Başkanı Rektör adına Üniversitenin muhasebesini bütçesini ve ödemelerini gerçekleştiren birimdir. Alınan malzemede proje Dış Projedir. Proje Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilmiş olup bu durumda Başkanlığımızın ödeme talimatı verme durumu söz konusu değildir. Bu tarz projelerde Başkanlığımız sadece aracı birim olarak görev yapmaktadır.

Malların teslimi taşınır kayıt kontrol yetkilisi yapmaktadır. Yukarıda belirttiğim üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak Dış Projelerde hiçbir söz hakkı yoktur. Hastaneler Genel Direktörlüğünden gelen yazıyı ilgisi nedeniyle 7 Şubat 2011 tarihinde İdari ve Mali İşler Başkanlığına gönderilmiştir.

Fahri Erman

hbk

Soruşturmacı

Filiz Ercan

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Bilgi Veren

Murat KARAAĞAÇ

Canan

Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU

Mutlu

Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 12040167988
ADI VE SOYADI : Murat KARAAĞAÇ
BABA ADI : Fahri
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : Şebinkarahisar/1962
İKAMET ADRESİ : A.Eğlence Mah. Atadan CAd. Sivelan Sok.3/2
Etlik/ANKARA
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0 312 322 97 37 - 0530 204 96 94
ÜNVANI : Daire Başkanı
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük / Merkez
TARİH VE SAAT : 12 Temmuz 2012 16:30
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Strateji Geliştirme Daire Başkanı
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Daire Başkanı

KONU :
MARUBENİ'den alınan.....

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap: Strateji Geliştirme Daire Başkanı Rektör adına Üniversitenin muhasebesini bütçesini ve ödemelerini gerçekleştiren birimdir. Alınan malzemede proje Dış Projedir. Proje Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilmiş olup bu durumda Başkanlığımızın ödeme talimatı verme durumu söz konusu değildir. Bu tarz projelerde Başkanlığımız sadece aracı birim olarak görev yapmaktadır.

Malların teslimi taşınır kayıt kontrol yetkilisi yapmaktadır. Yukarıda belirttiğim üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak Dış Projelerde hiçbir söz hakkı yoktur. Hastaneler Genel Direktörlüğünden gelen yazıyı ilgisi nedeniyle 7 Şubat 2011 tarihinde İdari ve Mali İşler Başkanlığına gönderilmiştir.

Fatih Ercan
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Soruşturmacı

Filiz Ercan

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Bilgi Veren

Murat KARAAGAÇ

Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU

Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/ 410 - 2614

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Murat KARAAĞAÇ,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 12.07.2012 günü saat 16:00'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Filiz Ercan

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 57169131564
 ADI VE SOYADI : Yasin TÜRK
 BABA ADI : Hüseyin
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 16.01.1977/ KAMAN
 İKAMET ADRESİ : Kutlu Mahallesi 475.Sok. 9/9 Akdere/ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0505 501 12 55- 305 32 17
 ÜNVANI :
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonu
 TARİH VE SAAT : 13 temmuz 2012 16.30
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) :
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Hastane Müdür Vekili
 KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.


VERİLEN BİLGİDE :

SORU : Klima ların durumu malum 3 yıldır açık havada durmuş. Cihazın döşeneceği yerde inşaat (sıva boya badana) tarzı işler yapıldımı?

Cevap: 2005 yılında Onkoloji Hastanesi gece idaresinde göreve başladım. 2010 yılı başında erişkin hastanesi gece idaresine geçtim. Böl. 94 servisinin tadilata 2010 yılında girdiğini biliyorum. Klimaların yine 2010 yılında şuanda bulundukları alana taşındıklarını sözlü olarak öğrendim. 2007 yılında hastaneye teslim edilen Klimaları -2 otoparkta naylon çadır altında gördüm.

SORU: Beyaz teknik firması montajları SOMUT firmasına yaptırdığı söyleniyor. Anlaşma Marubeni firmasıyla yapılmış. İncekara Marubeninin temsilcisi olduğunu kabul etmiyor. Beyaz firması Weiss firmasının Türkiye temsilcisi. Bizim anlamak istediğimiz SOMUT firmasının rolü.

CEVAP: Somut firması Onkoloji Hastanemizde halen faaliyet göstermektedir. Firma sahibi Celal Bey olarak biliyorum. Numarası: 0532 788 50 66. Klimaların yukarı taşınması montajı kısmında para ödenmesi hakkında bilgim yoktur. Cihazların taşınması esnasında Onkoloji Hastanesinde görevde olmamam sebebiyle tüm bildiklerim sözlü olarak öğrendiklerimdir.



Soru: Bu klimaların ıslanıp ambalajlarının bozulduğuna dair fotoğrafları varken neden cihazlar kurulmuştur.

Cevap: Şahsi fikrimi soracak olursanız Yönetimin izni olmadan hiçbir şekilde kurulması mümkün değildir.

SORU: Mahkemedeki bilirkişi raporuna göre cihazların kartlarının değiştirilmesi durumunda cihazların kullanılması mümkündür deniliyor. Böyle bir durum söz konusu mudur?

Cevap: Firma dışarda 3 yıl bekleyen cihazı çalıştırmayacağını söylemiştir. Cihazların dışarda kalmasından dolayı kartlarda oksitlenme yanma durumu oluşabileceğini belirtiyorlar.

SORU: Kartların bozuk olduğuna dair kesin bir sonuç var mıdır?

Cevap: Kartların kontrolünün Almanya'da Weiss firması tarafından yapıldığı firma yetkilileri tarafından söyleniyor. Weiss firmasının Almanya'da olmasından ötürü kartların test edilmesi Almanya'da yapılmış. Sonuç olarak firma kartların çalışmayacağını söylüyor.

-Kartların ülkemizde bir yerde inceletme durumumuz olabilir mi?

Beyaz Teknik firması Weiss firmasının Türkiye temsilcisi olduğu için onun verdiği kararın aleyhinde bir karar veremeyeceğini tarafımıza belirtmiştir. Cihaz kartlarının test edilmek üzere Almanya'ya gönderileceği belirtilmiştir. Ancak kartların cihazlardan sökülmesi ile ilgili olarak belge veya tutanak bulunmamaktadır.

-Kartların yanmamış olmama durumu olabilir. Bu kartların test edilmesi gerekmektedir.

- Bunun için bilirkişi tayin edilebilir. Ya da Beyaz Teknik Firmasına kartların test ettirilmesi durumu olabilir.
- Cem Memik Beyaz Teknik Firmasının Sahibi. Numarası: 212 438 60 46


-Bu kartlar test edilmeden nasıl çalışmadığı söylenebiliyor?

- Bu cihazlar otoparkta beklerken, Wies firması cihazları Türkiye'ye gönderdiği cihazlar için kurulum talebi olmamasını merak ederek Üniversiteye geldiği söyleniyor. Ve cihazları açık alanda otoparkta ıslak halde görürler ve fotoğraflarını çekerler. Sonrasında bu cihazların çalışmayacaklarını hiçbir şekilde kurmayacaklarını söylemişlerdir. Bunlar yine sözlü olarak öğrendiğim bilgilerdir.

Ben İstanbul'dan istediğim kartları teslim aldım.

Ürün gelip ambalajından çıkarılırken başında kim oluyor?

- Sandık tırdan indiriliyor. Hastane yetkilisi firma yetkilisi, tedarikçi firma yetkilisi Tik li bir liste oluşturuluyor ve gelen malzemeler sandıklar açılmadan üzerindeki bilgilere dayanarak kontrol ediliyor. Sandıklar kurulum sırasında firma tarafından açılıyor.
- Biz şu anda Geçici kabulü yapılan malzemeleri yerinde kontrol ediyoruz. İlk defa bir geçici kabul protokolünde cihazda eksiklikler belirlenmiştir, ama cihazın çalışmasına engel olmadığı tespit edilen eksikliklerle geçici kabulün yapılabileceği sözleşmede belirtilmiş buna istinaden PET-CT cihazının geçici kabulü yapılmak üzeredir. Eksiklikler konusunda firmayla mutabakat sağlanmak üzeredir.



- Bilirkişiler kartlarla ilgili ne işlemlerde bulundular ?
- Bilirkişi cihazları ve bulunduğu mekanı kontrol etmiştir. Cihazların ve kartların fotoğraflarını çekmişlerdir. Kartların çalışıp çalışmadığına dair bir test yapılmamıştır. Bilirkişiler her geldiğinde ben yanlarındaydım.

Sizin kartların götürüldüğünden nasıl haberiniz oldu?


Mahkeme sürecinde oluşan Bilirkişi olayı yaklaştığında Beyaz Teknikle görüşüyordum. Beyaz Teknik firması servis elemanı İsmail Bey duyularıma göre kartları söken kişidir. Ben göreve geldikten bir süre sonra kartları İsmail Beyden talep ettim ve kartlar tarafıma gönderildi.

Kartların çalışıp çalışmadığına dair bilirkişi tayin edilip, İsmail ALTAŞ ile irtibata geçilecek. Numarası: 0 533 580 57 31. Hastanede çalışan Ekrem Ateşoğlu'da bu işlerde gözlemci olarak bulunur. Onun bilgisine de başvurmak gerekir.

- Soru: Klimalar, Ertuğrul Kale tarafından imzalanan İNCEKARALAR firmasına ait bir belge ile teslim 2007 tarihinde teslim edilmiş. 2010 yılında Beyaz firması tarafından SOMUT firmasına montajı yaptırılan klimalara ait elektronik kartlar niçin klimalardan sökülüp başka bir şehir ya da ülkeye götürülüp test edilmiş. Bu konu hakkında bildiğiniz nedir? Çünkü bu klimalar artık üniversiteye teslim edilmiş, neye dayanarak klimalara ait bir parça sökülüp teste götürülmüş, buna kim izin vermiş?
- Cevap: Kimin izin verdiğini bilmiyorum. Söylenene göre firma gelip kendisi söküp gitmiş. Bununla ilgili idaremizde hiçbir belge ve tutanak bulunmamaktadır.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Yasin TÜRK



BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 57169131564
ADI VE SOYADI : Yasin TÜRK
BABA ADI : Hüseyin
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 16.01.1977/ KAMAN
İKAMET ADRESİ : Kutlu Mahallesi 475.Sok. 9/9 Akdere/ANKARA
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0505 501 12 55- 305 32 17
ÜNVANI :
BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonu
TARİH VE SAAT : 13 temmuz 2012 16.30
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) :
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV :Hastane Müdür Vekili

KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE


:

SORU : Klima ların durumu malum 3 yıldır açık havada durmuş. Cihazın dşeneceğı yerde inşaat (sıva boya badana) tarzı işler yapıldımı?

Cevap: 2005 yılında Onkoloji Hastanesi gece idaresinde göreve başladım. 2010 yılı başında erişkin hastanesi gece idaresine geçtim. Böl. 94 servisinin tadilata 2010 yılında girdiğini biliyorum. Klimaların yine 2010 yılında şuanda bulundukları alana taşındıklarını sözlü olarak öğrendim. 2007 yılında hastaneye teslim edilen Klimaları -2 otoparkta naylon çadır altında gördüm.

SORU: Beyaz teknik firması montajları SOMUT firmasına yaptırdığı söyleniyor. Anlaşma Marubeni firmasıyla yapılmış. İncekara Marubeninin temsilcisi olduğunu kabul etmiyor. Beyaz firması Weiss firmasının Türkiye temsilcisi. Bizim anlamak istediğimiz SOMUT firmasının rolü.

CEVAP: Somut firması Onkoloji Hastanemizde halen faaliyet göstermektedir. Firma sahibi Celal Bey olarak biliyorum. Numarası: 0532 788 50 66. Klimaların yukarı taşınması montajı kısmında para ödenmesi hakkında bilgim yoktur. Cihazların taşınması esnasında Onkoloji Hastanesinde görevde olmamam sebebiyle tüm bildiklerim sözlü olarak öğrendiklerimdir.



Soru: Bu klimaların ıslanıp ambalajlarının bozulduğuna dair fotoğrafları varken neden cihazlar kurulmuştur.

Cevap: Şahsi fikrimi soracak olursanız Yönetimin izni olmadan hiçbir şekilde kurulması mümkün değildir.

SORU: Mahkemedeki bilirkişi raporuna göre cihazların kartlarının değiştirilmesi durumunda cihazların kullanılması mümkündür deniliyor. Böyle bir durum söz konusu mudur?

Cevap: Firma dışarda 3 yıl bekleyen cihazı çalıştırmayacağını söylemiştir. Cihazların dışarda kalmasından dolayı kartlarda oksitlenme yanma durumu oluşabileceğini belirtiyorlar.

SORU: Kartların bozuk olduğuna dair kesin bir sonuç var mıdır?

Cevap: Kartların kontrolünün Almanya'da Weiss firması tarafından yapıldığı firma yetkilileri tarafından söyleniyor. Weiss firmasının Almanya'da olmasından ötürü kartların test edilmesi Almanya'da yapılmış. Sonuç olarak firma kartların çalışmayacağını söylüyor.

-Kartların ülkemizde bir yerde inceletme durumumuz olabilir mi?

Beyaz Teknik firması Weiss firmasının Türkiye temsilcisi olduğu için onun verdiği kararın aleyhinde bir karar veremeyeceğini tarafımıza belirtmiştir. Cihaz kartlarının test edilmek üzere Almanya'ya gönderileceği belirtilmiştir. Ancak kartların cihazlardan sökülmesi ile ilgili olarak belge veya tutanak bulunmamaktadır.

-Kartların yanmamış olmama durumu olabilir. Bu kartların test edilmesi gerekmektedir.

- Bunun için bilirkişi tayin edilebilir. Ya da Beyaz Teknik Firmasına kartların test ettirilmesi durumu olabilir.
- Cem Memik Beyaz Teknik Firmasının Sahibi. Numarası: 212 438 60 46


-Bu kartlar test edilmeden nasıl çalışmadığı söylenebiliyor?

- Bu cihazlar otoparkta beklerken, Wies firması cihazları Türkiye'ye gönderdiği cihazlar için kurulum talebi olmamasını merak ederek Üniversiteye geldiği söyleniyor. Ve cihazları açık alanda otoparkta ıslak halde görürler ve fotoğraflarını çekerler. Sonrasında bu cihazların çalışmayacaklarını hiçbir şekilde kurmayacaklarını söylemişlerdir. Bunlar yine sözlü olarak öğrendiğim bilgilerdir.

Ben İstanbul'dan istediğim kartları teslim aldım.

Ürün gelip ambalajından çıkarılırken başında kim oluyor?

- Sandık tırdan indiriliyor. Hastane yetkilisi firma yetkilisi, tedarikçi firma yetkilisi Tik li bir liste oluşturuluyor ve gelen malzemeler sandıklar açılmadan üzerindeki bilgilere dayanarak kontrol ediliyor. Sandıklar kurulum sırasında firma tarafından açılıyor.
- Biz şu anda Geçici kabulü yapılan malzemeleri yerinde kontrol ediyoruz. İlk defa bir geçici kabul protokolünde cihazda eksiklikler belirlenmiştir, ama cihazın çalışmasına engel olmadığı tespit edilen eksikliklerle geçici kabulün yapılabileceği sözleşmede belirtilmiş buna istinaden PET-CT cihazının geçici kabulü yapılmak üzeredir. Eksiklikler konusunda firmayla mutabakat sağlanmak üzeredir.



- Bilirkişiler kartlarla ilgili ne işlemlerde bulundular ?
- Bilirkişi cihazları ve bulunduğu mekanı kontrol etmiştir. Cihazların ve kartların fotoğraflarını çekmişlerdir. Kartların çalışıp çalışmadığına dair bir test yapılmamıştır. Bilirkişiler her geldiğinde ben yanlarındaydım.

Sizin kartların götürüldüğünden nasıl haberiniz oldu?


Mahkeme sürecinde oluşan Bilirkişi olayı yaklaştığında Beyaz Teknikle görüşüyordum. Beyaz Teknik firması servis elemanı İsmail Bey duyularıma göre kartları söken kişidir. Ben göreve geldikten bir süre sonra kartları İsmail Beyden talep ettim ve kartlar tarafıma gönderildi.

Kartların çalışıp çalışmadığına dair bilirkişi tayin edilip, İsmail ALTAŞ ile irtibata geçilecek. Numarası: 0 533 580 57 31. Hastanede çalışan Ekrem Ateşoğlu'da bu işlerde gözlemci olarak bulunur. Onun bilgisine de başvurmak gerekir.

- Soru: Klimalar, Ertuğrul Kale tarafından imzalanan İNCEKARALAR firmasına ait bir belge ile teslim 2007 tarihinde teslim edilmiş. 2010 yılında Beyaz firması tarafından SOMUT firmasına montajı yaptırılan klimalara ait elektronik kartlar niçin klimalardan sökülüp başka bir şehir ya da ülkeye götürülüp test edilmiş. Bu konu hakkında bildiğiniz nedir? Çünkü bu klimalar artık üniversiteye teslim edilmiş, neye dayanarak klimalara ait bir parça sökülüp teste götürülmüş, buna kim izin vermiş?
- Cevap: Kimin izin verdiğini bilmiyorum. Söylenene göre firma gelip kendisi söküp gitmiş. Bununla ilgili idaremizde hiçbir belge ve tutanak bulunmamaktadır.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Yaşın TÜRK





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410 - 2610

01 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Yasin TÜRK,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 13.07.2012 günü saat 13:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 43100060284
 ADI VE SOYADI : ERCAN YİĞİT
 BABA ADI : AHMET
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 03.03.1982 - ANKARA
 İKAMET ADRESİ : ŞEYH ŞAMİL MH. 13. CD. 2-C BLOK NO:19
 ETİMESGUT/ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : İŞ: 0312 212 31 12 CEP: 0533 232 62 51
 ÜNVANI : ELEKTRONİK VE HAB.YÜK.MÜH.
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU
 TARİH VE SAAT : 17.07.2012 Saat: 18:50
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : BİLGİ SİSTEMLERİ MODALİTE LİDERİ
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : BÖLGE SERVİS YÖNETİCİSİ
 KONU :
 MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımında Kamu zararı olduğunu düşünüyoruz. Brakiterapi cihazına ait Well type ion odası teknik şartnamede var gözüküyor. Bu konuda bilginiz nedir?

Cevap:

Marubeni firması Brakiterapi cihazını Varian firmasından almıştır. Marubeni adına yükleme, gümrükleme, hastaneye yollama işlemini İncekaralar yapmıştır. Varinak, Varianın Türkiye temsilcisidir. Linac ve Brainlab'ların kulumu Varian firması tarafından yapılmıştır. Varinak burada teknik hizmeti vermekle yükümlüdür. Varinaktan refakat eden ismini bilmediğim kişi eşlik etmiş olabilir. Brakiterapi cihazını Varinaktan bir kişi de kurmuş olabilir, olmayadabilir de. İki tane Lineer akseleratör, Brainlab Varian firması tarafından kurulmuştur. Varinak elamanı olarak, birbirine bağlı bu 4 cihazın (aria) network kısmını ben kurdum.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU

Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

Bilgi Veren

Ercan YİĞİT



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2637

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.




Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 17:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

#	GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN KİŞİLER
1.	T.C. KİMLİK NO : 12526106036 ADI VE SOYADI : İbrahim Ender KILIÇ BABA ADI : Ali DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 24.03.1952 İKAMET ADRESİ : T.Güneş Bulvarı Ürdün Cad. Örmes Sitesi Villa 24 Oran-ANKARA EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 312 490 97 39 iş: 490 70 76 Cep tel: 532 235 57 89 ÜNVANI : Danışman BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu TARİH VE SAAT : 17.12.2012 Saat: 11:25 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında.
2.	T.C. KİMLİK NO : 45643366120 ADI VE SOYADI : Ayşe Nihan KAYA BABA ADI : Süleyman Nazif DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 01.08.1972 - ADANA İKAMET ADRESİ : Suadiye Mah. Aydın Sok. No:1-2 Suadiye – İSTANBUL EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0 212 282 43 85 – 0 532 321 11 69 ÜNVANI : Avukat (Marubeni Europe Plc vekili) BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu TARİH VE SAAT : 17.07.2012 Saat: 11:25 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : ŞU AN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem

Fatih Ersoy Samir  E. S.  

SORU: MARUBENİ şirketinden alınan 171 kalem malzemenin alımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz. Bu konuda bilginiz nedir? Braki-terapi (TRP6), Klima (HKS1), Pet-BT (NUK-2), Siklotron (NUK-3) koli listelerini temin edebilir misiniz?

CEVAP : Teknik Şartname alınacak cihazda aranan teknik özellikleri ihtiva eden dokümandır. Elimizdeki mevcut belgeleri ve koli listelerini size ulaştırabiliriz. Elimizdeki belgeler içinde teknik şartnameler, bunlara verilmiş cevaplar var. Bunlar Hacettepe'nin elindeki teklif dosyasında da mevcuttur. Ayrıca gönderilen malzemenin muhteviyatı hakkındaki koli listelerinde tüm detay bulunmayabilir. Gönderilen malzemeler kabul esnasında tek tek kontrol edilir, eksik varsa firmaya bildirilir, geçici kabul şartlı yapılır ya da yapılmaz.

CEVAP: Size sunmakta olduğumuz 21 Haziran 2012 tarihli cevabi ihtarnamemizde, bütün sorunlu olan cihazlara değinilmiştir, sorunun nerden kaynaklandığı size teslim ettiğimiz belgelerde mevcuttur.

SORU : İncekara bu işin neresinde?

CEVAP: İncekara, Hacettepe ile Marubeni arasında imzalanmış olan 2 Ağustos 2001 tarihli sözleşme ("Sözleşme") uyarınca Marubeninin Türkiye temsilcisidir. Sözleşme'nin 20. maddesi uyarınca İncekara Marubenin Türkiye temsilcisidir.

Cihazların gümrükten çekilmesine nezaret edilmesi, bunların Hacettepe'ye taşınması ve montajı ile ilgilenecek Türkiye'de bulunan bir temsilciye ihtiyaç vardır, çünkü birçok kalem ihtiva eden böylesi büyük bir Sözleşme'deki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için İncekara gibi bir temsilciye ihtiyaç bulunmaktadır.

HKS 1 bu kalemlerin içerisinde ilk teslim edilen cihazdır (Haziran 2007). Bu cihaz Hacettepe'nin 2007 yılındaki siparişi üzerine yine 2007 yılında Marubeni tarafından Almanya'dan gönderilmiştir. Marubeni tarafından teslim edilmesine rağmen Hacettepe ödenek olmadığı için bunların yerinin hazır olmadığını Marubeni'ye söylemiştir.

İdari Mali İşler Daire Başkanı Nejat Ertürk cihazların kuru bir ortamda saklanmakta olduğuna dair bir yazı imzalanmıştır (Temmuz 2008). Bu yazı yurtdışındaki tedarikçilere, tedarikçi garanti süresinin uzatımı talebi nedeniyle gönderileceği için İngilizce hazırlanmıştır ve imzalanmak üzere Rektörlüğe bırakılmıştır. Bu metin Üniversitenin bilgisi dahilinde imzalanmıştır. Bir yere imza atılıyorsa bunun içeriğinin bilindiği varsayılır.

SORU : Söz konusu yazı neden İngilizce hazırlanmıştır?

CEVAP: Hacettepe ile Marubeni arasında yapılan toplantılar hep İngilizce olagelmıştır. Bu firmalar yurtdışında olduğu için doğal olarak yazılan yazılar da İngilizce hazırlanmış ve imzalanmıştır; buna da kimse itiraz etmemiştir.

Nejat Ertürk tarafından imzalanan yazılar imza için İdareye bırakılmış, Marubeni kimin imzalayacağına karışmamıştır. Yazılar imza için Hacettepe'ye bırakılmıştır. Ancak kimin imzalayıp imzalamayacağına dair bir bilğimiz olmamıştır; olamaz da. Ayrıca ilgili yazının içeriği Nejat Ertürk Bey'e mutlaka anlatılmış olmalıdır.

Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan zaman çizelgesine göre belli süreler ve süreçler vardır. Zaman çizelgesi bugün size temin edilen belgeler arasındadır. Bu çizelgeye göre her iki tarafda



teslim, montaj, yer gösterme, geçici kabul yapma gibi bazı yükümlülüklerini belli süreler içerisinde yerine getirmek zorundadır.

Sözleşme uyarınca Marubeni yükümlülüklerini, Hacettepe kendi yükümlülüklerini yerine getirirse ifa edebilir. Örneğin Marubeni teslim yaptıktan sonra Hacettepe bu cihazlar için yer göstermelidir ki Marubeni bu cihazların montajını yapabilsin. Dolayısıyla tarafların karşılıklı işbirliği gerekmektedir. Aksi takdirde yükümlülüklerini yerine getirmesi fiilen mümkün olmayacaktır. Şunu söylemek gerekir ki bu Sözleşmenin eki devam çizelgesine bakılınca Hacettepe bir hamle yapacak, sonra Marubeni yapacak, Hacettepe siparişi verecek, Marubeni cihazın montajını Hacettepe'nin göstereceği yere yapacak, yer göstermez ise malın montajını yapamaz.

SORU: HKS1'in açık bir otoparkta tutulduğunu biliyor muydunuz?

CEVAP: Sevkiyattan, 1-1.5 ay önce sevkiyatın yapılacağına dair ihbarlar yapıldı, bunlar size temin ettiğimiz dosyada mevcut. Ödenek yokluğu nedeniyle Üniversitenin yer hazırlığı yapmadığı tarafımıza söylendi. Ancak biz bu cihazların açık bir otoparkta olduğunu bilmiyorduk. Hacettepe maalesef bu ürünleri yağmurda karda kışta çürümeye bırakmıştır. Bunu ilk kez Weiss tarafından 2009 yılında tarafımıza bildirildikten sonra öğrendik. Daha sonra toplantılarda ve yazılarda bu konuda uyarılarda bulunduk. İlgili belgeler size bugün temin edilmiştir.

2010 yılında Marubeni'nin Hacettepe'ye cihazların içeri alınması gerektiği noktasında uyarması üzerine HKS1 otoparktan kapalı bir alana alınmıştır. Toplantı tutanaklarında bunlar kayıtlıdır. Rektör Bey'in de açıklamaları yapılan toplantı tutanaklarında var.

Ayrıca Marubeni teklifini 2001'deki ekonomik koşullara göre vermiştir.

Marubeni HKS1'i getirip teslim etmiş ama Hacettepe yer göstermediği için cihazlar dışarıda tutulmuş yaklaşık 1.300.000 Avro değerindeki elindeki bu kadar değerli bir makinenin dışarıda çürümeye bırakılması çok üzücü.

SORU: İncekara'nın HKS1'in dışarıda olduğunu bildiği söyleniyor, hatta üstünün örtülmesi için naylon verdiği söyleniyor, ne düşünüyorsunuz?

CEVAP: Bunları kesinlikle ilk kez duyuyoruz. Açıkça söyleyebiliriz ki bu Marubeni tarafından kesinlikle bilinen bir şey değil.

SORU: Nejat Bey'in İngilizce bilmemesine ve Sözleşme'de yazışmaların Türkçe olacağını belirtmesine kendisinin söz konusu belgeyi imzalaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu iddiaları kabul etmiyoruz. Belgeyi kimin imzalayacağı Üniversite'nin kendi inisiyatifindedir. Buna biz karışamayız.

Marubenin buradaki tek niyeti bitmek üzere olan tedarikçi garanti sürelerinin uzatılması için tedarikçilerle temasa geçerek Üniversiteye yardımcı olmaktır.

Yukarıdakine ek olarak Weiss ve Beyaz Tekniğin makinenin artık kullanılamaz olduğu ve hastaların mağdur olabileceğine dair birçok kez sözlü ve yazılı olarak Hacettepe'ye ilettik. Bu belgeler size temin edilmiştir.



Ancak öğrendik ki Weiss kesinlikle kurmayın demesine rağmen Hacettepe bu işi Somut Firmasına yaptırmış.

SORU: Neden birçok firma var? Örneğin Marubeni, İncekara, Weiss ve Somut gibi?

CEVAP: Örneğin inşaat işini Weiss yapamaz. Her şirketin kendine ait bir ticari faaliyet alanı vardır. (inşaat, tedarik gibi)

SORU: Neden Hacettepe sizce ihaleye girdi? Cihazları tek tek satın alamaz mıydı?

171 ayrı özelliğe sahip bir arada paket haline getirip verebilmek için toplayıcı bir firmaya ihtiyaç var Marubeni gibi. Ayrıca o dönemde Hacettepenin Hazine mali yardımına ihtiyaç duymuş olması mümkün.

SORU: Beyaz tekniğin görevi nedir? Marubeni ile bir ilişkisi var mıdır?

CEVAP: Weiss 'ın Türkiye temsilcisidir. Dolayısıyla Marubeni ile hiçbir organik bağı bulunmamaktadır.

SORU: HKS1 hakkında bir bilirkişi raporu var, bu bilirkişiyi kim tuttu?

CEVAP: Hacettepenin Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesine yapmış olduğu delil tespit başvurusu sonucunda Mahkeme tarafından bir bilirkişi atanmıştır.

SORU: Bilirkişi raporuna göre cihazın tamir edilebilmesi için 500.000-TL gerektiği söyleniyor. Bunu kim ödemeli?

CEVAP: Daha önceki yazılarımızda ve ihtarnamemizde belirttiğimiz üzere bunu kusurlu olan Hacettepe ödemeli kanısındayız. Tedarikçi bağımsızlık sistemi zayıf olan hastalar için bunun büyük bir risk teşkil ettiğini belirtmektedir. Dolayısıyla burada insan hayatını yakından ilgilendiren ciddi bir risk bulunmaktadır.

SORU : Hacettepe eski yönetimi cihazların hepsinin kesin kabulü yapılmadan vaktinden önce teminatı serbest bırakmıştır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

CEVAP: İdari şartnamenin 18. maddesi uyarınca geçici ve kesin kabulleri yapılan cihazlara isabet eden teminat mektubu tutarlarının iadesi gerekmektedir. Üniversite tarafından da teminat mektubu bu şekilde serbest bırakılmıştır. Kabulü yapılmayan hiçbir cihaz için teminat mektubu iadesi yapılmamıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda görevli olan Aslan Bey, teminat mektubu iade taleplerimizi oturup tek tek incelediler, biz zaten kabulü yapılmayan bir teminat tutarı talep etmedik.

Geçici ve kesin kabulü yapılan cihazların teminatların serbest bırakılması firma tarafından talep edilmiş, Üniversite tarafından kabul edilmiştir.

SORU: Cihazların mülkiyeti ne zaman Hacettepe'ye geçer?

CEVAP: Mal bedeli ödendiği tarihte Hacettepe'ye geçer.

Ayrıca Sözleşme madde 11.10. uyarınca Hacettepe teslim edilen malları saklama ve depolama yükümlülüğü altındadır. Bu da mülkiyetin Hacettepe'ye geçmiş olduğunu gösterir niteliktedir.

Fahri Ercan *Caner* *[Signature]* *Eğret* *[Signature]*

Ayrıca mülkiyet Hacettepe'ye geçmemiş olsaydı Hacettepe cihazları gümrükten çekemezdi. Bunların hepsini İdari Mali İşler Daire Başkanlığı iyi bilir.

Avukatlardan açıklama: Ankara 16. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulan cevap dilekçesinde Hacettepe'nin Sözleşme uyarınca yerine getirmesi gereken yükümlülüklerine dair maddeleri tek tek belirttik. Kısaca belirtmek gerekirse bu maddeler şu şekildedir:

- Sözleşme madde 1.1.a.
- Sözleşme madde 1.2.b.
- Sözleşme madde 11.1
- Sözleşme madde 11.3
- Sözleşme madde 11.8
- Sözleşme madde 12.3
- İdari şartname madde 19.b.
- Genel Teknik Şartname g.1-a.
- Genel Teknik Şartname d.1.
- İdari Şartname madde 18

Bu sözleşmedeki maddeleri Hacettepe yerine getirmemiştir. Bu yükümlülükleri yerine getirseydi, mesela Hacettepe yer gösterecek ona göre bir sonraki hamleyi yani montajı Marubeni yerine getirecek. Ancak Hacettepe bunların hiçbirisini gereği gibi yerine getirmemiştir ki Marubeni kendi yükümlülüklerini yerine getirebilsin.

Hacettepe Üniversitesi cihazları Somut firmasına kurduruyor. Bilirkişi zamanında bu anlaşılmış ve cihazlar içeri alınmış, Somut firması da getirip kurmuştur. Beyaz Tekniğe sorulmuş ama bunları biz yapmadık demiş, Somut Firması yaptı demiş. Beyaz Teknik ve Somut arasında bir bağ yok. Somut firması Üniversitenin çalıştığı firmadır. Bizim bildiğimiz kadarıyla Weiss'in haberi yok.

SORU: HKS1 montajını kim yaptı?

CEVAP: Marubeni'nin bu montajdan haberi yoktur. Öğrendik ki montaj Somut Firması tarafından yapılmış. Bildiğimiz kadarıyla Beyaz Teknik ile Somut Firması arasında bir ilişki yok. Yine bildiğimiz kadarıyla Weiss'in haberi yok. Çünkü dosyada göreceksiniz ki Weiss bu konuda Hacettepe'yi uyarmıştır.

Avukatın açıklaması: Sözleşme 2001' de imzalandı, ancak Marubeni ilk teslimatı 2007 yılında yapabildi. Çünkü Hacettepe ilk siparişi 2007 yılında verdi. Dolayısıyla Marubeni hiç ummamasına rağmen ilk siparişi 6 yıl bekledi. Ancak Marubeni Sözleşmeyi feshetmedi, Hacettepe'nin ödenek yetersizliklerine anlayışla yaklaştı. Feshetmemek bir iyiniyet göstergesidir.

Üniversite 6 yıl geçmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirmemiş, kim yükümlülüğünü yerine getirmemiş ona bakmak lazım, firmalar bazen prestijleri için bazı sorunlara toleransla

Fulya Erkan *Lan...* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

yaklaşabilmektedirler. Hacettepe gibi büyük ve saygıdeğer bir Hastane ile 171 cihazlık kapsamlı bir sözleşme yapıp daha sonra da bunu bir anda kestirip atmak bu kadar kolay değil.

SORU: Garanti süreleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

CEVAP: Biz iyiniyet göstergesi olarak garanti sürelerini uzatma yoluna gittik.

Garantiyi veren tedarikçidir. Örneğin Weiss ve temsilcileri HKS1 için garanti sağlayabilecek yegane firmalardır. Bu firmalar ticari bir teammül olarak cihazın yükleme tarihinden itibaren azami 24 ay veya 30 ay gibi süreler için cihazlara garanti sağlamaktadırlar. Bu sürenin bitiminde ne Marubeninin ne de başka bir firmanın ekstra bir garanti vermesi mümkün değildir. İki taraf da bunu bildiği için birbirlerini zaman çizelgesi ile sınırlamışlardır. Ancak Hacettepe bu süreleri riayet etmemiştir. Örneğin Hacettepe bu süreleri uysaydı 10 gün içinde cihazdaki arızaları bildirmesi aksi takdirde de geçici kabulünü yapması gerekirdi.

AVUKATIN AÇIKLAMASI: Hacettepe HKS1'in kullanılmasının tehlikeli olduğunu biliyor zaten. Marubeni daha yakınlarda 8 Haziran'daki ihtarnamemizle bunu sunduk hiçbirşey gözden kaçmasın diye. Bu parasal mevzuların çok ötesinde bir konu. Cihaz artık Marubeni'nin teslim ettiğimizden, Weiss'ın ürettiğinden bambaşka bir hal almış, dolayısıyla ben garanti sağlayamam diyor Weiss.

Tekrar belirtmek isteriz ki Sözleşme'ye göre cihazları saklama ve depolama yükümlülüğü Hacettepe'ye ait ama Hacettepe bunu yerine getirmemiştir. Üstüne üstlük HKS1'i otoparkta çürümeye terk ederek finansmanının Hazine'den yani Türkiye Cumhuriyeti vergi mükellefleri paraları ile karşılanmış olan yaklaşık 4.5 milyon TL gibi bir meblağ değerindeki cihazın kullanılamaz hale gelmesi çok üzücüdür.

SORU: Weiss firmasının HKS1 bu şekilde kullanılmasın diye yazısı var. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?

CEVAP: Evet doğrudur. İlgili belgeyi 8 Haziran 2012 tarihli ihtarnamemizle ve daha önce Hacettepeye ilettik. Ayrıca bugün sizlere temin etmiş olduğumuz belgelerde bu yazı da mevcuttur. Yenisinin indirimli olarak Hacettepe'ye verebileceği de bu yazıda bulunmaktadır.

AVUKATIN AÇIKLAMASI: Pet-BT ve diğer birçok cihazda Marubeni firması atlanılarak Hacettepe direkt diğer firmalarla temasa geçmiştir ve tamiratları bu firmalara yaptırmıştır. Dolayısıyla Marubeninin bu işlemlerin hiçbirinden haberi yoktur. Örneğin PET-BT'nin tedarikçisi GE ile Hacettepe direkt temasa geçmiştir ki bu Sözleşmeye aykırı bir durumdur.

22 Şubat 2012 tarihinde Hacettepe'den gönderilen mektup ile PET-BT cihazına ait eksikliklerden haberdar olunmuştur. Eksiklikler yıllar yılı Marubeninin bilgisi dahilinde değildir.

AVUKATIN AÇIKLAMASI: NUK-3 kodlu Cyclotron için: 13 Mart 2007 Hacettepe Marubeniye sipariş veriliyor, 29 Eylül 2007 de sevkiyat yapılıyor, buraya fiziksel teslimi 7 Kasım 2007'de oluyor.

Cyclotron için: Hacettepe ilk defa 20 Nisan 2012 tarihinde Marubeni'ye yazılı olarak Melon Cafe'nin kurulum için uygun olduğunu söyledi. Ancak bundan önce Hacettepe 2 defa şifahi başka yer göstermiştir, sonra bu yerlerden vazgeçmiştir.

Fatih Erkan
Amir
[Signature]
[Signature]
[Signature]

AVUKATIN AÇIKLAMASI: Brakiterapi (TRP6) hakkında: Davadan önce Marubenin bu cihazdaki eksikliklerden haberi yoktu. TRP 6 cihazının sorunlu olduğunu bilmiyorduk. Bu eksikliklerden şimdiye kadar hiç bahsedilmedi. Üniversiteden kaynaklanan sorunlar var ama Marubeni bunu anlayışla karşılıyor.


Ek 1: 1 adet liste (4 sayfa) Ekli listede belirtilen belgeler 17 Temmuz 2012 tarihli komisyon toplantısında Komisyona bırakılmıştır.

Ek 2: 1 adet Vekâletname

Ek 3: 1 adet yetki belgesi

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

İbrahim Ender KILIÇ



Stj. Av. Erdem Başgöl





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410-2631

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Av. Erdem BAŞGÜL,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 17.07.2012 günü saat 11:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 22886669614
 ADI VE SOYADI : Celal TEKALP
 BABA ADI : Hasan Baki
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 1965/ANKARA
 İKAMET ADRESİ : Büklüm sok. No:47/2 Kavaklıdere
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 4670727-05327885066
 ÜNVANI :
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük Toplantı Salonu
 TARİH VE SAAT : 19.07.2012 saat:10.00
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Makine Mühendisi
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Somut Ltd.Şti. Şirket ortağı

KONU :
 MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE :

S:2001 YILINDA ALINAN KLİMALAR İLE İLGİLİ SIKINTI YAŞANIYOR. Onkoloji hastanesine yerleştirip yerleştirmedeği soruldu. Sizin göreviniz o dönemde neydi?

C: Firma ortağı olduğu beyan edildi

S: Ne iş yaptığı soruldu

C: inşaat onarım işi yapıyorum, somut firması olarak

C: Onkoloji hastanesinin 2008 sonu 2009 yılında tadilatına başlandı. Her türlü tadilata başlandı Yapı işlerinin verdiği projeler yapıldı.

S. H.Ü.den kimin verdiği soruldu.

C. 2009 yılında H.Ü.den ihaleyle alındığı söyledi. Tarafımıza verilen ihale projesi ve idarenin verdiği tadilat projeleri doğrultusunda inşaat işleri yapıldı. Yapılan işin içinde 171 kalem ifadesinin gerektirdiği alt yapı işleri de vardı. 171 kalemin altyapısının hazırlanmasında yaptık.

C. Tezer hocanın talimatıyla yapıldı. Kemik iliği bölümünün hava kanallarını yapmaya başladık. Bundan başka klima için gerekli inşaatları yapmaya başladık. Bu sırada Weissden gelen heyet bu cihazların Onkoloji hst. otoparkında muhafaza edildiğini görmüşler. Olayda o zaman ortaya çıkmış.

Fatih Erzan

S. Weiss firmasından gelindiğini nereden biliyorsunuz?

S. Beyazın fonksiyonu nedir?

C. Beyaz Türkiye temsilcisi

S: Weiss'den kim geldi diye soruldu

C. Weiss teknikin Almanyadan yetkilileri ve Beyazdan Cem MEMİK geldi?

C. Cem Memik

C. Marubeni weiss Teknikle ilişkiye geçmiş

S. Beyazla alakası nedir?

C. Klima cihazlarının garantiye alınmadığını söyledi.

S. Kimden duydunuz?

C. Tezer hoca ve weissden duydum.

S. Beyaz biliyormu bunu

C. Biliyor

S. Klimaların açıkta bırakıldığını hiç görmedinizmi hiç.

C. Görmedim.

S. Siz baktığınızda ne dediniz.

C. Su almıştı. Çıtaların içindeydi. Naylonlanmış ve o şekilde duruyordu. Naylonlarda güneş altında yıpranmış. Su almıştı.

S. Naylonların yenilendiği söylendi

C: Bilmiyorum dedi.

S. İncekara yı biliyormusunuz?

C. Tezer hoca ile İncekara ve Marubeni ile zaman zaman toplantı yapıldı. General elektrikle toplantılarda görüştük. İncekara toplantılara Marubeni adına geliyordu.

C. Cihazlar su almış filitreleri gitmişti. Pano kısımları da su almıştı. İzleri vardı. Su izleri vardı. Tezer hoca cihazların çalışıp çalışmadığını sorudu bana. Bende elektronik kartların bozulup bozulmadığını elektrik vermeden anlaşılamayacağını söyledim. Elektrik verilirse kısa devre olursa patlayabilir. Yetkili firma otomasyon cihazlarını söküp akım vermeden, deneyebilir.

S. Bu klimaları park yerinden ambalajlarını söküp yerlerine siz mi çıkardınız?

C. Kesinlikle bu cihazları ben yukarı çıkarmadım. Benim sorumluluğumda değil.,

C. Bu cihazları İncekara firması hamal getirerek kolileri açtı ve yukarı çıkardı.

S. İsim istendi.

Fatih Ercan

İncekara

Marubeni

C. Özgür Çivi.

C. Ekrem Bey ordaydı. Meral Hanımdan emin değilim.

S: Cihazı kapılardan geçirmek için kapılar kırıldı mı?

S.Kapılar kırıldı mı geçirmek için.

C.4.kattaki kapı söküldü. 3.kat açıldı. Kapı sökme işini bana talimat verildiği için ben söktüm.

S. Beyaz eşlik ettim demiş.

C. İncekara vardı ama Beyazdan da bir kişi olup olmadığına emin değilim

S. Klimaların Türkiye'deki sahibi Beyaz. Ama Beyaz burada müdahale etmiyor. İncekaralar açtırıyor paketleri. Firma kabul etmeden paket açılırsa garanti kapsamı dışına çıkmaz mı

C. Su alınca zaten garanti kalkar?

S. İncekaramı çıkar dedi size

C. İncekara kendi başına otoparktaki klimaları yerlerine çıkarmak için Genel Direktörlükten ve Hastane idaresinden, Yapı İşleri, Hastane Güvenliği haberi olmadan bu işi yapamaz.

S. Hastanedeki cihazlar açılırken başında kimler oluyordu ?

C. Malzemenin cinsine bağlı. Hastane idaresinden ve General Elektrikten. Hocaların görevlendirdiği teknisyenler vardı.

S. Kim durması gerekiyor sizce

S. Yapı İşleri Tek.Dai.deyince ne anlıyorsunuz

C. Benim yaptığım herşeyden sorumlu bir idare, benim yaptığım işi kabul eden ya da etmeye birim.

C. Yaptığımız işlerle ilgili her şeyi projeleri. Yapı işlerine veriyoruz. Yapı işleri daire başkanlığının görevlendirdiği kontrol mühendisleri sürekli bizi kontrol ediyordu.

S. Yönetimin haberi vardı, İncekaralar çıkarttı, Beyazın elemanı da var mıydı ?

C. Teyit edip öyle söyleyeyim

S. Alman firma sorumluluk kabul etmedi gitti. Beyaz niye yollamıyor eleman

C. Bilmiyorum nakliye işi İncekaraya ait olmalı, Almanlar da olmayabilir

S. Marubeni açık havada beklediğini bilmediğini soruyor

C. Marubeniye saklama koşulları sorulmuş. Alman firma Marubeniden korunduğuna dair yazılı belge var diyor. Alman firmanın kişisel ziyaretinde cihazların uygun koşullarda korunmadığını kişiye beyan ediyor.

S. Bu inşaatın bütün parasını aldınız mı?

C. Bir miktar kaldı.

Fatih Ercan

Emel

Y. H.

S. Siz bu firmalarla toplantı yaptınız mı?

C. Hayır.

S. Sonuç olarak ben inşaat firmasıyım ve klimaların paketlerini açıp yukarıya yerlerine ben çıkarmadım.

C. Cihazların elektriğini ve kanalları yapan benim.

C. Beyaz teknik firması gelip cihazları çalıştırması gerekiyordu.

S. Klimaların odasının anahtarı sizdemi, firmalardan gelinip cihazın kartı alınıp gidilmiş bilginiz var mı?

C. Biz Tezer beyin isteği üzerine beyaz teknikle görüşme yaptığımızda kartlara bakılması gerektiğini ortağımdan duydum. Anahtarlar 3 adet olup bir adedi bizde diğerleri hastane idaresinde bulunuyordu.

S. Sonra kartlar gitti çalışmıyor mu?

C. Bir malzeme takılması gerekiyormuş oda ellerinde (dangıl) olmadan hiçbir şekilde çalıştıramayacağını Beyaz firması söyledi. Dangıllar weiss'in elindeymiş.

S. Klima geldiyse dangılı vermesi lazım.

S. Beyaz dangıl bende yokmu dedi

C. Evet yok dedi.

C. Kartların yanması önemli olan

C. F5 ve F9 klasında filtreler bulunmakta. Türkiyeden temin edilebilir. Temini kolay bir yedek parça.

C. Toplantı tutanakları idarede dir. İncekara bu tutanaklara mail atıyor. Toplantıda tamir bedeli konuşulmuş olabilir.

S. Alman firma bu cihazlar çalışmaz diye bir belge verdi mi?

C. Bilmiyorum, toplantıda Tezer hocama söylemişler

S. Cihazları kim çıkar dedi.

C. İncekaralar toplantıda teklif etti ama biz kabul etmedik.

S. Siz hiç toplantı yaptınız mı bu firmalarla?

C. Klimaları Weiss görüp yukarı çıkarıldıktan sonra toplantılara çağırılmadım.

S. Duyumlarınızı mı söylüyorsunuz.?

C. Evet

C. Bu toplantılar teknik toplantılar.

Fahri Ercan

İsmail

Mustafa

Y. Akar

C. Bu cihazın kurulacağı yere bir inşaat projesi hazırlanmış. Ama firma o proje değil diyor. Sonra Fransadan elemanlar geldi toplantılar yapıldı. Yapılan projeyle ihale projesinin alakası yoktu. İhale kapsamımızda yapılabilecek bir şey ise yapalım dedik. Konu ile ilgili Biray hanımın detaylı bilgisi vardır.

C. Biray hanımın elinde dökümanlar vardı. GE gibi bir firmanın küçük şeylerle uğraştığı söylendi. Toplantıda çizilen proje ile bize Fransadan gelen Ge firması yetkilisinin getirdiği proje çok farklı yeni proje geldi. Biray hanım tek tek inceleyip GE ile çok tartışmış. Toplantılarda İncekara dinleyici olarak bulundu. Bu proje taslak projesiydi imalat projesi değildi.

S. GE den kimse yok muydu?

C. GE firmasından yurtdışından Siklotron hakkında bir yetkilisi vardı. GE firması Tezer hocanın isteğiyle bir proje hazırladı

S. Bu proje öyle kaldı mı?

C. Evet

S. 4 metre yüksekliği olmalı?

C. Boş bir yer değildi. İzole edilmesi lazım. GE, en baştan burası olmaz demedi. 1.5 yıl toplantılar sürdü. Burası bordum katında üzerinde borular geçen, su basan bir yer.

S. Sadece çıkarılması ile ilgili değil sıkıntılar

C. Bize iletilen bir sıkıntı yok.

S. Başka bize söylemeniz gereken şey var mı?


C. Yaptığım her işten Tezer hocanın haberi var. Çakılan her çiviye Tezer hoca ve yapı işlerinden habersiz yapmadım.

S. Klimalar yerlerine niçin taşındı?

C. İyi niyetle taşındı diye düşünüyorum. Tahminim toplantılarda çalıştırılabileceği izlenimi alınmış olmalı ki taşındırılmıştır. Ama gerçek sebep ve nedenini bilmiyorum.

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Celal TEKALP





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı : B.30.2.HAC.0.00.00.01
Konu :

/410-2856

17/07/2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Celal TEKALP

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 19.07.2012 günü saat 10:00'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 38140228008
 ADI VE SOYADI : Ali Murat ÖZARTAN
 BABA ADI : İbrahim Müfit
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 10 Kasım 1970
 İKAMET ADRESİ :
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 436 09 40 / 502 218 35 07
 ÜNVANI :
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER : Rektörlük / Merkez
 TARİH VE SAAT : 10:30
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Klinik Kimya Bölümü Satış Temsilcisi
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Proje Bölümü Satış Temsilcisi
 KONU :
 MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.

VERİLEN BİLGİDE :

SORU: Üniversitemiz şirketinden MARUBENİ şirketinden aldığı 171 kalem malzeme için sıkıntılar var bu konuda ne düşünüyorsunuz?


Cevap: 2000 yılından bu yana İncekaralarda görevli olmama rağmen son 1 yıldır bu konunun içerisindeyim. Son 1 yıl için bilgilerimi aktarabilirim. Abant İzzet Baysal Karadeniz Teknik Üniversitesi Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe bu 4 üniversite dış proje kapsamında bu kadar yüklü miktarlarda alım yapan üniversitelerdir. Abant İzzet Baysal firması da Marubeniden alım yapmıştır. Sorumluluklarını yerine getirdi, teminatı geri aldı.

171 kalem malzemenin hepsi teslim edildi, çoğunun montajı ve geçici kabulleri yapıldı. Sadece 9 cihazın bazılarının montajının da yapılmış olmasına rağmen geçici kabul belgeleri yok. Bazı kalemler örneğin Pet-CT gibi Mayıs 2011 tarihinden beri çalışmakta ve hasta sonucu veriyor olmasına rağmen geçici kabulü alınamamıştır.

Klimaların nereye kurulacağı hakkında 3 yıl gibi uzunca bir süre yer gösterilmedi. Klimalar 3 yıl açık hava koşullarında dışarda bekletildi. İdare bize yer göstermemiştir. Bu işlerde "İdare Yap der Firmada yapar." İdare kurulacak yeri firmaya gösterir. İdare cihazın oraya kurulması için gerekli alt yapı sistemini sağlar. Firma gösterilen yere montaj yapar. Ayrıca Marubeni firması cihazların dışarda durmasının cihazlara zarar vereceğini idareye beyan etmiştir.

Filiz Elcan




20270

Soru: Klimaların niye geçici kabul belgeleri yok?

Cevap: Klimaların geçici kabul ya da kesin kabullerinin gerçekleşebilmesi için malzemenin montaj yerine kurulup çalışır bir biçimde teslim edilmesi gerekmektedir. Cihazın geçici kabulünün yapılabilmesi için montaj yerinin Üniversite tarafından gösterilmesi gerekmektedir. Montaj yeri gösterilmeyen üç yıllık süre içinde de klimalar kötü hava koşullarında muhafaza edilmiştir. Bu cihazlarda teslim edildikten sonra öngörülen montaj süresi en fazla 6 aydır. İhale 2001 yılında yapılmıştır. Cihazların teslim edildiği 2007'den 2010 senesine kadar geçen sürede montajın yapılamaması ve cihazların açık havada ve kötü koşullarda muhafazası durumu sonucu bu noktaya gelinmiştir.

Soru: Üniversite size yer göstermediği halde neden malzemeleri getirdiniz?

Cevap: Bu konuda inisiyatif idarenin kontrolündedir. İdare bize listeyi verdiği andan itibaren biz malzemeleri getirmekle mükellefiz. İncekaralar A.Ş. bu sözleşmede herhangi bir taraf değildir. Biz yurtdışından cihazı alıp Hacettepe'ye satan bir firma değiliz. Biz Marubeninin Türkiye'deki operasyonel işlerini yürütürüz.

İdare kurulacak yeri firmaya gösterir. O cihazın oraya kurulması için gerekli alt yapı sistemini sağlar. Firma gösterilen yere montajı yapar. 'Bu malzemelerin dışarda durması malzemelere zarar verir. Uygun şartlar oluşturulmalıdır ve kapalı alana taşınmalıdır.' ibaresi Marubeni firması tarafından defalarca söylenmiştir.

SORU: Marubeni firmasında bir eleman 30 April - 24 April- 8 December- 11 April 2007 tarihlerinde gelip İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Eczacı M.Nejat ERTÜRK'e İngilizce belgeler imzalatmıştır. Sözleşmede tüm yazışmaların Türkçe olması gerektiği belirtilmesine rağmen neden yazışmalar İngilizce yapılmıştır. Ayrıca Marubeni firması Nejat ERTÜRK'e Novalis cihazıyla ilgili kuru yerde muhafaza etmeniz gerekir anlamında imzalattığı İngilizce metin hakkında Bilginiz var mıdır?

Cevap: Bu belgeler ve imzalar hakkında bilgim yoktur. Novalis cihazıyla ilgili bir sıkıntı yoktur.


Soru: Beyaz firmasının bu montajdaki yeri nedir? Somut firması devreye nasıl girmiştir?

Cevap: Weiss firmasının Türkiye temsilci BEYAZ firmasıdır, montaja bunların eşlik etmesinden doğal bir durum yoktur. SOMUT firmasının klimalarla ve BEYAZ firmasıyla ne alakası olduğunu bilmiyorum. İncekaralar firması Marubeninin Türkiye'deki operasyon iş ortağıdır.

Soru: Üniversite geçici ya kesin kabulü olmadan ücret ödemiştir ve öncesinde de teminatları serbest bırakmıştır. Görüşleriniz nedir?

Cevap: Dış kredili proje olmasından dolayı MARUBENİ firmasının malzemeyi gönderebilmesi için ödeme yapılması gerekmektedir. Bu malzemelerin gümrüğe gelebilmesi için İdare firmaya listeyi gönderdikten sonra malzemeler yola çıkar ve bu esnada ödeme yapılması gerekir.

Fily Ercan




ÖZARTAN

Teminatların serbest bırakılmasını bilmiyorum dedi.

Soru: Klimaların çalışmadığını nasıl anladınız? Klimaları kurmak için üniversite talepte bulundu mu? Klimaların elektronik kartlarının çalışmadığını nasıl anladınız, gelip aldınız mı?

Cevap: Park yerinde uzunca yıllar bekledikten sonra kurma talebi üniversite tarafından geldi, Marubeni firması sürekli bu zaman süresince kurulması gerektiğine dair üniversiteyi uyardı, fakat bize yer gösterilmedi. Bu kadar süre geçince açık havada cihazlar zarar gördüğü için üretici firma sorumluluk almayacağını söyledi.

Soru: Firma cihazların zarar gördüğünü nasıl anladı?

Cevap: Beyaz Teknik firmasının incelemesiyle ortaya çıktı..

Soru: Hızlandırıcı niçin kurulmadı?

Cevap: Üniversite ilk kez Nisan 2012'de yer gösterdi, kurulum için. Marubeni hızlandırıcıyı kurmam demiyor, montaj için uygun yer bulunduğu anda cihazın montajı yapılacak. Garantisi için bilemiyorum ne yapılabilir?

Soru: Brekiterapi cihazının well type iyon odası için ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Brekiterapi cihazının well-type iyon odasının olmadığını İncekaralar ve Marubeni firmaları bilmiyor, iyon odasının olmadığını ilk defa sizden duydum. Bu kalemin geçici kabulü daha önce yapıldığını biliyorum.

Soru: Varinak firmasından Kemal Ay ve Ercan Yiğit beyler biliyorlarmış.



Cevap: Bize iletmediler, Marubeni bunu bilmiyor?

Soru: PET/BT deki eksik malzemeler için ne düşünüyorsunuz. Eksik malzeme listesi kendisine gösterildi.

Cevap: Üniversite noter kanalıyla PET/BT deki eksiklikleri Marubeniye bildirdi. Bu eksikliklerin giderileceğini noter kanalıyla yazdı ve sorumluluğu üstlendi.

Üniversite ile sorun sadece klimalar ve garanti sürelerindeki anlaşmazlıklar, geri kalanlar da zaten bir sıkıntı yok. Üreticilerin Marubeniye vermiş olduğu garanti süreleri dolduğu için ve üniversitede söz verdiği sürede montaj yaptırmadığı için Marubenide mağduriyet doğuyor. Sıkıntının sebebi budur, şeklinde söyledi. Siz olsaydınız ne yapardınız?

Fatih Ercan



ÖZALP

Soruşturmacı


Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



Bilgi Veren

Ali Murat ÖZARTAN





T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/ 410 - 2612

02 Tem 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Murat ÖZARTAN,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 13.07.2012 günü saat 10:00'da H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Filiz Ercan

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı



13.07.2012

T.C
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ÖYP Koordinatörlüğü
ANKARA

SAYI : BT2012.958
KONU : 02.07.2012 tarih ve 410-2636 Sayılı Soruşturma Hk. Yazınız
İLGİLİ : Prof. Dr. FİLİZ ERCAN

13.07.2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kam püsü Rektörlük Toplantı Salonunda konu ile ilgili bilgimize başvurulmuştur. Belirlenen tarih ve saatte başka bir yerde bulunacağımdan ve konuyla ilgili firmamızda bilgi sahibi başka bir yetkili bulunmadığından aktaracağım bilgileri aşağıda aşağıdaki yazımda sizlere iletiyorum.

Yetkilisi olduğum BEYAZ TEKNİK YAPI SİSTEMLERİ SAN ve TİC LTD ŞTİ bahis olunan 171 kalem malzeme alımı işinde bir kalem ürün üretici ve satıcısı olan WEISS KLİMA TECHNIK şirketinin Türkiye yetkili temsilcisidir. Bu kalem ürünle ilgili tüm ekipmanlar Almanya Weiss Klima Technic firması tarafından eksiksiz olarak Almanya MARUBENİ EUROPE PLC firmasına Almanya'da teslim edilmiştir. Biz anılan ürünleri ilk defa sevk tarihinden yaklaşık üç yıl sonra açık alanda uygun olmayan şartlarda depolanmış ve hatalı depolanmaya bağlı hasarlı olarak üretici firma yetkilileri ile birlikte gördük. Gerekli görülen noktalar fotoğraflanarak satıcı MARUBENİ firmasına iletilmiştir.

Cihaz ve yardımcı ekipmanlarının montajının yapılacağı sahada tüm inşaat işleri üniversite bünyesinde yapılmıştır. Uygun şartlarda depolanmış az sayıda yardımcı ekipmanların montajları ise yurt dışı üretici firma planları doğrultusunda yapılmıştır. Hasarlı cihazların dış alandan alınarak halen bulundukları alanlara taşınmasına kurumunuzun talebi doğrultusunda nezaret edilmiştir. Anılan malzemelerin sevkiyatı, ithalatı, depolanması ve teslimi ile ilgili hiç bir bilginiz yoktur. Cihazlar hasarlı olduğundan elektriksiz son bağlantıları yapılmamıştır.

02.07.2012

Sayı : HAC.0.70.01.00/410-2636

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın BEYAZ Teknik Yapı Sistemleri Sanayi ve Tic. Ltd.Sti.,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipman alımı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Konu ile ilgili olarak tanık sıfatıyla ifadenize başvurulacağından 13.07.2012 günü saat 14:00'da hazır bulunmanızı rica ederim.



Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı

PROJE BİLGİLERİ

PROJENİN ADI : Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 2.Etap Projesi

UYGULAYICI KURULUŞ : Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

TOPLAM PROJE MALİYETİ : 39 Milyon USD.

FİNANSMAN İHTİYACI :

A) İç :

B) Dış : 28 Milyon USD.

YATIRIM PROGRAMI BİLGİLERİ :

A) 2001 Yılı Yatırım Programında

Yer Alıp Almadığı : Evet

B) Yer Alıyor ise 2001 Yıllık Yatırım

Programındaki Yeri :

• Proje Numarası :

• Resmi Gazete'de yer aldığı
Sayfa Numarası

PROJENİN AMACI : Türkiye'ye tam donanımlı bir Kanser Merkezi kazandırarak , yurt dışına gidişleri azaltmak ve bu konuda uzman açığını kapatmak.

FİZİBİLİTE RAPOR BİLGİLERİ :

A) Fizibilite raporu hazırlanıp hazırlanmadığı : Hazırlandı. DPT ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na verildi.(21.07.1999)

B) Hazırlanıyor ise hangi aşamada olduğu :

PROJE GERÇEKLEŞTİRME SÜRESİ : 2001 yılı sonu veya 2002 yılı başları

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER : Makine-Teçhizatla ilgili ihale 21.02.2001 tarihinde yapılmıştır.

PROJE İÇİN AYRILAN ÖDENEK :

SON DURUM VE GÖRÜŞLER :
(DPT Görüşü dahil)

UYGULAYICI KURULUŞUN

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NDAN TALEBİ :

PROJE İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ YÜRÜTEN BİRİM :

(İsim, Telefon, Faks) 1-Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

2-Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Başhekimliği
Prof.Dr.M.Tezer KUTLUK Onkoloji Hastanesi Başhekimini
Fax : 309 29 12 Tel : 305 29 10-305 29 31



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SERMAYE GİDERLERİ
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: 0 (312) 305 1034-2333 - Faks: 0 (312) 311 4390
E-posta: imidb@hacettepe.edu.tr
www.imidbhacettepe.edu.tr

Sayı: B.30.2.HAC.0.73.03.00/

Ek-43

REKTÖRLÜK MAKAMI'NA

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslararası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere Marubeni Europe Plc. firmasından **USD.12.316.800.- ve EUR.16.000.000.** bedelle satın almasına karar verilen **"171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman"** tanımlı malzemelerden **USD.4.302.853,00** tutarındaki kısımlarının ithalatları tamamlanmış olan 2 Adet Lineer Akseleratör (S.No 150) 1 Adet Bilgisayarlı tedavi planlama sistemi (S.No.153) 1 Adet Dozimetri sistemleri (S.No.154) 1 Adet Brakiterapi sistemi, yüksek doz hızlı (S.No.155) 1 Adet Radyoterapi amaçlı network sistemi (S.No.156) tanımlı sıra numaraları ve adetleri verilen sözleşme ekindeki liste kapsamı cihazların montajları ve deneme işlemleri tamamlanmıştır.

Söz konusu cihazların Muayene ve kabul işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda adı soyadı ve görev ünvanı yazılı kişilerin görevlendirilmeleri hususunda olurlarınızı saygılarımla arz ederim.


Ecz. M. Nejat ERTÜRK
İdari ve Mali İşl. Dai. Bşk.

UYGUNDUR

09/12/2010

Prof. Dr. Uğur ERDENER
REKTÖR

Prof. Dr. Şuayib YALÇIN
Onkoloji Hastanesi Başhekim
Prof. Dr. Fadıl AKYOL
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Macit ARIYÜREK
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Meral KİRAZLI
Onkoloji Hastanesi Müdürü
Demet YILDIZ
Medikal Fizik Uzmanı

Marubeni
America Corporation

For Account And Risk Of:
HACETTEPE UNIVERSITY RECTORATE
ANKARA -TURKEY

End Destination:
HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU
ANKARA-TURKEY

Invoice No.: EXIM30042008

Date / Datum: 30th April 2008

Our Reference: HU-APR-08-EXIM

LC Number: 49700575

EXIM BANK GUARANTEE NO. APO81558XX - TURKEY

Shipped from: NORFOLK VIRGINIA,
USA

Mode of Transport:
OCEAN CONTAINER

Contract No:

Contract Date: 02.08.2001

In respect of the above-referenced Contract signed on 02.08.2001
We hereby request you to pay the following sum to us

CORRESPONDING TO PARTIAL SHIPMENT OUT OF
SUPPLY CONTRACT DATED AUGUST 2, 2001 FOR 171 ITEMS OF MACHINERY,
MATERIAL AND EQUIPMENT. (THE "CONTRACT")

Acquisition List No.	HU Master File Item No.	Item Code	Description (English)	Qty	Model	No. of pcs	USD
16 X	150	TRP1	Linear accelerator Made in U.S.A.	2	Clinac dhx high performance	44	2,551,020.00
16 X	153	TRP4	Treatment planning system Made in U.S.A.	1	Eclipse Dx Tps	4	397,959.00
16 X	155	TRP6	Brachtherapy system, high level dosing Made in Denmark	1	Gammamed Plus- Hdr	2	306,122.00
Total CIP-ANKARA						50	3,255,101.00

USD TOTAL

3,255,101 USD

AMOUNT PAYABLE (UNDER LC No. 49700575)


2,766,835.85 USD

[= 85% x 3,255,101.00 USD]

CASH PAYMENT OF 15% HAS BEEN RECEIVED AND DEDUCTED FROM THE GROSS
INVOICE VALUE

Invoiced item(s) appear on the acquisition list approved by EXIM Bank

For and on behalf of
Marubeni America Corporation


Transportation Machinery Unit

Marubeni Europe plc Düsseldorf Branch



IMMERMANNSTR. 45
DEUTSCH-JAPANISCHES
CENTER
40210 DÜSSELDORF

Postfach 10 36 64
40027 DÜSSELDORF
TEL-NR. (0211) 3671-0
TELEFAX (0211) 3671-325
Internet: www.europe.marubeni.com

MARUBENI EUROPE PLC - Postfach 10 36 64 - 40027 DÜSSELDORF

For Account And Risk Of: HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU ANKARA-TURKEY		Invoice No. / Rechnung Nr.: FE120707 Date / Datum: 13.07.2007 Our Reference: HU-JUL-07-HERMES-I	
End Destination: HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU ANKARA-TURKEY		LC Number: 01156AKR44749	
Shipped from/Verschiffung von: Moenchengladbach, Germany	Mode of Transport: Truck	Contract No./Vertrags Nr.:	Contract Date / Vertrags Datum: 02.08.2001

In respect of the above-referenced Contract signed on 02.08.2001

WE HEREBY request you to pay the following sum to us

CORRESPONDING TO PARTIAL SHIPMENT OUT OF
74 ITEMS OF MACHINERY, MATERIAL AND EQUIPMENT. CIP ANKARA TURKEY

Item List No.	Item Code	Description (English)	Qty	Model	Euro (€)	US\$	Euro Counter-value (for Customs purposes only)
X 7	SER7	PCL EMERGENCY TROLLEYS	7	PCL	10,360.00		10,360.00
X 43	YOB9	PCL EMERGENCY TROLLEYS	1	PCL	1,480.00		1,480.00
61	KPT16	AUTOMATIC PIPETTE SET	6	RESEARCH	15,930.00		15,930.00
74	KAB6	AUTOMATIC PIPETTE SET	3	RESEARCH	11,151.00		11,151.00
X 138	KIU3	PCL EMERGENCY TROLLEYS	2	PCL	2,960.00		2,960.00
X 154	TRP5	DOSIMETER	1	3-D WATER PHANTOM		767,140.00	569,731.86
X 156	TRP7	NETWORK SYSTEM FOR RADIOTHERAPY	1	ARIA		280,612.00	208,402.11
TOTAL					41,881.00	1,047,752.00	820,014.97

EURO TOTAL

US\$ TOTAL

41,881.00 Euro

1,047,752.00 US\$

TOTAL (EURO COUNTER-VALUE) for Customs purposes only

820,014.97 Euro

[Applied rate = 1.3465]

AMOUNT PAYABLE (UNDER LC No. 01156AKR44749)

[= 85% x 41,881.00 Euro]

[= 85% x 1,047,752.00 US\$]

35,598.85 Euro + 890,589.20 US\$

For and on behalf of
Marubeni Europe plc

[Authorized Signature]

London (Headquarters)
Marubeni Europe plc
120 Moorgate
London
EC2M 6SS
UK

Hamburg Branch
Marubeni Europe plc
Stadthausbrücke 7
20355 Hamburg
Germany

Berlin Office
Marubeni Europe plc
Bomholmer Strasse 7
10439 Berlin
Germany

Bankverbindungen:

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.
IBAN: DE64 3001 0700 0000 0150 81
SWIFT Code: BOTK DE33
Konto-Nr.: 511-015 081 (BLZ 300 107 00)

Deutsche Bank AG
IBAN: DE94 3007 0010 0319 4701 00
SWIFT Code: DEUT 3333
Konto-Nr.: 3 194 701 (BLZ 300 700 10)

Registrierungsgericht Düsseldorf, HRB 37614
Geschäftsführer: Mr. Hiroshi Sakamoto

UST-ID-Nr.: DE 811 357 225

Paris Branch
Marubeni Europe plc
5, Boulevard de la Madeleine
75001 Paris
France

Milan Branch
Marubeni Europe plc
Viale Della Liberazione 18
20124 Milan
Italy

Stockholm Branch
Marubeni Europe plc
Kungsgatan 33, (8th floor)
SE-111 56 Stockholm
Sweden



TRP-6

S.No 155

Ek-44

Sayı: B.30.2.HAC.0.73.03.00/

MUAYENE VE KABUL PROTOKOLÜ

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslar arası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere Marubeni Europe Plc. firmasından USD.12.316.800. ve EUR.16.000.000. bedelle satın almasına karar verilen "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman" tanımlı malzemelerden ithalatı tamamlanan USD.4.302.853,00 tutarındaki 2 Adet Lineer Akseleratör (S.No 150) 1 Adet Bilgisayarlı tedavi planlama sistemi (S.No.153) 1 Adet Dozimetri sistemleri (S.No.154) 1 Adet Brakiterapi sistemi, yüksek doz hızlı (S.No.155) 1 Adet Radyoterapi amaçlı network sistemi (S.No.156) tanımlı malzemelerin montaj ve deheme işlemi tamamlanmış olup, Geçici Muayene ve kabullerinin yapılması için cihazlar hazır hale getirilmiştir

İta Amirliği'nin 09.12.2010 tarih ve 09 sayılı onayları ile oluşturulan Komisyonumuz 13.12.2010 günü, saat 14.30'de toplanarak söz konusu malzemelerin ilgili sözleşme, şartname ve eklerinde gösterilen nitelik ve miktarda eksiksiz ve kusursuz olarak hazır olduğunu, montajlarının yapılarak cihazların tüm fonksiyonları ile çalışır durumda teslim edildiğinden Geçici Muayene ve Kabulünün yapılmasına karar vermiştir.

Bedeli : USD.4.302.853,00

Firması : Marubeni Europe Plc. Dusseldorf Branch

Malzeme Adı : 2 Adet Lineer Akseleratör (S.No 150) 1 Adet Bilgisayarlı tedavi planlama sistemi (S.No.153) 1 Adet Dozimetri sistemleri (S.No.154) 1 Adet Brakiterapi sistemi, yüksek doz hızlı (S.No.155) 1 Adet Radyoterapi amaçlı network sistemi (S.No.156)

Komisyon Başkanı
Prof.Dr.Şuayib YALCIN
Onkoloji Hastanesi Müdürü

Uzman Üye
Prof.Dr.Fadıl AKYOL
Radyasyon Onk.A.B.D. Başkanı

Uzman Üye
Prof.Dr.Macit ARİYÜRÜK
Radyoloji Anabilim Dalı Bşk.

Üye
Meral KIRAZLI
Onkoloji Hastanesi Müdürü

Üye
Demet YILDIZ
Medikal Fizik UZMANI

EK-45

 Varian Medical Systems Haan GmbH
 Bergische Strasse 16
 42781 Haan
 GERMANY

Ship To: VH392

 Company
 Legacy Transportation System, Inc.
 935 McLaughlin Avenue
 San Jose CA 95122
 USA

Sold To: VH392

 Company
 VARIAN MEDICAL SYSTEMS
 INTERNATIONAL AG
 CHOLLERSTRASSE 38
 6303 ZUG
 SWITZERLAND

These commodities are licensed for ultimate destination: Switzerland				VAT No.	
Export License	Payment Terms	Varian Sales Order and Date entered		Customer Order Reference	
NLR	Net 30 days	319404751	17 September 2007	319402806	
Ship Method	Waybill	Contact Person & Tel. No.	No. of Boxes	Gross Weight	Net Weight
		41417498844	2	296 KG	275.790 KG
Marks		Unit Price Basis: excluding VAT			
NORMAL / REGULAR		Incoterms: DDP			
		Currency: USD			
Item	Part Number and Product Description	QUANTITY			
		Ordered	Previously Delivered	This Invoice	Due
	Item 100 is packed in a wooden crate 92x70x134cm 188kg Items 200, 600, 700, 900, 1000, 1100 1200, 1300 and 1400 are packed in a cardboard box on a palette 120x80x95cm 108kg All other items (810, 820 and 830) are in a separate shipment direct from Charlottesville				
100	GM11019540 GMplus Basic Unit 230V, Series IX	1.00	0.00	1.00	0.00
200	GM11019670 Language Kit GMplus, English, ROW, IX	1.00	0.00	1.00	0.00
600	GM11001320 Notbehälter kpl.	1.00	0.00	1.00	0.00
700	GM15000820 Installations-Satz HDR, GMplus	1.00	0.00	1.00	0.00
810	VBT-MISC SRV022 Bronze level 4 source supply	2.00	0.00	2.00	0.00
820	VBT-MISC OV21 Prostate kit-Flexiguide	1.00	0.00	1.00	0.00
830	VBT-MISC OV12 Well chamber and electrometer	1.00	0.00	1.00	0.00

 Bank: Dresdner Bank Wuppertal
 Account No: 5054370
 Bank Code: 33080030
 IBAN: DE18330800300505437000
 S.W.I.F.T.: DRESDEFF332

 These commodities, technology or software are subject to the Export
 Administration Regulations of the USA and EU. Diversion contrary to
 these regulations is prohibited. In case of re-export to a country
 in or outside the EU an export license might be necessary.

 This transaction is subject to and includes the Terms and Conditions
 of Sale (including jurisdiction clause).

Varian Medical Systems Haan GmbH
 Bergische Strasse 16
 42781 Haan
 GERMANY

Ship To: VH392

 Company
 Legacy Transportation System, Inc.
 935 McLaughlin Avenue
 San Jose CA 95122
 USA

Sold To: VH392

 Company
 VARIAN MEDICAL SYSTEMS
 INTERNATIONAL AG
 CHOLLERSTRASSE 38
 8303 ZUG
 SWITZERLAND

These commodities are licensed for ultimate destination: Switzerland				VAT No.	
Export License	Payment Terms	Varian Sales Order and Date entered		Customer Order Reference	
NLR	Net 30 days	319404751 17 September 2007		319402808	
Ship Method	Waybill	Contact Person & Tel No.	No. of Boxes	Gross Weight	Net Weight
		41417498844	2	296 KG	276.790 KG
Marks		Unit Price Basis, excluding VAT			
NORMAL / REGULAR		Incoterms: DDP			
		Currency: USD			
Item	Part Number and Product Description	QUANTITY			
		Ordered	Previously Delivered	This Invoice	Due
900	GM11004550 EndometAppl. 320 SET Batch No. H23	1.00	0.00	1.00	0.00
1000	GM11000730 Fletcher flex.3K Set Batch No. H25	1.00	0.00	1.00	0.00
1100	GM11004140 Vag.-Appl. Satz CT Batch No. H35	1.00	0.00	1.00	0.00
1200	GM11004040 Zervix-Appl. Set CT Batch No. H32	1.00	0.00	1.00	0.00
1300	GM11008210 Zubehör GYN + HNO GM + Batch No. H39	1.00	0.00	1.00	0.00
1400	GM11008720 Schritt- und Weglängenprüfgerät + AFS	1.00	0.00	1.00	0.00

 Bank: Dresdner Bank Wuppertal
 Account No: 6054370
 Bank Code: 33080030
 IBAN: DE18330800300505437000
 S.W.I.F.T.: DRESDEFF332

These commodities, technology or software are subject to the Export Administration Regulations of the USA and EU. Diversion contrary to these regulations is prohibited. In case of re-export to a country in or outside the EU an export license might be necessary.

This transaction is subject to and includes the Terms and Conditions of Sale (including jurisdiction clause).

**HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TIBBİ CİHAZ İHALESİ
BRAKİTERAPİ SİSTEMİ, YÜKSEK DOZ HIZLI
TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ
155 (İtem TRP 6)**

12. Değişik lokalizasyon metotları Ortogonal, Semiortogonal ve isosentrik olarak uygulanabilmektedir.
(Abacus User Manuel pp 146- 154)
13. BPS sistemi doz dağılımlarını üç boyutlu renkli grafiklerle göstermektedir.
14. BPS CT görüntü üzerine 3 boyutlu doz dağılımlarını organların ve hedefinin konturları ile göstermektedir.
(Bkz. ABAS broşür Abacus)
15. BPS sistemi sadece brakiterapi planlamalarında kullanılacak bir konsol ile yapılacaktır*. Bu konuda detaylı açıklama aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

ÖNEMLİ NOT :

Bu ihalede muhtelif Firmalara teklif vermiş bulunmaktayız. Alınacak cihaz marka ve modellerine göre BPS hardware donanımında farklı bir uygulamamız söz konusudur.

- *Eğer sadece Gammamed AL alınırsa içinde ABACUS yazılımı verilecektir. Bu sistemde ABACUS verileri floppy veya direk kablo bağlantısı ile Gammawin (Gammamed) sistemine aktarılır.*
- *Eğer tüm MDS NORDION ürünleri (TPPlus+Gammamed) bizden satın alınırsa ve bu sistemler LANATIS R&V sistemi üstünde haberleşirse, böyle bir dağılımda sadece TPPlus sistemine bir adet Brakiterapi için Konsol ayrılacak ve bağlanacaktır. Böylece bölümünüzdeki NETWORK kullanılarak TPPlus (ABACUS) sisteminden Gammamed Cihazına (Gammawin aracılığı ile) yapılan plan verileri Network üstünden direk olarak aktarılacaktır. Bu bizim en önemli üstün özelliklerimizden biridir.*

16. Yüksek doz Afterloading sistemi (HDR) Brakiterapi planlama sistemi (BPS) aşağıdaki ünitelerden oluşmuştur.
 - a. Radyasyon kaynağı ve Transfer sitemi
 - b. Kontrol ünitesi
 - c. Tedavi ünitesi
 - d. Radyasyon kaynağı
 - e. Aplikatör
 - f. Aksesuarlar
 - g. Brakiterapi planlama sistemi

MEDİTEL

Proje No: 2001 Turkey
Tel: (0 312) 425 64 22

MEDİTEL Limited- İstanbul tarafından hazırlanmıştır.

3 / 14

meditel
MEDİKAL TEKNİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
ANKARA BÜROSU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TIBBİ CİHAZ İHALESİ
BRAKİTERAPİ SİSTEMİ, YÜKSEK DOZ HIZLI
TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ
155 (İtem TRP 6)

AKSESUARLAR

1. Yüksek dozda kısa süreli seanslarla günlük yüksek hasta kapasitesine sahip yüksek doz afterloading cihazının operatör ve hastanın şua korunma gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak interlock (teyidli kitlenim) sistemi ile donatılmıştır
2. Sistem gerekli radyasyon alan dedektörleri alarm tertibatları ile donatılmış olarak verilecektir.
3. 1 adet Well Type Chamber (kuyu tipi iyon odası) kalibrasyon sertifikası ile beraber verilecektir.
(Bkz. *Aplicators At A Glance / Accesories*)
4. Bir adet kaynak konum kontrol cetveli (Source step viwer) verilecektir
(Bkz. *Aplicators At A Glance*)
5. Farklı boyuttaki aplikatörleri ölçmek için ölçüm cetveli verilecektir.
6. Farklı katater ve aplikatörler için filmde aplikatör ayrışmasını kolaylaştıracak sahte kaynaklar (dummy) verilecektir.
7. Hastanın kumanda odasında izlenimi için kapalı devre televizyonu ve çift yönlü iletişim sağlayan ses tertibatı verilecektir.
8. Farklı kaynak lokalizasyonlarını farklı katater boylarını kontrol etmek amacıyla arasına film konulabilen bir pozisyon kontrol fantomu verilmektedir.
(Bkz. *Aplicators At A Glance / Accessories – ITS reconstruction cross beam*)
9. Air kerma ölçümlerinde kullanılmak üzere farklı iyon odası pozisyonlandırılabilen bir adet fantom verilecektir.
(Bkz. *Aplicators At A Glance / Accessories – Calibration track Air kerma rate*)

ERZURUM İHALESİ

Project No: 4201 Turkey
Tel: (0312) 425 64 22

MEDİTEL Limited- İstanbul tarafından hazırlanmıştır.

9 / 14

 **meditel**
MEDİTEL TEKNİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
ANKARA BÜROSU

Ek-47

T.C.
Hacettepe Üniversitesi
Onkoloji Hastanesi

Sayı : 39

Tarih : 06/02/2009

MUAYENE KOMİSYON RAPORU

12.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine dair yönetmelik 30/04/2008 tarih ve 91 sayılı siparişle MARUBENİ EUROPE PLC firmasından 30042008 no'lu faturada cins miktarı yazılı 4 kalem malzeme Komisyonumuzca muayene edilmiş olup, şartname sipariş niteliklerine uygundur.

KOMİSYON BAŞKANI
Prof. Dr. Şuayip YALÇIN
Onkoloji Hastanesi Başhekimisi

ÜYE
Ertuğrul KALE
Onkoloji Hastanesi Müdürü

ÜYE
Meral KIRAZLI
Onkoloji Hast.Md.Yrd

22.07.2008


TUTANAK

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne dış kredi ile alınan Makine Ekipman ve Malzemelerin onuncu yükleme - "TRP-1, TRP-4 ve TRP-6" VOSS - VARIAN, MDS NORDION CİHAZLARI) muhtelif ebatlarda 50 (Elb) adet (Kap) koli kapalı olarak Sistem Lojistik Ambarı'na teslim edilmiştir.

Teslim Eden
İncekara A.Ş.
Proje Asistanı
Özgür ÇİVİ



Teslim Alan
Hacettepe Onkoloji Hastanesi
Hastane Müdürü
Ertuğrul KALE



İNCEKARA TEKNİK CİHAZLAR ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

25. Sok. No: 16 N. Akar Mah. Balgat 06520 Ankara | Tel: (312) 295 25 25 | Faks: (312) 295 25 00 | incekara@incekara.com.tr
Vergi Dairesi: Başkent | Vergi No: 477 001 2937 | Ticaret Sicil No: ATO 26658 | T. İş Bankası, Başkent Kurumsal Şb. 4399-5493
| Ankara | İstanbul | İzmir | Adana | Antalya | Diyarbakır | Bursa |

| www.incekara.com.tr |

İNCEKARA

01.08/14-e-01

SÖZLEŞME

13 ARA 2001

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında Uluslararası ihale yoluyla tamamı dış kredili olmak üzere anahtar teslimi olarak ithal yoluyla satın alınacak 171 kalem makine, ekipman ve Malzeme için iş bu sözleşme bir tarafta bundan böyle "İdare" diye adlandırılacak olan HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA, TÜRKİYE ile diğer taraftan bundan böyle "Satıcı" diye adlandırılacak olan MARUBENİ EUROPE Plc DUSSELDORF ŞUBESİ ALMANYA arasında ...2...8...2001... tarihinde aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.

MADDE 1 - İŞİN KONUSU VE KAPSAMI :

- 1.1. Bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan idari ve teknik şartnamelerde belirtilen şartlara uygun olarak Satıcı :
- a) Ek-1 de teknik spesifikasyonları belirtilen ve bundan böyle "Malzeme" olarak anılacak olan 171 KALEM MAKİNE, MALZEME VE GEREKLİ EKİPMAN, yedek parçalarını ve ek cihazlarını şartnamelerindeki ve Ek-1'de gösterilen miktarlarda temin ederek İdarenin cihaz mahalli olarak öngördüğü yere (bundan böyle "Mahal" olarak anılacaktır.) nakledecek ve bu yerde montajı yapılmış halde hazır teslim edecek,
 - b) Malzemenin Mahalinde montaj, işletmeye alma ve muayeneye hazırlama işlemlerini yapacak,
 - c) Madde 14 ve 16'da belirtildiği şekilde Malzeme ile ilgili garanti ve bakım işlemlerini yapacak,
 - d) Madde 15'de belirtilen şartlara uygun olarak Malzeme ile ilgili gerekli eğitim hizmetlerini sağlayacaktır.
- 1.2. Bunlara karşılık İdare:
- a) Sözleşme konusu Malzemeyi Satıcı'dan satın alarak kabul edecek,
 - b) Teknik şartnamelerde belirtilen ve Malzemenin Satıcı tarafından Mahaline yerleştirilmesini sağlayacak Madde 11 de belirtilen hazırlıkları yapacak,
 - c) Malzemenin Türkiye'ye ithali ile ilgili olarak İdare tarafından yapılması gerekli her türlü yazışma, müsaade ve gümrük işlemlerini yapacak.

MADDE 2 - İŞİN TUTARI :

Satıcı bu sözleşmede, sözleşmenin eklerinde ve şartnamelerinde belirtilen şartlar, nitelik ve miktarlardaki Malzemenin temini ve teslimini, montajını, denemesini, kullanılır (işler) hale getirmesini ve şartnamelerde belirtilen diğer hizmetleri toplam CIF.USD.12.316.800 (oniki milyon üçyüzonaltı bin sekizyüz ABD Doları) ve CIF.EURO.16.000.000 (onaltı milyon Euro) bedelle vermeyi taahhüt eder. Bu bedel sözleşmede bundan böyle "Sözleşme Bedeli" olarak anılacaktır. Sözleşme Bedeli işin başlamasından bitirilmesine kadar sabit kalacaktır.

MADDE 3 - TESLİM SÜRESİ VE ŞARTLARI :

- 3.1. Sözleşme konusu Malzemeler Satıcı MARUBENİ EUROPE plc Düsseldorf ALMANYA ve Satıcı tarafından taşarın olarak tayin edilen MARUBENİ AMERICA CORPORATION Head Office, Lexington Ave. New York, NY 10017-3904 ABD tarafından İdareye teslim edilecektir.

MARUBENİ

Project No: 4111-Turkey
Tel: 10.312

MARUBENI AMERICA CORPORATION Satıcı MARUBENI EUROPE plc tarafından taşarın olarak tayin edilmiş ABD firması olup ABD'den temin edilecek Malzemelerle ilgili olarak satış, ihracat, sevkiyat yapma ve satılan malların bedellerini tahsil etmeye yetkili kılınmıştır.

- 3.2. Satıcı bu sözleşmeyle ilgili geçerli Akreditif(ler)in muhabir bankaca Satıcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren başlamak üzere sözleşmenin Ek-2 kısmında yer alan teslim zaman cetvelinde teslim edileceği tesbit edilen miktarlar ve niteliklerdeki Malzemeyi Mahaline ulaştırarak teslim edecektir.
- 3.3. Teslim süresi ,Malzemenin Mahaline nakli, yerine yerleştirilmesi, gerekiyorsa montajı, kullanılır hale getirilmesi, kabul işlemlerinin yapılarak İdare tarafından teslim alınmasına kadar geçen süreyi kapsar. Bu sürelerin neler ve ne kadar olduğu ve toplam teslim süresi Ek-2'deki zaman cetvelinde gösterildiği gibidir. Malzemenin Türkiye'deki gümrüklere girişi ile gümrüklerden çekilişi arasındaki süre teslim süresine eklenecektir.
- 3.4. Satıcı, Madde 4.1'deki süre uzatımı gerektiren haller dışından İdarenin yazılı izni olmadan Ek-2'deki sürelerin uzatılmasını talep edemez .
- 3.5. Satıcı belirlenen teslim sürelerine uymaz ve Malzemenin Madde 4.1. de belirtilen uzatım halleri dışında teslimini geciktirirse, İdare gecikilen süreler için Madde 13'te gösterilen cezai hükümleri uygular.
- 3.6. Teslim tarihi, Malzemenin Geçici Kabul Heyetince kabul edilip, Kabul Protokolünün düzenlendiği tarihtir.

MADDE 4 – MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI :

- 4.1. Taraflar aşağıda belirtilen hallerin vukuu bulmasını mücbir sebepler olarak gösterip bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin bekletilmesini veya geciktirilmesini talep edebilirler.
 - a) İdarenin sebebiyet verdiği haller,
 - b) Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesinde işte bir gerileme veya gecikme olması,
 - c) Ambargo ve kanuni grev vukuu bulması gibi durumlar,
 - d) Bulaşıcı hastalık vukuu bulması
 - e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi
 - f) Sözleşmenin yerine getirilmesini engelleyen veya geciktiren hükümet kararlarının ortaya çıkması
 - g) Nakliye engelleri
- 4.2. Yukarıda belirtilen hallerin meydana gelmesinden itibaren taraflar en geç 15 (onbeş) gün içerisinde İdare'ye Madde 4.3. de belirtildiği şekilde yazılı olarak başvurarak süre uzatımı talebinde bulunabilir.
- 4.3. Taraflar, süre uzatımı talebine ait yazılı müracaatı ile birlikte mücbir sebeplere ait belgelerini de teslim edeceklerdir. Mücbir sebeplere ait delil ve belgeler, mücbir sebebin Türkiye'de meydana gelmesi halinde o mahallin en büyük mülkiyetini, Türkiye dışında meydana gelmesi halinde ise o ülkedeki Türk temsilciliğine tasdik ettirilmiş olacaktır.



MARUBENI

Project No: 4201 Turkey
Tel: (0.312) 420 54 22

4.4. Mücbir sebeplerin başlamasını takiben birbirini izleyen 6 (altı) ay sonunda halen mücbir sebebin devam etmesi halinde taraflar birbirlerini yazılı olarak haberdar etmek koşulu ile (başka bir şekilde anlaşma yapılmamışsa) bu sözleşmeyi sona erdirebilirler. Sözleşmenin bu şekilde sona erdirilmesi halinde Satıcı'nın o tarihe kadar teslim ettiği Malzemelerin veya tamamladığı hizmetlerin bedeli İdare tarafından ödenir. Şayet Satıcı'ya daha önce yapılan ödemeler yukarıda belirtilen Malzeme ve hizmetlerin bedelini aşıyorsa bu durumda aradaki fark Satıcı tarafından derhal İdare'ye geri ödenecektir.

MADDE 5 – ÖDEME ŞARTLARI :

%100 Dış kredili olup, ödeme T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile kredi veren banka ya da ilgili Satıcı firma arasında akdedilecek kredi anlaşması çerçevesinde Satıcının ekli nihai teklif mektubunda her kalem için belirtildiği üzere ABD Doları ve EURO para birimi cinsinden teslimatlara orantılı olarak yapılacaktır.

MADDE 6 – KATI TEMİNAT :

Satıcı bu işle ilgili olarak İdare'ye Sözleşme Bedelinin % 6 (yüzde altı) 'sı tutarında ve Satıcının ülkesindeki muteber bir Bankanın kontur garantisine istinaden Türkiye'de muteber bir Banka tarafından düzenlenmiş şartsız ve süresiz kati teminat mektubu verecektir. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan sonra 2886 sayılı Kanunun 56'ncı maddesindeki hükümlere göre ve 12 Maddede belirtilen Kabul İşlemleri tamamlandıktan sonra kesin teminat geri verilir.

MADDE 7 - NAKLİYAT VE AMBALAJLAMA :

7.1. Nakliyat :

a) Satıcı Malzemeyi Kara, Deniz ve Hava yoluyla nakledecektir. Malzemenin teslim yeri Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, Ankara, Türkiye'dir. Malzemenin üretildiği fabrikadan başlamak üzere, nakledilip kara, deniz ve hava liman ve yollarından taşınarak teslim yerine ulaştırılmasından ve bu güzergahtaki her türlü harcamalardan Satıcı sorumludur.

b) Satıcı teslim süresi ve şartlarına ait zaman cetvelini dikkate alarak Malzemenin, süresi içerisinde Mahalinde olmasını sağlayacak şekilde işlemlerini eksiksiz olarak yapmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve nakliyatın süresini herhangi bir gecikmeye yol açmayacak şekilde dikkate almak zorundadır. Satıcı bu işlemlerle ilgili İdare'den talep edeceği bilgi ve belgeleri Malzemenin naklinden önce İdare'ye bildirecektir. İdare bunları herhangi bir gecikmeye mahal vermeyecek şekilde Satıcıya verecektir.

c) Satıcı Malzemenin muhtemel nakledilme tarihini en az 1 (bir) hafta önce aşağıdaki bilgilerin İdareye fax veya telex ile ulaşmasını sağlayacaktır.

- i- Yükleme ve nakil tarihi
- ii- Nakledilen Malzemelerle ilgili özet liste
- iii- Nakledilen paket veya ünite sayısı
- iv- Paket veya ünitelerin ihtiva ettiği Malzemeler ve fiyatları



Atatürk

Project No: 4201 Turkey
Tel: 00.312 423 10 20

v- Nakledilen Malzemenin Ankara'da olacağı muhtemel tarih

7.2. Ambalajlama :

- a) Satıcı, Malzemeleri yukarıda belirtilen sevkiyat tarzına uygun uluslararası standartlara göre ambalaj yaparak nakledecektir. Nakliyat için standartlara uygun orijinal paketler kullanılacak, bu paketlerin ölçüleri zorunlu haller dışında Mahaline kadar taşımayı engellemeyecek boyutlarda olacaktır.
- b) Malzeme nakledildiği güzergah, indirme, bindirme, ara depolama ve farklı araçlarla taşıma koşullarında, bütün hava şartlarında hasara, korozyona, darbe ve deformasyona karşı korunacak bir biçimde ambalajlanmış olacaktır. Bu ambalajlar Malzemenin gerektiğinde dört ay süreyle açık alanda depolanması durumunda hava koşullarından herhangi bir şekilde etkilenmesine meydan vermeyecek nitelikte olacaktır.
- c) Malzemenin nakli için kullanılan paketlerin dışında gerekli bilgilerin yanısıra Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi -Ankara TÜRKİYE ibaresi bulunacaktır. Her pakette ekli olarak paketin muhteviyatı bir liste halinde su geçirmez bir zarf içerisinde pakete bağlanmış olacaktır. Muhteviyat listesinde sevk faturasına tamamen uygun bir şekilde kolilerin içinde bulunan Malzemelerin ismi, kod numaraları ve miktarları belirtilecektir.
- d) Nakliyat ve ambalajlama hatasından meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyan Satıcı'ya aittir.

MADDE 8 – RİSKLER VE SİGORTA :

- 8.1. Malzemenin İdareye teslimine kadar maruz kalınacak bütün risklerden Satıcı sorumludur. Satıcı hak ve risklerin devrinden sonra vereceği hizmetler sırasında Malzemeye karşı kendi sorumluluğundaki gibi dikkatli ve titiz davranacak, Malzemenin Satıcı elemanlarınca kontrol, ayarlama ve işletilmesi gibi durumlarda arıza veya hasara meydan vermeyecektir.
- 8.2. Satıcı, Malzemenin teslimine kadar maruz kalınabilecek risklere karşı yükleme, taşıma, depolama, yerleştirme şartlarında doğabilecek her türlü riski kapsayacak biçimde Malzemenin tamamını itibarlı sigorta şirketleri nezdinde sigorta ettirecektir. Sigorta, bedeli Satıcı tarafından ödenecektir.

MADDE 9 – MASRAFLARIN KİME AİT OLDUĞU :

- 9.1. Satıcı tarafından ödenecek masraflar :
 - a) Sözleşmenin hazırlanması, yapılması ve tasdiki ile ilgili her türlü masraflar,
 - b) Menşe şahadetnamesi tasdik masrafları,
 - c) Satıcı'nın ülkesinde ödeyeceği gümrük, resim ve harçları,
 - d) Akreditif ile ilgili Satıcının memleketindeki bütün banka masrafları,
- 9.2. İdare tarafından karşılanacak masraflar :
 - a) Akreditif açılması ile ilgili yalnız Türkiye'de yapılacak masraflar,
 - b) Türkiye'de ödenecek her türlü gümrük, vergi, resim ve harçları.



MADDE 10 – ÖN DENEMELER VE MUAYENE

Malzeme üretildiği fabrikadan sevk edilmeden önce ön denemeler ve muayeneden geçirilmiş olacaktır. Satıcı veya üretici, bu deneme ve muayenelerde kendi standart testlerini uygulayacaktır. Bu durumda, Malzemenin sevkıyatı testlerin tamamlanmasını takiben yapılacak ancak test raporları ile Ön Deneme ve Muayene Protokolü İdareye gönderilecektir.

MADDE 11 – İŞ YERİNİN HAZIRLANMASI VE MONTAJI :

- 11.1. Malzemenin yerleştirileceği iş yerine montajı ve tüm üniteleri ile kullanılır duruma getirilmesi, masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı tarafından sağlanacaktır. Satıcı, bu sözleşmenin 18. Maddede belirtildiği şekilde yürürlüğe girmesinden sonra Malzemenin montajının yapılacağı mahal hakkında İdareden gerekli bilgi ve planları alarak iş yerinin hazırlanması ile ilgili çalışmalara başlayacak en geç üç hafta içerisinde çalışma programlarını İdareye verecektir.
- 11.2. Satıcı Malzemenin yerleştirileceği (monte edileceği) hacimlerde yapılması gerekli her türlü düzenleme (inşaat, tesisat ve elektrik işleri) ile ilgili planları çalışma programında gösterilen sürelerde hazırlayarak İdareye teslim edecek, bu plan ve projelerin onaylanmasını müteakip çalışmalara başlayacaktır.
- 11.3. İdare, Malzeme için gerekli olan elektrik, su, buhar gibi alt yapı hizmetlerini Malzemenin yerleştirileceği mahale kadar getirecek, bu mahalde montaj için gerekli her türlü elektrik ve mekanik çalışması Satıcı tarafından gerçekleştirilecektir.
- 11.4. Satıcı montaj mahallinde mevcut sistemlerin yetersiz kalması durumunda, Malzemenin monte edileceği hacminde işletmeye uygun ortam şartlarının oluşturulmasını da kendisi temin edecektir. Malzemenin düzenli ve aksaksız çalışmasının temin edilmesi için gerekli ortam şartlarının sağlanması Satıcının sorumluluğudur.
- 11.5. İşyerinin hazırlanmasını müteakip Satıcı uzman elemanların marifetiyle Malzemenin bağlantılı bütün üniteleri ile birlikte yerlerine montajını yaparak kullanılır hale getirilmesini sağlayacaktır.
- 11.6. Montaj işlemi Malzemenin orijinal katalog bilgileri ve talimatları doğrultusunda, gerekli kontrolleri ve kalibrasyonu yapılarak tamamlanacaktır.
- 11.7. Montaj sırasında yapılacak herhangi bir yanlış işlem sonucu meydana gelebilecek bir arıza veya tahribat derhal giderilecek, bu nedenle oluşacak gecikme teslim süresinin uzatılması için sebep olarak dikkate alınmayacaktır.
- 11.8. Montaj işlemi sırasında İdarenin sorumluluğundaki bir işlemin zamanında yapılmaması sonucu doğabilecek gecikme, süre olarak teslim müddetine eklenecek, bu nedenle Satıcının hak kaybına meydan verilmeyecektir.



Bu satımın
bir maddesi.

ŞirketinProject No: 423 Turkey
Tel: (0312) 423 64 22

- 11.9. Montaj esnasında İdare Satıcının elemanlarına, temsilcilerine, acentasına ve taşarona montaj mahalline kolaylıkla girip çıkabilmeleri için gerekli kolaylıkları sağlayacaktır.
- 11.10. İdare malzemelerin montajı yapılanı kadar saklanabileceği depolamaya uygun Malzemelerin hava şartlarından etkilenmesini önleyecek emniyetli bir yer tahsis edecek. Ayrıca montaj elemanlarının ihtiyacı için gerekli tesisleri oluşturacaktır.

MADDE 12 – MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ :

- 12.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 91'nci maddesine istinaden çıkarılan 85/9453 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Muayene ve Kabul İşlemlerine ait Yönetmeliğin teslim edilen mal veya yapılan işin muayene ve Kabullerine ait hükümlerine istinaden malzemelerle ilgili muayene ve kabul işlemleri yapılacaktır..
- 12.2. Satıcı tarafından İdareye sunulan malı veya yapılan işin nitelik, numune ve aranacak diğer şartlara uygun olup olmadığı İdare tarafından oluşturulacak biri başkan olmak üzere en az üç kişilik muayene heyetleri tarafından yapılacaktır. Mal veya yapılan iş satıcı tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene olunmaz.
- 12.3. Kabul Heyeti Malzemenin kontrolü ve denemesi sırasında eksiklik ve/veya kusur nedeniyle Malzemenin kabulünü yapmazsa bu duruma yol açan eksiklikleri bir rapor halinde düzenleyerek en geç 10 (on) gün içerisinde Satıcıya tebliğ edilecektir. Satıcı en kısa sürede gerekli titizlik ve dikkatle bu eksiklik ve kusurları gidererek Malzemenin kabule hazır halde olduğunu tekrar yazı ile İdareye bildirecektir.
- 12.4. Satıcı, Kabul heyetince tespit edilen aksaklık ve kusurları gidermeden kabul için başvuruda bulunmayacaktır. Kabul Heyetince tamamlanması istenilen eksik ve kusurların giderilmesinde gecikilmesi ve bu suretle teslim süresinin aşılması halinde Madde 13'deki hükümlere göre hareket edilir.
- 12.5. Kabul Heyeti, Malzemenin çalıştırılmasını engellemeyecek ölçüde küçük ve eksik kusurlar bulunduğunda, bu eksiklik ve kusurları belirterek kabul protokolünü tanzim ve imza edebilir. Bu durumda Malzemenin kabulü yapılmış sayılır. Bu eksiklik ve kusurların en kısa sürede giderilmesi Satıcının taahhüdü altındadır.
- 12.6. Kabul işleminin tamamlanmasından sonra Malzeme tümüyle Satıcı firma sorumluluğunda deneme işletmesine alınacaktır. Deneme işletmesinin süresi kabul tarihinden itibaren 1 ay olup, bu süre içerisinde tüm Malzeme ve ekleri İdarenin elemanları tarafından normal günlük çalışma düzenine uygun olarak işletilecek, bu süre içerisinde Malzeme ile ilgili her türlü sorumluluk Satıcıya ait olacaktır.
- 12.7. Bir aylık deneme işletmesi sonucu Malzemedede önemli herhangi bir fonksiyon bozukluğu veya arızalı hal bulunmaması durumunda Malzeme İdarenin sorumluluğunda işletmeye alınmış olacaktır.
- 12.8. 1 aylık deneme işletmesinin sona ermesi ve işletmenin İdarenin sorumluluğun devrinden itibaren Malzemenin normal işletme süresi başlamış olacaktır. Bu süre içerisinde Satıcı, gerek işletmeye yardımcı gerekse bakım onarım ve kalibrasyon için Ek-3'deki esaslara göre teknik eleman desteği sağlayacaktır.

MADDE 13 – GECİKME VE CEZAI HÜKÜMLER :

- 13.1. Sözleşmenin 3.ncü maddesinde gösterilen şartlar uyarınca ve Ek-2'deki teslim zaman cetvelinde belirlenen sürelerde Malzemenin teslimi esastır. Zaman cetvelinde işin her aşaması için gösterilen sürelerde bu aşamanın tamamlanması sağlanacak, Madde 4'te yer alan mücbir sebeplere bağlı süre uzatımı dışında teslim sürelerinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir.
- 13.2. Satıcı, belirlenen teslim sürelerine uymaz ve Malzemenin teslimini geciktirirse, İdare gecikilen her gün için teslim edilmeyen kısım üzerinden sözleşme Bedelinin %0.1 (binde bir)'i kadar ceza tahakkuk ettirir. Gecikme cezalarının toplamı toplam Sözleşme bedelinin % 6 (Yüzde altı)'sını geçemez, geçtiği takdirde İdare sözleşmenin 19.ncu maddesine göre sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.
- 13.3. Madde 4 de belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla verilecek ilave süre dışında teslimde gecikme nedeniyle eğer ödeme şeklinde mevcut ise Akreditif süresinin uzatılmasına gerek hasıl olması halinde temdit masrafları Satıcı tarafından ödenir.
- 13.4. Malzemenin nakledilerek Mahaline getirilmiş olmasına karşın Satıcı tarafından işyerinin hazırlanmasının gecikmesi durumunda teslim süreleri ile ilgili hükümler aynen uygulanır. Malzemenin tesliminin işyerinin hazırlanmasında İdarenin sebebiyet verdiği gecikme süreleri teslim süresine cezasız olarak eklenir.

MADDE 14 – GARANTİ :

- 14.1. Satıcı, sözleşme ve ekleri ile bu işle ilgili şartnamelerde öngörülen ve Malzeme ile ilgili her türlü şartı yerine getireceğini aşağıdaki hususlarla birlikte garanti eder.
- a) Malzemenin üretilmesinde en gelişmiş teknoloji en kaliteli materyal ve en yüksek kalite kontrol parametreleri kullanacağını ve imalatı birinci sınıf işçilikle gerçekleştireceğini,
 - b) Malzemenin gerek üretilmesi gereksede kullanılması sırasında geçerli olacak her türlü uluslararası standartlara uygun bir imalat ürünü vereceğini,
 - c) Malzemenin kullanılmamış, yeni üretilmiş olacağını ve her türlü ek ve aksesuarları ile bir bütün olarak teslim edileceğini,
 - d) *Garanti ile ilgili* Malzemenin ekleri ve aksesuarları ile birlikte, kabul protokolünün imzalandığı tarihten itibaren 2 (İki) yıl süre ile (bundan böyle "Garanti Süresi" olarak anılacaktır) her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı Satıcının sorumluluğu ve garantisi altında olduğunu ,
 - e) Garanti süresinin bittiği tarihten itibaren Malzeme ile ilgili her türlü yedek parçayı 7 yıl süre ile sağlayacağını ve bedeli mukabili İdareye temin ve teslim edeceğini,
 - f) Malzemenin, normal işletme ve bakım şartlarında yerine getirilmesi halinde azami performans içerisinde bütün fonksiyonlarını eksiksiz olarak, Malzeme ömrü süresince yerine getireceğini,





Project No: 4281 Turkey
Tel: (0.312) 425 64 22

- g) Garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren, eğer İdare talep ederse, ayrı bir bakım sözleşmesi hükümlerine göre ve bedeli mukabili Malzemenin ömrü süresince teknik bakım hizmeti vereceğini,
- h) Malzemenin kullanımı süresince imalat ve kullanma tekniklerinde meydana gelebilecek gelişmelere bağlı olarak Malzemedede yapılabilecek her türlü değişikliklerin, Bedeli mukabilinde Malzemenin günün teknolojisine uygun hale getirilmesini teminen sağlanacağını,
- i) İdareye teslim edilen teknik dökümanın eksiksiz ve doğru bilgileri içereceğini,
- j) Satıcı yükümlülüklerini Türkiye 'de mahalli olarak yerine getirecek olan ve İdarenin başvurusu halinde her konu ve durumda Satıcı adına İdareye yardımcı olacak bir temsilci bulunduracağını ve bu temsilciyi değiştirmesi halinde yeni temsilcinin garanti hizmetlerini aynı biçimde devam ettireceğini taahhüt eder.
- 14.2. Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek üretim hatası ve kusurları ile işçilikten kaynaklanan arıza durumlarında Malzemenin çalıştırılmadığı sürelerde garanti süresi işletilmeyecektir. Bu nedenle garanti süresi sistemlerin çalışır halde doldurdıkları süre olarak kabul edilebilecek ve bu çalışırlık süresinin madde 14.1'deki süreye eşit olması esas kabul edilecektir.

MADDE 15 - EĞİTİM

- 15.1. Satıcı, zaman cetveline göre Ek-4 te belirtilen cihazın kullanım ve eğitim hizmetini İdarenin belirleyeceği personele en iyi şekilde verecektir.
- 15.2. Malzemelerin kullanım ve eğitimi ile ilgili Satıcının personelinin yol ve kalacak yere ait masrafları Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 16 – BAKIM VE ONARIM :

- 16.1. Satıcı, bu işle ilgili ve bu sözleşmenin eki olan Teknik Şartnamenin Genel Bakım ve Onarım bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak Ek-5'te gösterilen şartlara göre bakım ve onarım hizmeti verecektir.
- 16.2. Satıcı'nın sağlayacağı bakım ve onarım hizmetleri, garanti süresi içinde ve garanti sonrası olmak üzere iki kısımda mütalaa edilecektir.
- 16.3. Satıcı, bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için Ek-3'te belirtilen teknik eleman desteğini, yedek parça teminini ve diğer hususları İdarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek şekilde sağlayacağını taahhüt eder.
- 16.4. Montaj ve deneme işletmesi süresinde meydana gelebilecek her türlü arıza derhal Satıcı elemanlarınca giderilecek, Malzemedede meydana gelebilecek her türlü tahribat ve bozukluk onarılabilecek ya da yenilenerek giderilecek, sistemin bu tür tahribata uğramış kısımlarının geçici onarımla çalışır hale getirilmesi kabul edilmeyecektir.

**Ek-5**Project No: 4230 Turkey
Tel: (0.312) 423 04 82

MADDE 17- YEDEK PARÇA – AKSESUARLAR VE TEKNİK DÖKÜMANLAR

- 17.1. Satıcı bu sözleşmenin Ek -1'inde gösterilen yedek parçaları ve aksesuarları Malzeme ile birlikte verecektir.
- 17.2. Yedek parça olarak ücreti karşılığında alınan Malzemelerin, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde kullanılmaları durumunda Satıcı kullandığı yedek parçayı ücretsiz olarak İdareye teslim edecektir.
- 17.3. Satıcı, bu sözleşmede Ek-6'da belirtilen teknik dokümanı hazırlık çalışmaları amacıyla, montaj ve işletme hizmetleri ve yedek parçalarla ilgili olarak İdareye temin ve teslim edecektir. Satıcı, İdareye vereceği teknik dokümanla ilgili olarak Teknik Şartnamenin "Teknik Doküman" bölümünde yer alan şartlara da uygun hareket edecektir.

MADDE 18 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ :

- 18.1. Bu sözleşme, Madde 5.1. de belirtildiği üzere kreditor ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı arasında yapılacak kredi anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girer .
- 18.2. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içinde İdare Akreditif(ler)i açamazsa Satıcı sözleşmeyi fesh edebilir. Bu durumda İdare kat'i teminat mektubunu Satıcıya iade eder.

MADDE 19 – SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ :

Aşağıda belirtilen durumlarda İdare, sözleşmeyi sona erdirebilir.

- 19.1. Malzemenin teslim süresine göre gecikme 25 (yirmi beş) günü aşarsa,
- 19.2. Madde 12.5 de belirtilen haller dışında Satıcı, Kabul Komisyonunca tespit edilen eksiklik ve kusurları zamanında gidermez ve Malzemenin teslimi Madde 19.1'de belirtilen süre kadar gecikirse,
- 19.3. Sözleşme yapıldıktan sonra Madde 18.2 de belirtilen hal dışında Satıcının taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, İdarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde , ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

MADDE 20 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE İKİNCİ ELE VERME :

Satıcı, Bu maddede belirtilen Türkiye temsilcisi firma ve Madde 3 de belirtilen tasaron firma dışında İdarenin yazılı muvafakatını almadan sözleşme konusu işleri kısmen veya tamamen hiçbir veçhile herhangi bir şahıs veya kuruluşa devredemez. Ancak, Satıcının yükümlülüklerini ve/veya vecibelerini Türkiye'de mahalli olarak yerine getirmesine yardımcı olan Türkiye temsilcisi 25. SOKAK NO:16, N. AKAR MAH. BALGAT, ANKARA, 06520 adresinde mukim İNCEKARA TEKNİK CİHAZLAR ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş. Türkiye sınırları dahilinde Satıcının işbu sözleşme gereğince üstlendiği yükümlülükleri ve/veya vecibelerinde yardımcı olacağı kabul edilmiştir.



İnşaat Bakanlığı

Project No: 4281 Turkey
Tel: (0312) 428 14 22

MADDE 21 – İHTİLAFLARIN HALLİ :

İhtilafların halinde taraflar kendi aralarında uyuşmazlığa sulh yolu ile bir çözüm getirmezlerse, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Ankara Mahkemeleri çözüm mercii kabul edilecektir.

MADDE 22 – SÖZLEŞMENİN DİLİ VE BAĞLI OLUNACAK KANUN :

Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanır. Sözleşmede, şartnameler, tebligat, teknik doküman ve bu işle ilgili diğer vesikanın Türkçe metni geçerli metin olacak, sözleşmenin dili Türkçe olarak kabul edilecektir.

MADDE 23 – SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ PARÇALARI:

23.1. Aşağıdaki belgeler bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

- a) İdare'nin bu işle ilgili olarak hazırladığı teknik ve İdari Şartnameler ve ekleri,
- b) Satıcı'nın bu işle ilgili olarak İdare'ye verdiği ve İdare tarafından onaylanan teklif mektubu, ekleri ve sonradan yapılan değişiklikler

23.2. Sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi biri Madde 23.1 de sözü edilen sözleşme eklerindeki hükümlerle çatışır veya bu hükümleri geçersiz kılsa esas olan sözleşmedeki hüküm ve ifadelerdir.

MADDE 24 – YAZIŞMA :

Bu sözleşme gereğince veya ilgili olarak yapılacak bütün yazışmalar taraflar arasında telex, telefax veya taahhütlü uçak postası ile yapılacak ve aşağıdaki adresler yazışma adresi olacaktır.

İdarenin Adresi :

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

Ankara – TÜRKİYE

Telex : 42 237 htk tr

Tel : 0312-305 30 01

Telefax : 0312-310 55 52

Satıcının Adresi : MARUBENI EUROPE Plc.

Düsseldorf Branch

Immermannstrasse 45, Düsseldorf, 40210, Germany

TEL : 00 49 (211) 3671-261

FAX : (211) 3671-249

Marubeni Corporation Ankara Şubesi :

Turan Emeksiz Sok. Park Sitesi B-Blok, No:3/15

G.O.P. , Ankara, 06700

TEL : (312) 467 44 25


FAX : (312) 468 21 80

Türkiye Temsilcisi : İNCEKARA Teknik Cihazlar Endüstri ve Tic.A.Ş.

25.Sokak No: 16 N.Akar Mah.Balgat ANKARA 06520

TEL: (312) 295 25 25

FAX: (312) 295 25 00



Marubeni

Project No: 4201 Turkey
Tel: (0312) 475 54 22

Yukarıda belirtilen biçimde ve gösterilen adreslere taraflardan birinin göndereceği tebligat geçerli bir şekilde yapılmış kabul edilecektir. Taraflar adreslerinde meydana gelebilecek değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildireceklerdir.

MADDE 25 – EKLER :

Aşağıdaki ekler bu sözleşme maddelerinde gösterilen ek bilgiler olup sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçalarıdır.

25.1 Ek-1 : Malzeme ve yedek parçaları ile ek cihazların teknik spesifikasyonları ve miktarları.

25.2 Ek-2 : Teslim ve zaman cetveli.

25.3 Ek-3 : Montaj, deneme işletmesi, garanti süresi ve garanti sonrası dönemde Satıcının sağlayacağı teknik eleman ve nasıl hizmet vereceği.

25.4 Ek-4 : Eğitim

25.5 Ek-5 : Bakım ve onarım şartları.

25.6 Ek-6 : Teknik doküman (Teslim Zamanı verilecektir.)

İşbu sözleşme taraflar arasında .2.8.2001... tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.


İDARE
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Adına
Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
REKTÖR



SATICI
MARUBENI EUROPE plc
Düsseldorf Subesi
Marubeni Europe Plc
Düsseldorf Branch
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
HFB 83-2AR 690/90
Marubeni Europe Plc


Junichiro Minami
General Manager



**HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TIBBİ MAKİNA
TECHİZAT İHALESİNE AİT KREDİLİ YURTDIŞI SATIN ALMA (TEKNİK)
ŞARTNAMESİDİR**

A. GENEL HÜKÜMLER

1. İhale konusu makina ve cihazlar, sistemde bulunması zorunlu bütün üniteleriyle birlikte yüklenici firma tarafından Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesine kurulacak, makina ve cihazlar istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde çalışır halde teslim edilecektir.
2. Makinaların ihtiyacı olan elektrik, su, buhar gibi altyapı hizmetleri hastanelerde mevcut merkezi sistemden karşılanacak, makina ve cihazların monte edileceği en yakın noktalardan gerekli bağlantıların yapılması imkanı verilecektir.
3. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde mevcut merkezi sistemlerde Elektrik trifaze; 380V AC/50Hz, monofaze; 220V AC/50Hz'dir. Su (ham veya tasfiye) 6Kg/cm² işletme basıncında ve istenilen debide bulunmaktadır. Teklif veren firmaların, makinalar için bu işletme şartlarına uymaları gerekmektedir.
4. Satın alınmasına karar verilen makina ve cihaz üreticileri, siparişi müteakip en geç 2 (iki) hafta içerisinde çalışma programlarını İdare'ye vereceklerdir. Makinaların montajı, İdare'nin belirlediği zaman ve koşullar ile yapılacaktır.
5. Yüklenici firma, sistemlerin kurulacağı hacimlerde yapılması gerekli her türlü düzenleme (inşaat, tesisat ve elektrik) ile ilgili planları hazırlayarak Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına teslim edecek, sistemlerin kurulacağı mahallere elektrik, su, buhar vs. altyapı hizmetlerinin getirilmesi Üniversite teknik birimlerince deruhte edilecektir. Makina ve cihazların monte edileceği hacimlerin mimari plana göre tadil edilerek düzenlenmesi ve bu mahalde montaj için gerekli her türlü elektrik, ve mekanik sistemlerin temini yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
6. Hastane altyapı tesislerine ilaveten cihazların kurulacağı mahallin havalandırılması ve soğutulması gerekli görüldüğünde; yüklenici firma havalandırma ve soğutma cihazlarını ve sistemin kendisini temin ve tesis edecektir.


B. VAZGEÇİLMEZ TEMEL ŞARTLAR

1. En yüksek kalitede sistemler teklif edilecektir.
Üretici firmalar, imalatlarını sürdürdükleri, makina ve cihazların kendi teknik şartnamelerinde yer alan asgari teknik şartlara uygun en yüksek kalitedeki sistemlerini teklif edeceklerdir. İmalattan kaldırılan veya eski tekniklerle imal edilmiş sistemler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Makinaların tasarımı, en yüksek hasta kapasitesine erişilebilecek şekilde yapılmış olmalıdır. İstenilen sistemlerin asgari teknik vasıflarını içeren teknik şartname koşullarına aynen uyulacaktır. Daha yüksek vasıftaki sistemler teklif edilebilir.

Marubeni

2. Standartlaşmaya önem verilecektir.
Teklifler, cihazların tipleri, kullanımları ve aksesuarları bakımından standart oluşturmaya önem verilerek hazırlanmalıdır. Aynı amaçlı makina ve cihazlar için farklı tipteki sistemler teklif edilmemelidir. Farklı kullanım için teklif edilen cihazların birbirlerine uyumlu olması, komünike edebilir olması değerlendirmede önem kazanacaktır. Sistemlerin alt birimlerinin aynı tipte olmasına dikkat edilecektir.
3. Gelecekteki gelişmelerin uygulanabileceği makina ve cihazlar teklif edilecektir.
Makinaların tasarımları gelecekteki tıbbi tatbikatların uygulanabileceği nitelikte olmalıdır. Şu anda geliştirme safhasında olan teknikler ve nitelikler, teklif edilen sistemlere sonradan uygulanabilmelidir. Özellikle yazılım güncelleştirmelerinin ücretsiz temini değerlendirmede dikkate alınacaktır. Bu husus tekliflerde açıkça belirtilecektir.
4. Tek İmalatçı ve tek mesuliyet taahhüt edilecektir.
Firmalar teklif ettikleri her sistem ve aksesuarından tam mesuldurlar. Kendi imalatları dışında olup tekliflerine dahil ettikleri aksesuar ve yardımcı cihazlardan da tam olarak mesul olacaklardır.
5. Cihazlar, Ana bilgisayar sistemine bağlanabilir özellikte olacaktır.
Teklif edilen cihazların Hastane işletim sistemine ve PACS (Picture Archiving Communication System) bağlanabilirliği değerlendirilmede dikkate alınacaktır. Bilgisayar destekli cihazların ana bilgisayar sistemine bağlanması için gerekli olan yazılım ve donanım ara yüz birimleri cihazlarla birlikte verilecektir. Firma teklif edilecek görüntüleme cihazlarının software versiyon ve relase numaralarını tekliflerinde belirtmek zorundadır. Ayrıca cihazlara ait DICOM Conformance Statement'ları tekliflerine eklemelidirler.
6. Cihazlar, Uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır.
Teklif edilen cihazlar uluslararası kabul görmüş Kalite standart belgelerine (ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV gibi) sahip olmalıdır. Bu belgeler tekliflere eklenmelidir.
7. 7 (yedi) yıl süre ile yedek parça temini taahhüt edilecektir.
Tekliflerde, teklif edilen her ünitenin garanti süresi bitiminden itibaren en az 7 (yedi) yıl müddetle tüm parçalarının ücreti mukabil tedarik edileceği açıkça belirtilecektir.
8. Teknik Servis İstasyonu kurulacaktır.
Teklifi üzerinde kalan firma, İdare'nin tespit edeceği cihaz grupları için teklif ettikleri cihazların garanti süreleri boyunca Hastanede yerleşik en az bir Mühendis ve bir Teknisyenden oluşmuş bir teknik servis istasyonu kuracaklardır. Bu personel firmanın sağladığı tüm cihazlar ile ilgili, gerekli tüm arıza, bakım ve destek fonksiyonlarını sağlayacaktır.



Marubeni

Project No: 4201 Turkey
Tel: (0.312) 425 64 22

C. MAKİNA VE CİHAZLARIN TEMİN, MONTAJ VE KABUL İŞLEMLERİ

1. Gümrüklerden İdare tarafından çekilecek olan cihazların yerel nakliye, sigorta ve personel masrafları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
2. Özel ve hassas makinalar, Ankara'ya sevk edilmeden önce üretici firmanın fabrikasında tümü ile monte edilip çalıştırılacak (premontaj), ayarları yapılacak ve spesifikasyonları ölçülecektir. Gerekğinde yüklenici firma, idarece belirlenecek yetkilinin üreticinin fabrikasına gidip çalışır durumdaki makinaları kontrol etmesini sağlayacaktır. Bu sistemler mümkün olan en büyük parçalarına ayrılıp Ankara'ya sevk edilecektir.
3. Makinaları oluşturan ünitelerin monte edileceği mahallerin montaja hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü plan ve proje çalışması, ünitelerin yerlerine montajı, sistem içinde diğer üniteler ile olan her türlü bağlantılarının yapılarak çalışır hale getirilmesi, yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.
4. Makina ve cihazların montaj sonrası denemeleri yapılacak ve İdare'nin yetkili kılacağı bir Kabul Heyeti, sistemlerin çalışır halde geçici kabul işlemlerini yapacaktır.
5. Kabul Heyeti sistemlerin eksiksiz ve kusursuz şekilde çalışır halde olduğunu bir protokolle tespit ettikten sonra, sistemler tümüyle yüklenici firma sorumluluğunda deneme işletmesine alınacaktır.
6. Deneme işletmesinin süresi, kabul tarihinden itibaren 1 (bir) ay olup, bu süre içerisinde tüm cihaz ve aletler ilgili doktor ve teknik elemanlar tarafından normal günlük çalışma düzenine uygun olarak ve yüklenici firmanın yetkili elemanları nezaretinde işletilecek, bu süre içerisinde cihazlarla ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
7. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan arıza hallerinde, bedeli İdarece karşılanmak koşuluyla firma genel bakım onarım şartlarına uygun olarak söz konusu arızaları beklemeeksizin giderecektir.
8. Firmalar, sistemlerin işletmeye alınmasından sonra garanti süresi içinde ve garanti süresi sonrasında işletme sorunlarına yardımcı olmak ve arıza hallerinde gerekli onarımı yapmak üzere, kaç adet ve hangi eğitim seviyesinde teknik elemanı, ne kadar süre ile Üniversitenin hizmetinde bulunduracağını açıkça teklifinde belirtecektir.
9. Garanti süresi sonunda Makina ve cihazlarda herhangi bir arıza ya da eksiklik bulunmadığı tespit edildikten ve bu durum Hastane Kabul Heyetince zabıtlı saptandıktan sonra, Makina ve cihazların kesin kabulü yapılacaktır. İmzalanan zabıt firmaya teslim edilecektir.



Project No: 4201 Turkey
Tel: (0.312) 425 64 22

D. GARANTİ SÜRESİ

1. Makina ve cihazlarla, bu makinaların alt üniteleri, fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiş olacaklardır. İdare, makina ve teçhizatın en kısa süre içinde işletmeye alınması için gerekli şartların sağlanması için özen gösterecektir.
2. Firmalar tekliflerinde bütün sistemler için garanti sürelerini ayrı ayrı belirteceklerdir. Sistem ünitelerinden herhangi birinin, özel nedenlerle dahi olsa, sistemin tümünden daha kısa süre ile garanti edilmesi hali dikkate alınmayacak, bu ünite için de genel garanti süresi esas alınacaktır.
3. Teklif veren firmalar, garanti süresince sistemin çalışırılığını sağlamak bakımından ne gibi teknik servis imkanları sağlayacaklarını tekliflerinde ayrıntılı olarak belirteceklerdir.
4. Garanti süresi sonunda yapılacak sözleşme ile bakım gereken cihazlar için garanti sonrası ilk 4 (dört) ve ikinci 4 (dört) yıllık bakım – onarım teklifleri de genel teklife eklenecektir. Teklifler parça dahil ve parça hariç olarak belirtilecektir. Belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

E. EĞİTİM

1. Firmalar, ihale konusu makina ve cihazların Üniversite tarafından en iyi şekilde işletilebilmesi için hangi eğitim düzeyinde ve mesleki kariyerde kaç adet elemanın hangi seviyede ve ne süre ile eğitime tabi tutulacağını tekliflerinde belirteceklerdir.
2. Cihazlar monte edilip çalıştırıldıktan sonra, her sistem için müteahhas uygulayıcı elemanlar firma tarafından getirilecek ve İdarenin elemanları ile birlikte bir süre çalışacaklardır. Gelecek eleman sayısı ve elemanların kalacakları süreler, firmalar tarafından tekliflerde belirtilecektir.
3. Kurulacak sistemlerin aksaksız çalışmalarını sağlamak üzere firmanın montaj sonrası görevlendireceği teknik elemanlarla birlikte çalışmak üzere İdarenin görevlendireceği teknik elemanların kalibrasyon konusunda eğitime tabi tutularak yetiştirilmesi şarttır. Söz konusu elemanların nerede, ne süre ile ve ne şartlarla eğitim vereceklerini tekliflerinde belirtmiş olmalıdır.



Marubeni

Project No: 4201 Turkey
Tel: (0.312) 425 64 22

F. YEDEK PARÇA, MALZEME VE AKSESUARLAR

1. Her makina ve cihaz için gerekli yedek parça listesi, yedek parçanın cinsi, katalog numarası, miktarı, birim fiyatları döviz cinsinden tek tek belirlenerek, liste halinde hazırlanıp teklif mektubuna eklenecektir.
2. Normal işletme ömürleri günlük kullanma sürelerine bağlı olarak belirli bir saatle sınırlı olan (örneğin filtreler, lambalar, vs.) cihazların yedekleri, bu sürelerle bağlı olarak tespit edilecek miktarlarda verilecek, bu husus tekliflerde açıkça belirtilmiş olacaktır.
3. Yedek parça olarak ücreti karşılığında alınan malzemelerin, makina ve cihazların garanti süresi içerisinde fabrikasyon hatası ile arızalanması halinde, firma yedek parçanın yenisini ücretsiz olarak göndermeyi taahhüt edecektir.
4. Teklif veren firmalar makinalarla birlikte verecekleri aksesuarları tekliflerinde belirteceklerdir. Bu listelerde cins ve miktar açıkça belirtilmiş olacaktır.
5. Montaj ve bakım ile ilgili her türlü ölçü, kalibrasyon ve ayar alet ve düzeneklerini temin etmek yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır. Bu aletler firmanın malı olacak ve idare hiçbir ödemede bulunmayacaktır.

G. TEKNİK DÖKÜMAN

1. Yüklenici firma şu dokümanları cihazla birlikte teslim etmek zorundadır:
 - a) Cihazların kurulacağı mahallin mimari planları (İdare tarafından verilecek) dikkate alınarak hazırlanacak;
 - * Genel yerleşim planı,
 - * Makine cihaz montaj yeri planı
 - * Su, elektrik, buhar vs. tesisat planları ve bu maksatla kullanılacak diğer planlar 2 (iki) takım halinde verilecektir.
 - b) Cihaz ve sistemlerin detaylı çalışma prensipleri, teknik özelliklerini ihtiva eden katalogları 2 (iki)'şer takım.
 - c) Cihaz ve sistemlerin montaj ve işletme katalogları, sistemin bütünü ve her cihaz için ayrı ayrı olmak üzere 1 (bir) takım.
 - d) Sistem ve cihazlarda muhtemel arızalarda başvurulacak arıza teşhis ve onarım, kalibrasyon katalogları, gerekli yedek parça ve katalog numaraları ile birlikte 1 (bir) takım.
2. Satın alınacak sistemler ile verilecek bu plan, (tercihen blok diyagramı) katalog, yazılı talimat İngilizce ve varsa Türkçe olarak iki dilde hazırlanmış olacaktır.
3. Yüklenici firmanın bu dokümanla birlikte cihazların ve sistemin daha iyi kullanılabilmesi ve farklı fonksiyonlarından istifade edilebilmesine yönelik eğitici ve öğretici kitap, broşür ve dokümanı da vermesi gereklidir.




Marubeni

Project No: 4201 Turkey
Tel: (0.312) 425 44 22

PERİYODİK BAKIM VE KALİBRASYON, GENEL BAKIM VE ONARIM

1. İhaleye iştirak eden firmaların montaj sonrası garanti süresi içerisinde ve garanti süresi sonrası nasıl bir bakım ve onarım hizmetini, hangi elemanlarla (Madde B/6'ya uygun olarak) ve ne şartlarla vermeyi taahhüt ettiğini teklif ekinde ayrıntılı bir şekilde belirtmeleri zorunludur.
2. Teklif veren firmalar, garanti ve bakım-onarım hizmetleri ile ilgili taahhütlerini Türkiye'de hangi firma vasıtasıyla ve ne şekilde yerine getireceklerini belirtecekler, bu firmanın teknik servis imkanlarını belirleyen ve kanıtlayan belgeleri ekleyeceklerdir.
3. Firmalar, bakım-onarım ve sair teknik servis verecek temsilci firmalarıyla ilişkilerinin sona ermesi halinde bu hizmetlerin ve yedek parça teminin hangi şekilde ve ne şartlarla sürdürüleceğini belirleyecekler ve bu hususları taahhüt edeceklerdir.
4. Teklif veren firmalar garanti süresinin sonrasında geçerli olmak üzere ilk 4 (dört) ve ikinci 4 (dört) yıllık süreler için ayrı ayrı hazırlanmış periyodik bakım, onarım, kalibrasyon ve yedek parça temini hususlarında sözleşme önerilerini sunacaklar, bu öneriler ve Üniversite'nin ekleyeceği koşullardan oluşan bir bakım onarım sözleşmesi, mevcut yasalara uygun yöntemlerle imzalanacak, periyodik bakım onarım hizmetleri bu sözleşme hükümlerine göre sürdürülecektir.



Marubeni

Project No: 4201 Turkey
Tel: (0.312) 425 64 22

**HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TIBBİ MAKİNA
TECHİZAT İHALESİNE AİT ULUSLARARASI DIŞ KREDİLİ SATIN
ALMA İDARİ ŞARTNAMESİDİR**

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV'İ VE MİKTARI

Madde 1- Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin ihtiyacı olan ve teknik şartnamelerde işin niteliği ve nev'i yazılı, ekli listede dökümü görülen tıbbi cihaz, ekipman, makina ve teçhizat, anahtar teslimi olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesi (p) fıkrası gereğince pazarlık usulü ile, tamamı dış kredili, (CIF) Ankara teslim şekline göre satın alınacaktır.

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

Madde 2- İhale "21 Şubat 2001" çarşamba günü saat "10.30" da Hacettepe Üniversitesi, Sıhhiye - ANKARA, adresindeki Rektörlük Hizmet Binası İhale Salonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin teklif zarflarını en geç "21 Şubat 2001" günü saat 10:15'e kadar İhale Komisyon Başkanlığı'na makbuz karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

Madde 3- İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki şartlara haiz olduklarını belgelemek zorundadırlar;

A- Kanuni ikametgahı olması,

B- Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

C- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi;

- a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası ve esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsoloshuğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir).
- c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- İmza sirküleri vermesi;

- a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri
- b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsoloshuğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir).

- c) Ortak girişim olması halinde, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
- d) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılacakların ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)
- E- Geçici Teminat Mektubu vermesi; Geçici teminat mektubu, firmaların teklif edecekleri bedelin, %3 'ünden (yüzde üç) az olmamak koşulu ile, Madde 6'da özellikleri belirtilen teminat mektubuna uygun olmak zorundadır.
- F- İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun Ortak Girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır)
- G- Teklif edilen her kalem için, "Teknik Şartnameye Cevap Belgesi" verilecektir. Firmalar; teklif ettikleri cihazların özelliklerini teknik şartnamedeki karşılık gelen maddelere göre mukayeseli olarak cevaplayacak, varsa üstün niteliklerini belirtecek ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik edeceklerdir. Şartnameye cevaplar evet/hayır formunda olmayacaktır.
- H- Proformalar, (4) dört nüsha halinde CIF Ankara olarak verilecektir. Proformalarda her bir kalem ayrı olarak fiyatlandırılacaktır. Teklifler, Amerikan Doları (US\$) ve/veya Euro (€) cinsinden fiyatlandırılacaktır. Şayet orijinal proforma fatura yabancı dilde ise Noter tarafından tasdikli (4) adet Türkçe tercümesi de birlikte verilecektir. Proforma üzerinde teklif edilen cihazların montaj ve eğitim masraflarının teklif edilen fiyata dahil olduğu ibaresi yer almalıdır. Verilen teklifin en az 1 (bir) sene geçerli olduğu ibaresi proforma fatura üzerinde belirtilmelidir. Garanti süresinin en az 2 (iki) sene olduğu proforma fatura üzerinde belirtilmelidir.
- I- Noter tasdikli temsilcilik belgesi ve tercümesini vermesi,
- J- Teklif edilen tıbbi cihaz ve aletler hakkında eksiksiz bilgi verecek doküman, katalog, prospektüs verilecektir.
- K- Üniversite idaresinden temin edilen ve her sayfası teklifi veren firma tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş İdari ve Teknik şartnameleri vermesi,
- L- Teklif veren firmaların teklif ettikleri sistemlerin;
- a) En son teknoloji ile üretildiğine dair,
- b) Teklif edilmiş bulunan sistem veya cihazın en son model olduğuna dair,
- c) Hangi cihazların veya sistemlerin hangi ülkede üretildiğine ve hangi ülkenin hava, kara veya deniz limanından ve/veya Serbest Bölgeden yükleneceğinin açık bir şekilde ve tek tek cihaz bazında liste halinde belirtileceği Türkçe veya Türkçe'ye tercüme ettirilmiş noter tasdikli belgelerin "Deklarasyon" adı altında dosyaya konması,

M- Teklif edilen cihazların halen hangi ülkelerde, nerelerde kullanıldığına dair, referans listesi vermesi gerekmektedir.

N- İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri cihaz bedellerinin tamamını karşılayacak şekilde yabancı ülke ve kurumlarından veya uluslararası kredi kuruluşlarından sağlanan ve ihale şartnamelerine aykırı hükümler taşımayan bir dış kredi niyet mektubu getirmek zorundadır. Söz konusu kredi Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi adına olacaktır. Kredi niyet mektubu, krediyi veren kuruluş tarafından hazırlanmalı ve imza edilmelidir. Kredi niyet mektuplarının geçerlilik süreleri proforma faturalarının geçerlilik süreleriyle uyumlu olmalıdır. Niyet mektubunda faiz oranları ile diğer tüm komisyon masrafları belirtilmelidir. Kredi şartları, Hazine Müsteşarlığınca uygun görüldükten sonra sözleşme yürürlüğe girecektir. Dış Finansman sağlayamayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

O- Alet ve cihazlara ait uluslararası kabul görmüş kalite standart belgelerinin verilmesi (ISO, VDE, FDA, IEC, TUC, CE sertifikaları gibi)

P- Teklif veren firmalar, teklif verdikleri her kalem için ayrı ayrı olmak üzere ayrıntılı konfigürasyon ve aksesuarları belirten fiyatsız proformaları verecektir.

R- Cihazlar için gerekecek yedek parçalar kalem kalem katalog numaraları ile birlikte döviz bazında fiyatlandırılmış olarak gösterilecektir. Bu fiyatlar cihaz birim fiyatına dahil edilmeyecektir. Bu fiyatların ilk akreditifin açıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olduğu belirtilecektir.

S- Tekliflerde mümkün olduğu takdirde tıbbi cihazların net ağırlıkları ve ambalajlı hacimleri belirtilmelidir. Tekliflerde tıbbi cihazların sevk tarihi belirtilecektir.

T- İhale Dosyası alma belgesi verilecektir.

U- Yer Görme Belgesi verilecektir. İstekliler ihalede teklif ettikleri cihazların boyut ve hacim olarak, mevcut binada belirlenen mevcut mahallere sığacağına dair taahhüt vereceklerdir. Belirtilen mahale sığmayan cihazlar değerlendirilmeyeceklerdir. İstekliler cihazların montajı esnasında olabilecek tüm tadilattan sorumludur.

Madde 4- Tıbbi cihazlar tek grup halinde ihaleye çıkarılmıştır. Katılımcı, grubu oluşturan tüm kalemlere teklif vermek zorundadır. İdare, grup içerisindeki kalem sayısını azaltıp artırabilir, değiştirme yapabilir veya kalemler için verilmiş alternatif teklifleri değerlendirebilir. İstekliler, teknik şartnamede istenilen şartları taşıması kaydı ile her kalem için bir asıl, iki alternatif en fazla 3 (üç) teklif verebilirler.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Madde 5- 2886 sayılı Kanunun 6.ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca firma ve yetkilileri hakkında kanuni işlem yapılır.

TEMİNAT MEKTUPLARI

Madde 6-

a- Geçici teminat miktarı, firmaların teklif edecekleri bedelin; Cihaz, aksesuar bedelleri dahil olmak üzere %3 ünden (yüzde üç) az olamaz. Az olması halinde teklif geçersiz sayılır. Teminat mektubu süresiz veya otomatik temditli ve yurtdışındaki bir bankanın kontr-garantisine bağlı olarak bir yerli banka tarafından veya T.C. Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankalar tarafından, işin adına düzenlenmiş olmalıdır.

b- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 27. Maddesi gereğince, ihale üzerinde kalan firmanın; kontr-garantili, otomatik temditli veya T.C. Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankalar tarafından, doğrudan "istekli" adına düzenlenmiş teminat mektubu vermesi zorunludur. (Temsilci veya mümessil adına olanlar kabul edilmez) Teminatlar ihale listesinde yer alan grubun tamamına kapsama sahiptir.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE 7- Teklifler aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır.

İç zarfın hazırlanması : İstekliler 3. Madde H fıkrasında belirtilen şekilde tanzim edilen proforma fatura ve tercümesini bir zarfın içine koyacaklardır. Bu zarf kapatılıp, kapatma yerleri istekliler tarafından imzalanıp kaşelendikten sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve "TEKLİF" ibaresi yazılacaktır.

Proforma fatura ayrı bir kapalı zarf içinde olmak kaydıyla diğer evraklarla birlikte zarflanacaktır. Bu kapalı zarf dışındaki evraklarda kesinlikle fiyat zikredilemeyecektir. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Uyuşmazlık halinde yazı ile zikredilen fiyat geçerlidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

Dış zarfın hazırlanması : Dış zarfın içerisinde 3.maddenin A,B,C,D,E,F,I,K,N,T ve U bendlerinde bulunan belgeler ayrı bir dosya halinde bulunacak şekilde konulacak, kapatılıp, kapatma yerleri istekliler tarafından imzalanıp kaşelendikten sonra zarfın üzerine isteklinin adı ve adresi ve "İDARİ" ibaresi yazılacaktır. Şartnamenin 3.maddesinin G,J,L,M,O,P,R ve S bendlerinde istenilen diğer belgeler ise ayrı bir paket halinde konulacak, kapatılıp kapatma yerleri istekli tarafından imza ve kaşelenecek, üzerine isteklinin adı ve adresi ve "TEKNİK" ibaresi yazılacaktır. TEKLİF zarfı, İDARİ dosya ve TEKNİK paket birlikte ambalajlanarak üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve hangi işe ait olduğu yazılacaktır.


Marubendi

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE 8- Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı soyadı veya ticari ünvanı ile açık adresi yazılmalıdır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz. Saat ayarında Posta Telgraf Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

TEKLİFLERİN AÇILMASI

MADDE 9- Teklifler 2. Maddede belirtilen yer, gün ve saatte İhale Komisyonunca isteklilerin ve bunların noter tasdikli vekaletnameye haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılacaktır. İstenilen belgeler ile Geçici teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektuplarını taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca bir işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. İhale zamanında hazır bulunmayan ve noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya bu şartnamenin 7.nci maddesine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

İDARENİN YETKİSİ

Madde 10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespit ve İdarenin lehine en uygun teklifi değerlendirerek kabul veya iptal etmekte serbesttir.

Teklif değerlendirme komisyonu; teklif edilen cihazların teknik şartname maddelerinde belirtilen tıbbi ve teknik özelliklere uygunluğunu, teklifi veren firmanın servis kapasitesi ve firmanın altyapısını gösteren referansları, firmanın hastane ile veya diğer kurumlarla olan taahhütlerini yerine getirmede gösterdiği performansı ve teknik şartnamede istenilen tüm hususları göz önüne alacaktır.

ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ

Madde 11- Teklifler Kabul edildikten (seçim yapıldıktan) sonra 2886 sayılı Kanunda yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.

İHALENİN ONAYI

Madde 12- İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde İta Amirlerince onaylanır veya iptal edilir.

İta Amirlerince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde üzerine ihale yapılabilecek veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğat adresine postalanacaktır. Mektupla tebliğ

tarihinin bilinmemesi veya tebliğin postaya verilmesini takip eden 7. (yedinci) günden sonra yapılması veya hiç yapılmaması hallerinde, mektubun postaya verilmesini takip eden 7. (yedinci) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır.

İhale kararlarının İta Amirlerince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilecektir.

İSTEKLİNİN YETKİSİ

Madde 13- İstekli, teklif verdikten sonra teklifinden geri dönemez. Ancak, 2886 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yazılı süre içinde idare sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmadığı takdirde, istekli, sürenin bitmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 10 (on) gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartı ile taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminatı geri verilir ve ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

TİCARİ SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT

Madde 14- İhale üzerinde kalan istekliden, ihale bedelinin % 6 sına (yüzde altı) tekabül eden miktarda kesin teminat alınır. Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde İstekli, karar tarihinden itibaren en fazla 15 (onbeş) iş gününü takiben, İta Amirlerince onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde sözleşmeyi idareye vermek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat gelir kaydedilir ve ayrıca 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uygulanır. İsteklice verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME TARİHİ

Madde 15- İşe başlama tarihi, İhale neticelenip T.C. Hazine Müsteşarlığınca kredi şartları kabul edildikten ve T.C. Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı vizeleri alındıktan ve gerekli onaylardan sonra durumun idare tarafından firmaya tebliği ile başlar. İş bitirme tarihi firmanın Üniversite ile karşılıklı anlaşmaya vardığı termin planına göre yürütülür.

SEVK VE SİGORTA ŞARTLARI

Madde 16- Siparişi alan firma, bütün cihazların sevkiyat sırasında hasar görmesine mani olacak şekilde hazırlanmamasından dolayı doğacak tüm hasarlardan ve bu hasarların giderilmesinden sorumlu olacaktır. Sevkiyatın gemi ile yapılması halinde, Malzeme geminin ambarında nakledilecektir. Ambalajların üzerine "Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, akreditif numarası, kg cinsinden net ve brüt ağırlıkları ile sevk konusu eşyanın niteliklerine uygun taşıma koşullarını gösterir Uluslararası işaretler" okunaklı ve bütün hava şartlarına karşı dayanıklı olarak yazılacaktır. Şartlar uygun olduğu takdirde taşıma ve sigorta işlemlerinin ulusal şirketlerce yapılmasına özen gösterilecektir.

YURT İÇİ SEVK VE SİGORTA İŞLEMLERİ

Madde 17- Sözleşme konusu malların CIF Ankara Gümrüğünden montaj mahalline kadar olan sigorta ve taşıma ücretleri İstekli firmaya ait olacaktır.

KESİN TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 18- Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan sonra, kesin teminat mektubunun % 50'si (yüzde ellisi) geçici kabulde, % 50'si (yüzde ellisi) ise kesin kabulde (garanti süresi sonu) iade edilecektir.

TESLİMAT VE MONTAJ

Madde 19-

- Yükleme, akreditifin muhabir bankaya transferinden sonra en geç 6 (altı) ay içinde tamamlanacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri dışında, malzemenin Teknik Şartnamesine uygun olarak fonksiyonel vaziyette eksiksiz olarak teslim edilmesinden meydana gelecek gecikmelerden, geçecek her gün için cihaz bedelinin % 0,1 (bindebir) nispetinde gecikme cezası kesilecektir. Gecikme cezası tutarı cihaz bedelinin % 6'sını (yüzde altı) geçemez. İdare, gecikme cezası yerine sözleşmeyi fesih etmekte serbesttir.
- Cihazların kurulacağı veya monte edileceği yer ve odaların belirlenmesi, su, elektrik, gaz bağlantılarının sağlanması hastane idaresince yapılacaktır. Şartnamelerde belirtiliyorsa montaj yeri firma tarafından hazırlanacaktır.
- Montaj sırasında işçilerin sigorta yönünden doğabilecek her türlü prim vs. haklara ait ödemeleri montajı yapan firmalara ait olacaktır.
- Gerek montaj sırasında ve gerekse garanti süresi içinde noksan, yanlış, fabrikasyon hatalı veya Teknik ve İdari Şartnamedeki hususlara uymadığı tespit edilen malzeme firmaya iade edilecek ve firma eksik veya uygun bulunmayan malzemeyi CIF esasına göre bedelsiz olarak idareye gönderecek, söz konusu eksik veya uygun bulunmayan malzemenin ithal işlemlerinden dolayı meydana gelecek her türlü masraf mümessil firma tarafından ödenecektir.
- Kesin teslimat işlemi; firmaların montaj işlemini bitirdiğini ve cihazın kusursuz çalıştığını Hastane İdaresine yazılı olarak bildirdikten sonra başlayacaktır.
- Kesin teslimat işlemi, idarenin belirleyeceği bir komisyon tarafından yapılacaktır. Muayene komisyonunda firma yetkilisi veya kanuni temsilcisi muayene gününde hazır olacaktır. Muayene komisyonu kesin teslimat işlemini teknik şartnamede belirtilen ve istenilen teknik özelliklerin tam olup olmadığına göre tamamlayacaktır ve bunu bir tutanakla tespit edecektir.
- Eksik veya kusuru bulunan özellikler tutanakla tespit edilerek, verilen süre içerisinde tamamlanması yazılı olarak firmaya tebliğ edilecektir. Verilen süre sonu gecikmelerinde 19'uncu maddenin (a) fıkrası hükümleri uygulanacaktır.
- Muayene komisyonunca cihazın ret edilmesi halinde, durum ilgili firmaya yazılı olarak tebliğ edilecektir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde firma veya kanuni vekili itirazda bulunabilir. Bu süre geçirildiği takdirde Muayene Komisyonunca hazırlanan rapor aynen kabul edilmiş sayılacaktır.
- Muayene sırasında kuruluş ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlar sonucu hasara uğrayan cihazın tazmin ve tesliminden satıcı firma sorumlu olacaktır.

- j) Satın alınan bütün cihazların test ve teslim muayenesi için gerekli personel ve aletler firma tarafından temin edilecektir.
- k) Kesin teslimat işleri Muayene Komisyonunca tamamlanan cihazların "Geçici Kabul" tutanakları Hastane yetkilileri tarafından imzalanacak ve firmaya teslim edilecektir.
- l) Gümrük ile ilgili tüm işlemler ve masraflar idareye aittir.
- m) Muayene ve kabul işlemlerinde 10.06.1985 tarih ve 18780 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Muayene ve Kabul işlemlerine ait Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

GARANTİ SÜRESİ, BAKIM ONARIM, EĞİTİM

Madde 20-

- a) Teknik şartnamede belirtilsin veya belirtilmesin cihazın bütünü ve her bir parçasının (tüp ve helyum dahil) üretici firma tarafından Madde 19'a göre işletmeye alındıktan itibaren 2 (iki) yıl süre ile bakım ve onarımının ücretsiz olarak yapılması kabul ve garanti edilecek, belgelenecek ve teklifle birlikte verilecektir. İki yıllık garanti süresi içerisinde Teknik ve İdari Şartnamede belirtilen ve cihazın bütünü veya her bir parçasına ait fabrikasyon hataları orijinal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- b) Firma garanti süresi içerisinde sabah 08:00 ile akşam 18:00 arası cihazları faal olarak çalışır halde tutacak ve % 95 çalıştırma garantisi verecektir. Garanti süresi içerisinde teknik serviste yetersiz kalınması ve yedek parça temininden dolayı meydana gelecek gecikmelerden firma sorumlu olacak ve kaybedilen süre garanti süresine eklenecektir.
- c) Teknik Şartnamede belirtilsin veya belirtilmesin iki yıllık garanti süresi sonrasında cihazları verimli olarak çalıştırmak için üretici firmalar veya kanuni temsilcileri ile bakım-onarım ve yedek parça temini için ücretli hizmet anlaşması yapılacaktır. Üretici firma veya Türkiye'deki kanuni temsilcisi değiştiğinde, yeni firmalar da bu yükümlülüğü üstlenecektir. Firmalar, değişikliği en geç 10 (on) gün içinde İdareye bildirecektir.
- d) İki yıllık garanti süresinden sonra başlamak üzere 20. c) maddesi hükümlerini sağlamayan üretici firma ve kanuni temsilcileri taahhütlerini yerine getirmemiş sayılarak 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince haklarında kanuni işlem yapılacaktır.
- e) Gerek montaj ve gerekse garanti süresi içerisinde cihazlarda arıza olduğu tespit edildiği takdirde firma veya kanuni temsilcisi arıza ihbarının alındığı tarihten itibaren 24 saat içerisinde İdareye müracaat edeceklerdir.
- f) Üretici firmalar, cihazları kullanacak olan ve İdarenin belirleyeceği Hekim, Mühendis ve diğer yardımcı personelin eğitimlerini sağlamak için Teknik Şartnamenin eğitim bölümünde belirtildiği üzere eğitim vermeyi taahhüt edeceklerdir.
- g) Manyetik Rezonans sistemlerinde, soğutucu gazlar (Helyum) garanti müddeti süresince firma tarafından ücretsiz temin edilecektir.



Maruboni

ÖDEMELERİN NASIL YAPILACAĞI

Madde 21- Kredi kuruluşunun firmaya yapacağı ön ödemeyi içeren ödeme planı, kredi sözleşmesi dahilinde tespit edilecektir.

TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI

Madde 22- Sözleşme yapıldıktan sonra, 2886 sayılı Kanunun 63'ncü maddesinde yazılı hükümler dışında İsteklinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 (on) gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca 2886 sayılı Kanunun 84'ncü maddesi uygulanır. Gelir kaydedilen kesin teminat İsteklinin borcuna mabsup edilemez.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ

Madde 23- İhalelerde;

- Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
- Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rahbeti kırarak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,
- İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek,
- Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek,
- Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar verecek işler yapmak,
- İşin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasak olup, bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı Kanunun 84 ve 85 inci maddelerindeki hükümlere göre işlem yapılır.
- Bu Şartnamenin ve yapılacak Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Ankara Mahkemelerince çözülür. Firmanın İdari ve Teknik Şartnamede veya teklifinde belirtilen hükümlere uymamasından doğabilecek zararların tazmini için İdare'nin tazminat açma hakkı saklıdır. Bu durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odaları ve diğer ilgili kurumlara bildirilecek, ilerdeki iş ilişkilerinde göz önünde bulundurulacaktır.

VERGİ, RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİ

Madde 24- İhale ve Sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün Vergi, Resim ve Harçlarla, Sözleşme giderleri İstekliye aittir. Ancak, Katma Değer Vergisi ve varsa Gümrük Vergileri İdare tarafından ödenecektir.



Marubeni

Project No: 4201 Turkey
Tel: (0.312) 425 64 22


DİĞER HÜKÜMLER

Madde 25-

- a) İdarece verilen akreditif sevk süresine, mahalli Türk Konsolosluklarınca belgelendirildiği takdirde, umumi ve kısmi seferberlik ile harp, yangın, grev gibi mücbir sebeplerin oluşması halinde istihsal ve sevkiyata müessir haller için temdit süresi verilebilecektir.
- b) Kısmi sevkiyat, aktarma ve sevk süresinin uzatılması Üniversitenin iznine tabidir.
- c) Her cihaz için teslim sırasında İngilizce kullanım kitabı (user's manuel), tam bakım ve onarım kitapları verilecektir. Bakım ve onarım kitapları (service manuel and maintance manuel) üretici firmaların kendi servis elemanları için hazırladıkları düzeyde ayrıntılı olacaktır.
- d) Teknik Şartnamenin fazladan getirdiği hükümler ayrıca geçerli ve bağlayıcıdır.
- e) Ticari kontratın yürürlüğe girmesi, kredi anlaşmasının yürürlüğe girmesine bağlıdır. Kredi anlaşmasının yürürlüğe girmesi ise Hazine Müsteşarlığı'nın nihai onayına bağlıdır.

Madde 26- Bu şartnamede yer almayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun genel hükümleri uygulanacaktır.

İşbu şartname 26 maddeden oluşmaktadır. Yazışma dili Türkçe'dir.



Marubeni

Project No: 4201 Turkey
Tel: (0.312) 425 64 22

EK-1 EK-3

Marubeni Corporation Japan
Dünyada 150 ofis ve bağlı şirketler

Tokyo Merkez
P.O. BOX CENTRAL 595 TOKYO

Osaka Merkez
P.O. BOX CENTRAL 1000 OSAKA

DDI TELEFON: LONDRA (020) – 7826

SANTRAL: (020) – 7826 600

FAKS: (020) – 7826 8611

Marubeni Europe plc
Marubeni Corporation Japan'in Bağlı Şirketi
RIVER PLATE HOUSE 7-11 FINSBURY CIRCUS LONDON EC2M 7AF

Kime: Weiss Klimatechnik GMBH, Greizer Str, 41-49, D-35447, Reiskirchen-Lindenstruth, Almanya

Sayın Ulrich Mandler,

11 Nisan 2007 tarihli (FE201155) tedarik sözleşmesi ("Tedarik Sözleşmesi")

İşbu yazı size Marubeni Europe PLC ("Marubeni") ve Hacettepe Üniversitesi (bizim "Nihai Müşteri"miz) tarafından birlikte gönderilmektedir.

Bu yazının Eki'nde belirtilen, Tedarik Sözleşmesi uyarınca sizin tarafınızdan Moenchengladbach, Almanya'da teslim edilen ürünler ("Ürünler")den bahsetmekteyiz.

Tedarik Sözleşmesi'nin "Garanti" hükmü uyarınca, Ürünler için iki buçuk yıllık garanti süresi ("Garanti Süresi") 26 Haziran 2007'de başlamıştır.

Ancak, Nihai Müşteri'nin alanında gerçekleşen belirli problemler dolayısıyla, Ürünler'in kurulumu henüz yapılmamıştır. Ürünler'in kurulumunun yapılmamasına rağmen, Son Müşteri'miz bu yazıya verdiği karşı imza ile 26 Haziran 2007'den beri Ürünler'in sağlam ve kuru bir ortamda diğer depolama talimatlarına uygun olarak saklandığını teyit eder.

Marubeni ve Nihai Müşteri'miz olarak 31 Aralık 2008 veya Nihai Müşteri'lerin teslim alma belgesi tarihlerinden hangisi önce geliyorsa o tarih itibarıyla iki yıl içerisinde sona ermek üzere Garanti Süresi'ni uzatmanızı dileriz.

Saygılarımla,
Steve Newton MEx
Genel Müdür
LDNMEBD

Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Profesör

M. Nejat Ertürk
[İdari ve Mali İşler Dai. Bşk]
[imza]

...
...
...
...
...

PK-2

MARUBENI CORPORATION JAPAN
155 OFFICES AND SUBSIDIARY COMPANIES
THROUGHOUT THE WORLD

TOKYO HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 595 TOKYO

OSAKA HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 1000 OSAKA



A SUBSIDIARY OF MARUBENI CORPORATION JAPAN

RIVER PLATE HOUSE 7-11 FINSBURY CIRCUS
LONDON EC2M 7AF

DDI TEL LONDON (020) - 7626 4444
SWITCHBOARD (020) - 7626 9600
FAX (020) - 7626 8611

To: Weiss Klimantechnik GMBH, Greizer Str. 41-49, D-35447, Reiskirchen-Lindenstruth,
Germany

Dear Mr Ulrich Mandler

Supply agreement dated 11th April 2007 (FE201155) (the "Supply Agreement")

This letter is sent to you jointly by Marubeni Europe plc ("Marubeni") and Hacettepe University
(our "End Customer").

We refer to those goods set out in the Schedule to this letter (the "Goods") that were delivered
by you to Moenchengladbach, Germany in accordance with the terms of the Supply
Agreement.

Accordance with clause "Warranty" of the Supply Agreement, the two years and a half years
warranty period (the "Warranty Period") for the Goods commenced on 26th June 2007.

However, due to certain problems at our End-Customer's site, the Goods have not yet been
installed. Notwithstanding the fact that the Goods have not yet been installed, by its counter
signature to this letter, our End-Customer confirms that the Goods have, since 26th June 2007,
been stored sure and dry and in compliance with any particular storage instructions.

Marubeni and our End Customer hereby respectfully request that you consider extending the
Warranty Period so that it would expire two years from 31st December 2008 or date of End
Customers taking over certificate, whichever comes earlier.

Yours sincerely

Steve Newton MEx
General Manager
LDNMEDB

Professor
Rector of Hacettepe University

Adnan W. Nizet, ERUPAK
Idari ve Mali İşler Dai Bşk

At: Hacettepe University
Rector's Office
Ankara


NETİCE VE TALEP:

Yukarıda izah edilenler ve ekte sunulan deliller uyarınca, karşı taraf Üniversite'nin delil tespitine dayanak gösterdiği tüm iddia ve beyanları kabul edilemez nitelikte olduğundan, Müvekkil Şirketin Sözleşme uyarınca tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve iddia edilen gecikme ve zararlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı hususlarını Sayın Mahkeme'nin ve Bilirkişi Heyeti'nin dikkatlerine sunarız.

Saygılarımızla,

Marubeni Europe PLC Vekilleri

Av. Togay Ülkü - Av. Nihan Kaya



EKLER:

1. 8 Ağustos 2007 tarihli teslim tutanağı;
2. Müvekkil Şirket'in Üniversite'ye göndermiş olduğu Cihaz'ın sevkiyatına ilişkin 14 Haziran 2007 tarihli bildirim yazısı;
3. Müvekkil Şirket ve Üniversite tarafından Tedarikçi'ye Gönderilen Yazı ve bunun Yeminli Tercüman Tasdikli Türkçe Çevirisi;
4. Tedarikçi'nin Müvekkil Şirket'e 16 Aralık 2009 tarihinde Gönderdiği Mektup;
5. Cihazın Kötü Koşullarda Saklandığını Gösteren Fotoğraflar;
6. Üniversite'nin Cihaz Montajını Talep Ettiği 23 Ocak 2012 tarihli Tutanak;
7. Müvekkil Şirket tarafından Üniversite'ye gönderilen 19 Nisan 2011 tarihli yazı ve bunun Yeminli Tercüman Tasdikli Türkçe Çevirisi;
8. Müvekkil Şirket tarafından Üniversite'ye Beşiktaş 11. Noterliği'nden gönderilen 1 Mart 2012 tarihli ve 10328 no'lu ihtarname;
9. Müvekkil Şirket tarafından Üniversite'ye Beşiktaş 11. Noterliği'nden gönderilen 2 Mart 2012 tarihli ve 10513 no'lu ihtarname;
10. Tedarikçi'nin Müvekkil Şirket'e gönderdiği 26 Ocak 2010 tarihli yazı ve bunun Yeminli Tercüman Tasdikli Türkçe Çevirisi;
11. Tedarikçi'nin Müvekkil Şirket'e gönderdiği 10 Şubat 2010 tarihli yazı ve bunun Yeminli Tercüman Tasdikli Türkçe Çevirisi;
12. Tedarikçi'nin Müvekkil Şirket'e gönderdiği 5 Mart 2012 tarihli yazı ve bunun Yeminli Tercüman Tasdikli Türkçe Çevirisi;
13. Müvekkil Şirket ve Üniversite arasındaki 24 Mart 2010 tarihli toplantı tutanağı;
14. Tedarikçi'nin Türkiye temsilcisi Beyaz Teknik yetkililerin iletişim bilgileri;
15. Vekaletname.

16- Beşar Teknik Ltd. Şti.'nin 11.04.2012 tarihli, Marubeni
CONA'ya iletilen teknik rapor.

MARUBENI CORPORATION JAPAN
150 OFFICES AND SUBSIDIARY COMPANIES
THROUGHOUT THE WORLD

TOKYO HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 505 TOKYO

OSAKA HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 1000 OSAKA



Marubeni
Europe plc

A SUBSIDIARY OF MARUBENI CORPORATION, JAPAN

RIVER PLATE HOUSE 7-11 FINSBURY CIRCUS
LONDON EC2M 7AF

DDI TEL: LONDON (020) - 7826.....
SWITCHBOARD: (020) - 7826 8600
FAX: (020) - 7826 8611

To: Weiss Klimantechnik GMBH, Grelzer Str, 41-49, D-35447, Relskirchen-Lindenstruth,
Germany

Dear Mr Ulrich Mandler

Supply agreement dated 11th April 2007 (FE201155) (the "Supply Agreement")

This letter is sent to you jointly by Marubeni Europe plc ("Marubeni") and Hacettepe University
(our "End Customer").

We refer to those goods set out in the Schedule to this letter (the "Goods") that were delivered
by you to Moenchengladbach, Germany in accordance with the terms of the Supply
Agreement.

Accordance with clause "Warranty" of the Supply Agreement, the two years and a half years
warranty period (the "Warranty Period") for the Goods commenced on 26th June 2007.


However, due to certain problems at our End-Customer's site, the Goods have not yet been
installed. Notwithstanding the fact that the Goods have not yet been installed, by its counter
signature to this letter, our End-Customer confirms that the Goods have, since 26th June 2007,
been stored sure and dry and in compliance with any particular storage instructions.

Marubeni and our End Customer hereby respectfully request that you consider extending the
Warranty Period so that it would expire two years from 31st December 2008 or date of End
Customers taking over certificate, whichever comes earlier.

Yours sincerely

Steve Newton MEx
General Manager
LDNMEDB

Professor
Rector of Hacettepe University


Prof. Dr. Nejat ENTURK
Idari ve Mali İşler Dai. Bşk.

MARUBENI CORPORATION JAPAN
150 OFFICES AND SUBSIDIARY COMPANIES
THROUGHOUT THE WORLD

TOKYO HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 595 TOKYO

OSAKA HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 1000 OSAKA



Marubeni
Europe plc

A SUBSIDIARY OF MARUBENI CORPORATION, JAPAN

RIVER PLATE HOUSE 7-11 FINSBURY CIRCUS
LONDON EC2M 7AF

DDI TEL: LONDON (020) 7826 1111
SWITCHBOARD: (020) 7826 8600
FAX: (020) 7826 8611

To: Varian Medical Systems International AG, Chollerstrasse 38, CH-6303 ZUG, Switzerland

Dear Mr Fritz Derrer

Supply agreement dated 8th December 2007 TKS-002 (the "Supply Agreement")

This letter is sent to you jointly by Marubeni Europe plc ("Marubeni") and Hacettepe University (our "End Customer").

We refer to those goods set out in the Schedule to this letter (the "Goods") that were delivered by you to New Jersey, America on 25th March 2008 in accordance with the terms of the Supply Agreement.

Accordance with clause "Warranty" of the Supply Agreement, the two and a half years warranty period (the "Warranty Period") for the Goods commenced on 25th March 2008.


However, due to certain problems at our End-Customer's site, the Goods have not yet been installed. Notwithstanding the fact that the Goods have not yet been installed, by its counter signature to this letter, our End-Customer confirms that the Goods have, since 25th March 2008 been stored sure and dry and in compliance with any particular storage instructions. ✓

Marubeni and our End Customer hereby respectfully request that you consider extending the Warranty Period so that it would expire two years from 31st December 2008 or date of the taking over certificate issued by the End Customer, whichever comes earlier.

Yours sincerely

Steve Newton MIEEx
General Manager
LDNMEDB

Professor
Rector of Hacettepe University


Prof. Dr. Mehmet ERTÜRK
İdari ve Mali İşler Dal. Bşk.

MARUBENI CORPORATION JAPAN
150 OFFICES AND SUBSIDIARY COMPANIES
THROUGHOUT THE WORLD

TOKYO HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 595 TOKYO

OSAKA HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 1000 OSAKA



Marubeni
Europe plc

A SUBSIDIARY OF MARUBENI CORPORATION, JAPAN

RIVER PLATE HOUSE 7-11 FINSBURY CIRCUS
LONDON EC2M 7AF

DDI TEL: LONDON (020) - 7826 8000
SWITCHBOARD: (020) - 7826 8600
FAX: (020) - 7826 8011

To: BrainLAB Sales GmbH Kapellenstrasse 12, 85622 Feldkirchen Germany

Dear Mr Nils Ehrke

Supply agreement dated 11th April 2007 FE20120 (the "Supply Agreement")

This letter is sent to you jointly by Marubeni Europe plc ("Marubeni") and Hacettepe University (our "End Customer").

We refer to those goods set out in the Schedule to this letter (the "Goods") that were delivered by you to Moenchengladbach, Germany on 14th August 2007 in accordance with the terms of the Supply Agreement.

Accordance with clause "Warranty" of the Supply Agreement, the two and a half years warranty period (the "Warranty Period") for the Goods commenced on 14th August 2007.

However, due to certain problems at our End-Customer's site, the Goods have not yet been installed. Notwithstanding the fact that the Goods have not yet been installed, by its counter signature to this letter, our End-Customer confirms that the Goods have, since 14th August 2007 been stored sure and dry and in compliance with any particular storage instructions.

Marubeni and our End Customer hereby respectfully request that you consider extending the Warranty Period so that it would expire two years from 31st December 2008 or date of the taking over certificate issued by the End Customer, whichever comes earlier.

Yours sincerely

Steve Newton MIE
General Manager
LDNME08

Professor
Rector of Hacettepe University

Ecz. M. Nejat ERTÜRK
İdari ve Mali İşler Dai Bşk.

2.5 yıl.

↓ + 2 yıl.

Hacettepe'de
sondan se.
bekleli ki.
markeji,
gösteren

güvenli, ka
ve sahne
kapılma
uygun
bu sahne
sahneleşti

MARUBENI CORPORATION JAPAN
150 OFFICES AND SUBSIDIARY COMPANIES
THROUGHOUT THE WORLD

TOKYO HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 595 TOKYO

OSAKA HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 1000 OSAKA



Marubeni
Europe plc

A SUBSIDIARY OF MARUBENI CORPORATION, JAPAN

RIVER PLATE HOUSE 7-11 FINSBURY CIRCUS
LONDON EC2M 7AF

DDI TEL: LONDON (020) - 7825.....
SWITCHBOARD: (020) - 7825 8600
FAX: (020) - 7825 8611

To: Hepex Ltd, 15 Rue Du Jeu-De-L'arc PO Box 6105, CH-1211 Geneva 6, Switzerland

Dear Ms Blackshaw

Supply agreement dated 24/04/2007 (FE201065) (the "Supply Agreement")

This letter is sent to you jointly by Marubeni Europe plc ("Marubeni") and Hacettepe University (our "End Customer").

We refer to those goods set out in the Schedule to this letter (the "Goods") that were delivered by you to Moenchengladbach, Germany in accordance with the terms of the Supply Agreement.

Accordance with clause "Warranty" of the Supply Agreement, the two year warranty period (the "Warranty Period") for the Goods commenced on 16th November 2007.


However, due to certain problems at our End-Customer's site, the Goods have not yet been installed. Notwithstanding the fact that the Goods have not yet been installed, by its counter signature to this letter, our End-Customer confirms that the Goods have, since the 16th November 2007 been stored sure and dry and in compliance with any particular storage instructions.

Marubeni and our End Customer hereby respectfully request that you consider extending the Warranty Period so that it would expire two years from 31st December 2008 or date of Taking over Certificate issued by the End Customer, whichever comes earlier. .

Yours sincerely

Steve Newton MEx
General Manager
LDNMEDB

Professor
Rector of Hacettepe University


Ec. M. Nejat ERTÜRK
İdari ve Mali İşler Dai Bşk.

EK-13

Toplantı Notları

Tarih: 24 Mart 2010

Yer: Hacettepe Üniversitesi Hastanesi - Ankara

Toplantıya Katılanlar

Prof. Kutlu – HU

Prof. Ozmen – HU (Toplantının ilk kısmında bulundu)

Steve Newton – Marubeni

İbrahim Kilic – Kilic Consulting

Sinem Otlu – Incekara

Ulrich Mandler – Weiss

Christoph Lohner – Weiss

Cem Memik – Beyaz Teknik

Ağustos 2007'de Weiss ekipmanının teslimine ve projeye ilişkin Bay Kilic tarafından kısa bir özet verildi.

Bay Kilic, Weiss ekipmanını içeren kutuların açıldığında, dışarıda saklanmaktan dolayı bazı ünitelerin hava nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı. Weiss'a 20 gün önce kurulumu başlatmak için ihtar çekildiği açıklandı.

Prof. Ozmen ve Kutluk kendilerine ürünlerin içeride saklanması söylenilmediğini ve fark eder etmez ürünleri hastanenin içerisine taşıdıklarını belirttiler.

Bay Lohner, ürünlerin mikroislemci ve filtreler içerdiğini ve bunların yetersiz saklama koşulları sebebiyle zarar gördüğünü açıkladı. Esas üniteler dışarıda saklanırken, ikincil ürünler hastane içinde güvenli ve kuru bir yerde saklandı.

Prof Ozmen toplantıdan ayrıldı.

Bay Lohner ve Bay Mandler, gelecekteki potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri ve sistemin çökmesi riski dolayısıyla sistemin şu anki haliyle kurulmasını tavsiye etmediklerini açıklayarak devam ettiler. Weiss üniteleri mevcut haliyle kurmaları halinde garanti kapsamına alamayacağını açıkladı.

Prof.Kutluk ünitelerin tamir edilemeyeceğini ve masrafların ne olacağını sordu. Bay Lohner ve Bay Mandler, ünitelerin tam tanısal inceleme için Almanya'ya gönderilmesi gerektiğini ve sonra değişim yapmaya veya tamir etmeye çalışacaklarını söyledi. Bunun, sadece üniteleri değiştirmekten daha pahalı olacağını düşündüler. Ayrıca tamir edilmiş üniteler için garanti veremeyeceklerini söylediler.

Prof. Kutluk Almanya'ya gönderilmeden ürünlerin bulunduğu yerde tamir edilebilirliğini sordu. Beyaz Teknik tarafından desteklenen Weiss bunun mümkün olmayacağını açıkladı.

Bay Lohner ayrıca hastaneye kurulum süresini de yorumladı. Orijinal sistemin tek seferde kurulacağını ve böylece sistemin test edilebileceğini açıkladı. Ancak hastane Kemik İliği Transplant odalarına yoğunlaştığından ve ameliyathanelere başlanılmadığından, sistemin işlerliğini teyit etmenin birkaç ziyarette gerçekleşecek.

Prof. Kutluk HU'nun KIT odalarına yoğunlaştığını ve tesisat kurulumuna başlanıldığını teyit etti.

Prof. Ozmen - HU temsilcisi

Prof. Lohner - HU temsilcisi

Prof. Mandler - Weiss temsilcisi

Minutes

Date: 24th March 2010

Location: Hacettepe University Hospital – Ankara

Present:

Prof. Kutluk – HU

Prof Ozmen – HU (present for first part of the meeting)

Steven Newton – Marubeni

Ibrahim Kilic – Kilic Consulting

Sinem Otlu – Incekara

Ulrich Mandler – Weiss

Christoph Lohner – Weiss

Cem Memik – Beyaz Teknik

A brief overview was given by Mr Kilic in regards to the project and the delivery of the Weiss equipment in August 2007.

Mr Kilic explained that when the boxes containing Weiss equipment were opened, several units were found to be weather damaged due to the storage outside. It was explained that Weiss had been given notice 20 days ago to start installation.

Prof. Ozmen and Kutluk both stated that they had not been told to store these goods inside and as soon as they realised they moved the goods inside the hospital.

Mr Lohner explained that the units contained micro processors and filters which have been damaged by poor storage. The main units were stored outside whilst the minor parts had been stored in a sure and dry place inside the hospital.

Prof. Ozmen left the meeting.

Mr Lohner and Mr Mandler went on to explain that installing the system as it currently stands would not be advisable due to the risk of failure of the system and potential future health and safety risks. Weiss declared that they would not be able to cover any warranty if the installed the units in its current state.

Prof. Kutluk asked if the units could be repaired and what would be the cost. Mr Lohner and Mr Mandler explained that they would have to fly the units back to Germany for a full diagnostic assessment and then try to replace and repair those units. They thought that this would be more expensive than simply replacing the units. Additionally they commented that they would not be willing to give warranty for the repaired units.

Prof. Kutluk asked if these units could be repaired on site rather than sent back to Germany. Weiss supported by Beyaz Teknik explained that it would not be possible.

Mr Lohner also commented about the rate of installation at the hospital. He explained that the original system was to be installed at one time so that the system could be

ER-14

BEYAZ TEKNİK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

- CEM MEMİK

Genel Müdür

Tekstilkent Koza Plaza

A Blok Kat:11 No:41 34235

Esenler / İstanbul

Tel: +90 0212 438 60 46(pbx)

Faks: +90 0212 438 60 51

EPosta: bevaz@bevazteknik.com

**HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ EKSİK İŞLERİN
TAMAMLANMASI VE I. KISMIN TADİLAT VE BÜYÜK ONARIMLARI İŞİNE AİT
SÖZLEŞME**

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** adına Prof.Dr Tezer **KUTLUK** (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta **SOMUT SOĞUTMA VE MUTFAK TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.** (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler

Madde 2-

2.1. İdarenin Adresi : Hacettepe Üniversitesi 06100 Altındağ/ANKARA

Tel. No : 0 312 305 10 50

Faks No : 0 312 311 37 72

E-Posta Adresi : yapi@hacettepe.edu.tr

2.2. Yüklenicinin adı : **SOMUT SOĞUTMA VE MUTFAK TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**

Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi: Büküm sok. No:47/2 Kavaklıdere Çankaya ANKARA

Tel. No : 0 312 467 07 27

Faks No : 0 312 426 91 51

2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2'de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

Madde 3-

3.1) Adı: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve **I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları**

3.2) Miktarı (fiziki) ve türü: İkmal, Tadilat ve Büyük Onarım (20.000 m2 kapalı alan)

3.3) Yapılacağı yer: Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusu – ANKARA

Sözleşmenin Dili

Madde 4-Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Tanımlar

Madde 5- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Madde 6-

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen 14,288,422.21 YTL.- (Ondörtmilyonikiyüzseksenekiz bindörtüyüzirmiki YTL yirmibir YKr) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Madde 8- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.



Sözleşmenin Ekleri

Madde 9 –

9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

- 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,
- 2- İdari Şartname,
- 3- Sözleşme Tasarısı,
- 4- Uygulama Projesi,
- 5- Mahal Listesi,
- 6- Özel Teknik Şartname,
- 7- Genel Teknik Şartname,
- 8- Açıklamalar (varsa),

9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar

Madde 10-

10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi :

10.1.1. Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 3 (üç) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

10.1.2. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir.

10.1.3. Belirlenen süreler takvim günü esasına göre dir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır.

10.1.4. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar :

10.2.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %0.06 (On Binde altı) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir.

10.2.2. Gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

10.2.3. İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır, ayrıca kısmi gecikme cezası uygulanmaz.

Teminata İlişkin Hükümler

Madde 11-

11.1. Kesin Teminat :

11.1.1. Bu işin kesin teminat miktarı; **857.305,33 YTL (sekizyüzelliyedibinüçyüzbeş YTL otuzüç YKr)** dır.

Yüklenici, **858.000,00 YTL (sekizyüzellisekizbin YTL)** kesin teminat vermiştir.

11.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak idarece belirlenir. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır.

11.2. Ek Kesin Teminat :

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olmamak şartıyla idarece belirlenir.

11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

11.4. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi

11.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir.

11.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.5. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Ödeme Yeri ve Şartları

Madde 12-

12.1. Yüklenicinin hak edişi *Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığınca* ödenir.

12.2. Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, Kanuni kesintiler de yapılarak **30 (otuz)** günde bir düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

2008 Yılında %11

2009 Yılında %43

2010 Yılında %46

ödenek tespit olunmuştur.

12.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

12.4. Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, idare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu taktirde öder.

12.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

İş Programı

Madde 13-

13.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere uygun ve 10 uncu maddede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

13.2. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı

Madde 14- Bu iş için avans verilmeyecektir.

Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları

Madde 15-

15.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

15.2. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir. Yükleniciye fiyat farkı ödemeleri 2002/5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi hükümlerine göre yapılacaktır.

15.2.1- Tanımlar:

Bu Esasların uygulanmasında;

a) Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,

b) Temel indeks: İhale (son teklif verme) tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait indeksi,

c) Güncel indeks: Hakedişin düzenlendiği tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait indeksi,

d) Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde, uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise, uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, ifade eder.

15.2.2- Fiyat Farkı Hesabı:

Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır;

$$F = A_n \times B \times (P_n - 1)$$



$$P_n = \left[a \frac{I_n}{I_0} + b_1 \frac{C_n}{C_0} + b_2 \frac{D_n}{D_0} + b_3 \frac{Y_n}{Y_0} + b_4 \frac{K_n}{K_0} + b_5 \frac{G_n}{G_0} + c \frac{M_n}{M_0} \right]$$

Fiyat farkı için kullanılacak ağırlık oranları:

$a = 0,15, b_1 = 0,15, b_2 = 0,15, b_3 = 0,20, b_4 = 0,15, b_5 = 0,10, c = 0,10$

Formülde ;

F : Fiyat farkını (YTL),

An : İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, birim fiyatlı işlerde, uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (YTL); anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise, uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (YTL),

B : 0,90 katsayısını,

P_n : İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a, b₁, b₂, b₃, b₄, b₅ ve c ağırlık oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,

a : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b₁ : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimento'nun ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b₂ : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b₃ : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b₄ : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b₅ : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

c : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

İfade eder.

a, b₁, b₂, b₃, b₄, b₅ ve c için belirlenecek sabit katsayıların toplamının bire (1.00) eşit olacak şekilde, ihaleden önce, işin niteliğine ve gereklerine göre idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez.

Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler(n) ise;

I₀ , I_n : İşçilik temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi Tablosunun "Türkiye" satırındaki sayısı,

C₀ , C_n : Çimento temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri İmalatı" satırındaki sayısı,

D₀ , D_n : Demir/çelik temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Ana Metal Sanayi" satırındaki sayısı,

Y₀ , Y_n : Akaryakıt temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" satırındaki sayısı,

K₀ , K_n : Kereste temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı" satırındaki sayısı,

G₀ , G_n : Diğer malzemelerin temel indeksleri ve güncel indeksleri, idarelerin ihaleden önce işin niteliğine ve gereklerine göre Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosundan alt sektörler itibarıyla belirleyerek ihale dokümanında gösterecekleri ve iş bünyesinde kullanılacak olan diğer malzemelere karşılık gelen temel indekslere ve güncel indekslere ait sayıları; idarelerin bu tespiti yapamadıkları veyahut yapmadıkları durumlarda ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2 :Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki sayısı,

Mo , Mn : Makine ve ekipmana ait amortismanın temel indeksleri ve güncel indeksleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Makine ve Teçhizat İmalatı" satırındaki sayıyı, ifade eder.

Yukarıdaki indekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks; yeni bir indeks belirlenmez ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

15.2.3- Uygulama Esasları :

Fiyat farkı hesabında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

b) Bu Esasların uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek bedeller, fiyat farkı olup sözleşme bedelini etkilemez.

c) Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Yeni Türk Lirası ile ödenen işler için bu Esaslar uygulanmaz.

d) Hakedişlerin düzenlenmesi sırasında, hakedişe uygulanacak indeksin henüz belli olmadığı durumlarda, bir önceki güncel indeks kullanılarak fiyat farkı hesaplanır. Yeni indeksler temin edildiğinde sonraki hakedişlerde fiyat farkları buna göre düzeltilir.

e) Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Bunun dışında yüklenicinin kullandığı usuller, makine, ekipman, malzeme ve işçiliğin cins ve miktarı, Yeni Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının artması ve benzeri diğer nedenlerle ilave fiyat farkı ödenemez.

f) Avans ödenen işlerde, hakedişten mahsup edilen avans tutarı, formüldeki (An) tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesap edilir. Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde, (An) tutarından avans miktarı düşülmez.

g) Bu Esaslar, iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ve/veya iş grupları ile ihzarata uygulanır.

h) Birim fiyat sözleşmelerde, sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve yapılması idarece istenen bir iş kalemi için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, hazırlandığı uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyatın uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek bulunan fiyatı, iş kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. Bu iş kalemine ait fiyat farkı ise, uygulama ayının indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur.

15.2.4- İş Programı ve Ödenek Dilimi:

Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra iş kalemlerini, aylık imalatı, ihzaratı ve yıllık ödenekleri ve bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlayarak idareye onaylatmak zorundadır.

Herhangi bir aya ait onaylı iş programındaki ödenek harcanmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak hakedişlerde, hakediş toplamı ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar, iş programı gerçekleştirilmemiş ayın indeksi uygulanır.

Yükleniciye, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebeplerle veya sözleşmenin ifasının gecikmesine idarenin kusurunun sebep olduğu durumlarda süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan süreye göre yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak yapılan işler için fiyat farkı hesaplanır.

Yüklenicinin iş programını hazırlayarak idareye onaylattırmadığı durumlarda, iş programı idarece tek taraflı olarak yapılır ve onaylanır. Yüklenici, bu şekilde yapılan ve kendisine verilen iş programına uymak zorundadır.

15.2.5- İhzarat Uygulaması :

Birim fiyat sözleşme ile yaptırılan işler ile birim fiyat sözleşme ve anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin birlikte uygulandığı sözleşmelerin birim fiyat sözleşmeye göre yaptırılan kısmına ait işlerde kullanılan malzemelere ihzarat bedeli ödenebilir. Ancak, ihzarat bedeli ödenecek malzemelerin listesinin ve fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu malzemeler, iş programında yer alan iş kalemleri için ve o işlere yetecek miktarda ihzar edilir. İş programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiş malzemelerin fazla kısmına ihzarat bedeli ödenmez.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak ihzar edilen malzemelere, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

15.2.6- İmalat Artış ve Azalışları :

Birim fiyat sözleşmelerde, ödenek dilimleri ile ilgili olarak 48.4 üncü maddede yer alan hükümler de dikkate alınmak şartı ile, herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalatın miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) ile değerlendirilir

15.2.7- Cezalı Çalışılan İşlerdeki Uygulama :

Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınır.

15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları

Madde 16- Yüklenici ihale konusu işte alt yüklenici kullanmayacağını beyan etmiştir.

Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar

Madde 17- Bu madde hükmüne yer verilmemiştir.

İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması

Madde 18-

18.1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dahilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.

18.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 19-

19.1. Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %10'na kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.

19.2. Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

19.3. Mücbir sebep halleri:

- a) Doğal afetler,
- b) Kanuni grev,
- c) Genel salgın hastalık,
- d) Kısmi veya genel seferberlik ilânı,
- e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.

19.4. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına

veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz.

19.5. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

Madde 20- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Teminat Süresi

Madde 21- Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 365 (üçyüzaltmışbeş) gün olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Madde 22-

22.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

22.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Madde 23- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Teknik Personel Bulundurulması

Madde 24-

24.1. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

Adet	Pozisyonu	Meslek Unvanı	Acıklamalar
1	İnşaat Mühendisi veya Mimar	Saha Mühendisi	En az 5 yıl deneyimli
1	Makina Mühendisi	Saha Mühendisi	En az 5 yıl deneyimli
1	Elektrik Mühendisi	Saha Mühendisi	En az 5 yıl deneyimli
1	İnşaat Teknikeri	Tekniker	En az 3 yıl deneyimli
1	Makina Teknikeri	Tekniker	En az 3 yıl deneyimli
1	Elektrik Teknikeri	Tekniker	En az 3 yıl deneyimli

24.2. Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmazsa takdirde;

1 -	Saha Mühendisi - İnşaat Mühendisi için 250.00 YTL/Gün
2 -	Saha Mühendisi - Mimar için 250.00 YTL/Gün
3 -	Saha Mühendisi - Makine Mühendisi için 250.00 YTL/Gün
4 -	Saha Mühendisi - Elektrik Mühendisi için 250.00 YTL/Gün
5 -	Tekniker - İnşaat Teknikeri için 150.00 YTL/Gün
6 -	Tekniker - Makine Teknikeri için 150.00 YTL/Gün
7 -	Tekniker - Elektrik Teknikeri için 150.00 YTL/Gün

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

24.3. Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde yükleniciye tebliğ eder. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her hangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanır.

24.4. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.

24.5. İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az otuz gün önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur.

Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları

Madde 25-

25.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin %10'nun aşılması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Madde 26- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününe tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

Madde 27- Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Sözleşme Kapsamında Yaptırılacak İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi

Madde 28- Yapım sözleşmelerinde, öngörülemez durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 ve 48 inci madde hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracak Personele İlişkin Sorumlulukları

Madde 29- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracak personelle ilgili

sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Geçici Kabul Noksanları

Madde 30- (Değişik: Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)'üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 31- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde **Ankara** mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürürlük

Madde 32- Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, ihale dokümanında sözleşmenin noterce onaylanması ve tescili öngörülmüşse bu tescil ve onayın yapıldığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme **otuziki** maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 15.08.2008 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

İDARE

Hacettepe Üniversitesi Adına

Prof.Dr. Tezer KUTLUK
Hastaneler Genel Direktörü

YÜKLENİCİ

SOMUT

SOĞUTMA VE MUTFAK
TUR.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

SOMUT
SOĞUTMA VE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Büyükdere Sokak No: 47/2 06590 Kavaklıdere / ANK.
Tel: (0.312) 487 87 26 - 27 Fax: (0.312) 428 81 51
Kavaklıdere Vergi Dairesi: 774 000 3310

PURSANTAJ ORANLARI İCMAL TABLOSU

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I.
Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

SIRA NO	İMALAT GRUBUNUN ADI	PURSANTAJ ORANI
1	İNŞAAT	43,777%
2	MEKANİK	27,773%
3	ELEKTRİK	28,450%
PURSANTAJ ORANLARI TOPLAMI		100,000%



İNŞAAT İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
İNŞ-01	14.013/1	EL İLE KAZI YAPILMASI	M3	34,00	20,00	680,00 YTL	0,005%
İNŞ-02	16.059/B	BS 25 HAZIR BETON	M3	138,00	110,00	15.180,00 YTL	0,106%
İNŞ-03	18.112	10 CM GAZ BETON DUVAR	M2	285,00	22,00	6.270,00 YTL	0,044%
İNŞ-04	18.112/A	15 CM GAZ BETON DUVAR	M2	2.435,00	29,00	70.615,00 YTL	0,494%
İNŞ-05	18.116	20 CM GAZ BETON DUVAR	M2	388,00	39,00	15.132,00 YTL	0,106%
İNŞ-06	18.138/A4	ALÇIPAN DUVAR YAPILMASI	M2	298,00	42,00	12.516,00 YTL	0,087%
İNŞ-07	18.140/A1	ALÇI PANEL ASMA TAVAN	M2	6.845,00	24,00	164.280,00 YTL	1,150%
İNŞ-08	18.183	DUVAR YIKILMASI	M3	235,00	18,00	4.230,00 YTL	0,030%
İNŞ-09	18.195	CAMEKAN SÖKÜLMESİ	M2	856,00	4,00	3.424,00 YTL	0,024%
İNŞ-10	18.354/A	ALÜMİNYUM DİLASYON FUGASI- DÖŞEME	MT	74,00	85,00	6.290,00 YTL	0,044%
İNŞ-11	18.381	SİLİKON ESASLI MACUNLA SU YALITIMI	MT	235,00	3,50	822,50 YTL	0,006%
İNŞ-12	19.044	1,5MM PESTİLLE 1 KAT SU YALITIMI	M2	3.124,00	10,00	31.240,00 YTL	0,219%
İNŞ-13	19.050/3	10CM CAM YÜNÜ ISI YALITIMI	M2	2.856,00	6,00	17.136,00 YTL	0,120%
İNŞ-14	21.011	DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI	M2	870,00	14,00	12.180,00 YTL	0,085%
İNŞ-15	21.065	İŞ İSKELESİ 12,5 MT YE KADAR-DUVAR	M2	8.245,00	4,00	32.980,00 YTL	0,231%
İNŞ-16	21.066	İŞ İSKELESİ 12,5 MT YE KADAR-TAVAN	M3	25,00	5,00	125,00 YTL	0,0009%
İNŞ-17	21.210	ÇAM AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI	M2	1.365,00	43,00	58.695,00 YTL	0,411%
İNŞ-18	21.220	ÇATI ÖRTÜSÜ ALTINA RENDESİZ ÇAM İLE KAPLAMA YAPILMASI	M2	485,00	23,00	11.155,00 YTL	0,078%
İNŞ-19	23.014	İNCE NERVÖRLÜ DEMİRİN BÜKÜLÜP YERİNE KONULMASI	TON	4,80	1.835,00	8.808,00 YTL	0,062%
İNŞ-20	23.015	KALIN NERVÖRLÜ DEMİRİN BÜKÜLÜP YERİNE KONULMASI	TON	1,86	1.875,00	3.487,50 YTL	0,024%
İNŞ-21	23.152	KUTU PROFİL İMALAT YAPILMASI	KG	1.765,00	5,00	8.825,00 YTL	0,062%
İNŞ-22	23.152/1	KUTU PROFİLLERLE PARAPET KONSTRÜKSİYONU YAPILMASI	KG	7.865,00	5,00	39.325,00 YTL	0,275%
İNŞ-23	23.159/1	2MM DÜZ SİYAH SACTAN HARPUŞTA DERE YAKASI VE MAHYA YAPILMASI	KG	8.950,00	6,00	53.700,00 YTL	0,376%
İNŞ-24	23.159/A	4MM SİYAH SADDAN YAĞMUR DERESİ YAPILMASI	KG	9.350,00	6,00	56.100,00 YTL	0,393%
İNŞ-25	23.176	ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI	KG	9.350,00	4,50	42.075,00 YTL	0,294%
İNŞ-26	23.202	İŞLENEREK DEKORE EDİLMİŞ KORKULUK	KG	350,00	16,00	5.600,00 YTL	0,039%
İNŞ-27	23.243/35	ALÜMİNYUM ASMA TAVAN 85MM EN 20 MİKRON DERZ ÇITALI	M2	245,00	45,00	11.025,00 YTL	0,077%
İNŞ-28	23.244/E1	ISI YALITIMSIZ ALÜMİNYUM DOĞRAMA	KG	1.387,00	16,00	22.192,00 YTL	0,155%
İNŞ-29	23.244/L1	ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA	KG	15.450,00	16,00	247.200,00 YTL	1,730%
İNŞ-30	24.020	12 NOLU ÇİNKODAN SIVA ETEĞİ BAÇA KENARI YAPILMASI	MT	48,00	21,00	1.008,00 YTL	0,007%
İNŞ-31	25.016/1	DEMİR İMALATIN 2 KAT SÜLYEN , 2 KAT YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI	M2	1.987,00	8,00	15.896,00 YTL	0,111%
İNŞ-32	25.021/1	BADANASIZ SIVA YÜZEYLERE 3 KAT YAĞLI BOYA	M2	13.450,00	8,00	107.600,00 YTL	0,753%
İNŞ-33	25.024/2	ESKİ BADANALI YÜZEYLERE MACUN VE 2 KAT YAĞLI BOYA	M2	4.865,00	13,00	63.245,00 YTL	0,443%
İNŞ-34	25.043/1	ESKİ BADANALI YÜZEYLERE 3 KAT PLASTİK BOYA	M2	36,00	8,00	288,00 YTL	0,002%
İNŞ-35	25.048/1A	3 KAT PLASTİK BOYA	M2	12.986,00	10,00	129.860,00 YTL	0,909%
İNŞ-36	25.117	SERAMİK KÖŞE ÇITASI KONULMASI	MT	215,00	5,00	1.075,00 YTL	0,007%
İNŞ-37	26.193/3	25X33 CM SERAMİK DUVAR KAPLAMA	M2	1.496,00	31,00	46.376,00 YTL	0,324%
İNŞ-38	26.195/3	33X33 CM SERAMİK KAPLAMASI DÖŞEME	M2	243,00	35,00	8.505,00 YTL	0,059%
İNŞ-39	27.528/1	ALÇI PERDAH ÇEKİLMESİ	M2	38,00	2,50	95,00 YTL	0,001%
İNŞ-40	27.528/2	SATEN ALÇI YAPILMASI	M2	22.450,00	5,00	112.250,00 YTL	0,786%
İNŞ-41	27.532	İÇ SIVA YAPILMASI	M2	632,00	10,00	6.320,00 YTL	0,044%
İNŞ-42	27.563	PERLİTLİ ALÇILI TEK KAT SIVA YAPILMASI	M2	11.235,00	9,00	101.115,00 YTL	0,708%
İNŞ-43	27.581	TESVİYE TABAKASI YAPILMASI	M2	1.384,00	6,00	8.304,00 YTL	0,058%
İNŞ-44	27.586	4 CM KALINLIĞINDA ŞAP	M2	1.384,00	10,00	13.840,00 YTL	0,097%
İNŞ-45	28.063/2	6MM KALINLIĞINDA DÜZ CAM TAKILMASI	M2	21,00	24,00	504,00 YTL	0,004%
İNŞ-46	28.134/A	4+4 MM ISI CAM	M2	763,00	51,00	38.913,00 YTL	0,272%
İNŞ-47	İNŞ.Ö.001	ANDAZİT YER DÖŞEME KAPLAMASI 4CM	M2	214,00	45,00	9.630,00 YTL	0,067%
İNŞ-48	İNŞ.Ö.002	ANDAZİT MUCARTALI MERDİVEN BASAMAĞI	MT	12,00	45,00	540,00 YTL	0,004%
İNŞ-49	İNŞ.Ö.003	ANDEZİT BORDÜR YAPILMASI	MT	325,00	20,00	6.500,00 YTL	0,045%
İNŞ-50	İNŞ.Ö.004	ÇATI DERESİ SÖKÜLMESİ	MT	245,00	6,00	1.470,00 YTL	0,010%

İNŞAAT İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimli	Miktarı	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
İNŞ-51	İNŞ.Ö.005	ALÜKEN ÇATI SÖKÜLMESİ	M2	1.875,00	5,00	9.375,00 YTL	0,066%
İNŞ-52	İNŞ.Ö.006	MERMER VE SERAMİK SÖKÜLMESİ	M2	8.765,00	2,50	21.912,50 YTL	0,153%
İNŞ-53	İNŞ.Ö.007	SÜPÜRGELİK SÖKÜLMESİ	MT	1.200,00	1,00	1.200,00 YTL	0,008%
İNŞ-54	İNŞ.Ö.008	SUNİ MERMER DENİZLİK SÖKÜLMESİ	MT	435,00	3,00	1.305,00 YTL	0,009%
İNŞ-55	İNŞ.Ö.009	DOLAP SÖKÜLMESİ	M2	85,00	4,00	340,00 YTL	0,002%
İNŞ-56	İNŞ.Ö.010	ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ	M2	3.650,00	3,00	10.950,00 YTL	0,077%
İNŞ-57	İNŞ.Ö.011	KAPI KASASI SÖKÜLMESİ	KG	4.550,00	1,50	6.825,00 YTL	0,048%
İNŞ-58	İNŞ.Ö.012	ALÇI PLAKA DUVAR KAPLAMASI	M2	845,00	33,00	27.885,00 YTL	0,195%
İNŞ-59	İNŞ.Ö.013	PERFORE ASMA TAVAN	M2	815,00	50,00	40.750,00 YTL	0,285%
İNŞ-60	İNŞ.Ö.014	0,7 MM GORFAJLI ALÜKEN ÇATI KAPLAMASI	M2	3.150,00	75,00	236.250,00 YTL	1,653%
İNŞ-61	İNŞ.Ö.015	ALÜMİNYUM KILIFLI PÜR CONTA VE TESPİTİ	AD	568,00	5,00	2.840,00 YTL	0,020%
İNŞ-62	İNŞ.Ö.016	0,7 MM GORFAJLI ALÜKEN İLE HARPUŞTA YAPILMASI	M2	876,00	60,00	52.560,00 YTL	0,368%
İNŞ-63	İNŞ.Ö.017	ALÜKEN MAHYA YAPILMASI	MT	74,00	23,00	1.702,00 YTL	0,012%
İNŞ-64	İNŞ.Ö.018	DUVARA KURŞUN KAPLANMASI	M2	425,00	124,00	52.700,00 YTL	0,369%
İNŞ-65	İNŞ.Ö.019	DOĞAL GRANİT 4CM LEVHA İLE TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMA	M2	8,00	450,00	3.600,00 YTL	0,025%
İNŞ-66	İNŞ.Ö.020	LAMİNAT MASA YAPILMASI	MT	63,00	225,00	14.175,00 YTL	0,099%
İNŞ-67	İNŞ.Ö.021	METAL SIVA KÖŞE PROFİLİ	MT	4.350,00	7,00	30.450,00 YTL	0,213%
İNŞ-68	İNŞ.Ö.022	BİZUTELİ FLOTAL AYNA	M2	43,00	42,00	1.806,00 YTL	0,013%
İNŞ-69	İNŞ.Ö.023	MERMER DÖŞEME KAPLAMASINA PİRİNÇ DERZ YAPILMASI	MT	485,00	10,00	4.850,00 YTL	0,034%
İNŞ-70	İNŞ.Ö.024	LAMİNAT TEZGAH ÜSTÜ DOLAP YAPILMASI	M2	48,00	255,00	12.240,00 YTL	0,086%
İNŞ-71	İNŞ.Ö.025	LAMİNAT TEZGAH ALTI DOLAP YAPILMASI	M2	38,00	255,00	9.690,00 YTL	0,068%
İNŞ-72	İNŞ.Ö.026	İTHAL LAMİNAT KAPLAMALI DUVAR BANDI YAPILMASI	MT	3.750,00	68,00	255.000,00 YTL	1,785%
İNŞ-73	İNŞ.Ö.027	FİRİN BOYALI ARŞİV DOLABI	AD	78,00	475,00	37.050,00 YTL	0,259%
İNŞ-74	İNŞ.Ö.028	3,2 MM ANTİBAKTERİYEL PVC DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI	M2	5.340,00	68,00	363.120,00 YTL	2,541%
İNŞ-75	İNŞ.Ö.029	ELAZIĞ VIŞNE MERMER DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI	M2	58,00	125,00	7.250,00 YTL	0,051%
İNŞ-76	İNŞ.Ö.030	ROZA PEMBE MERMER İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI	M2	645,00	65,00	41.925,00 YTL	0,293%
İNŞ-77	İNŞ.Ö.031	ROZA PEMBE MERMER İLE SÜPÜRGELİK YAPILMASI	MT	235,00	8,00	1.880,00 YTL	0,013%
İNŞ-78	İNŞ.Ö.032	GRANİT DÖŞEME KAPLAMASI	M2	375,00	325,00	121.875,00 YTL	0,853%
İNŞ-79	İNŞ.Ö.033	GRANİT CEPHE KAPLAMASI	M2	58,00	455,00	26.390,00 YTL	0,185%
İNŞ-80	İNŞ.Ö.034	GRANİT SÜPÜRGELİK YAPILMASI	MT	85,00	50,00	4.250,00 YTL	0,030%
İNŞ-81	İNŞ.Ö.035	GRANİT AGREGALI DÖŞEME KAPLAMASI	M2	83,00	50,00	4.150,00 YTL	0,029%
İNŞ-82	İNŞ.Ö.036	KÖŞE LASTİKLİ GRANİT AGREGALI GÖNYE MERDİVEN BASAMAĞI	MT	268,00	75,00	20.100,00 YTL	0,141%
İNŞ-83	İNŞ.Ö.037	GRANİT AGREGALI DENİZLİK	MT	4,00	60,00	240,00 YTL	0,002%
İNŞ-84	İNŞ.Ö.038	GRANİT AGREGALI SÜPÜRGELİK	MT	110,00	8,00	880,00 YTL	0,006%
İNŞ-85	İNŞ.Ö.039	60X60 PORSELEN GRANİT SERAMİK CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI	M2	5.830,00	165,00	961.950,00 YTL	6,732%
İNŞ-86	İNŞ.Ö.040	ALÜMİNYUM KOMPOZİT LEVHALARLA CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI	M2	1.758,00	175,00	307.650,00 YTL	2,153%
İNŞ-87	İNŞ.Ö.041	FİRİN BOYALI BÜKME SAC KAPI KASASI	KG	11.860,00	5,50	65.230,00 YTL	0,457%
İNŞ-88	İNŞ.Ö.042	LAMİNAT KAPLAMALI KAPI KANADI	M2	584,00	165,00	96.360,00 YTL	0,674%
İNŞ-89	İNŞ.Ö.043	KAPI ÜSTÜNE PASLANMAZ ÇELİK SEDYELİK KAPLAMA	AD	305,00	25,00	7.625,00 YTL	0,053%
İNŞ-90	İNŞ.Ö.044	KAPI ÜSTÜNE PASLANMAZ ÇELİK TEKMELİK KAPLAMA	AD	305,00	32,00	9.760,00 YTL	0,068%
İNŞ-91	İNŞ.Ö.045	PASLANMAZ ÇELİK KAPI CUMBASI	MT	945,00	30,00	28.350,00 YTL	0,198%
İNŞ-92	İNŞ.Ö.046	PIRİNÇ YER TAMPONU YAPILMASI	AD	305,00	8,00	2.440,00 YTL	0,017%
İNŞ-93	İNŞ.Ö.047	LAMİNAT KAPLAMALI ŞAFT KASASI	M2	84,00	190,00	15.960,00 YTL	0,112%
İNŞ-94	İNŞ.Ö.048	LAMİNAT KAPLAMALI ŞAFT KAPAĞI	M2	92,00	190,00	17.480,00 YTL	0,122%
İNŞ-95	İNŞ.Ö.049	PANİK BARLI YANGIN KAPISI	AD	29,00	1.340,00	38.860,00 YTL	0,272%
İNŞ-96	İNŞ.Ö.050	KAYAR KAPI YAPILMASI	AD	7,00	7.800,00	54.600,00 YTL	0,382%

İNŞAAT İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
İNŞ-97	İNŞ.Ö.051	LAMİNAT KAPLAMALI DOLAP YAPILMASI	M2	543,00	255,00	138.465,00 YTL	0,969%
İNŞ-98	İNŞ.Ö.052	LAMİNAT KAPLAMALI CAM KAPAKLI DOLAP	M2	231,00	215,00	49.665,00 YTL	0,348%
İNŞ-99	İNŞ.Ö.053	LAMİNAT KAPLAMALI AÇIK RAFLI DOLAP	M2	8,00	165,00	1.320,00 YTL	0,009%
İNŞ-100	İNŞ.Ö.054	KOMPAKT LAMİNAT DOLAP YAPILMASI	M2	38,00	495,00	18.810,00 YTL	0,132%
İNŞ-101	İNŞ.Ö.055	LAMİNAT KAPLAMALI BANKO YAPILMASI	MT	81,00	485,00	39.285,00 YTL	0,275%
İNŞ-102	İNŞ.Ö.056	DOLAP VE BANKO ALTILARI PASLANMAZ ÇELİK KAPLANMASI	MT	78,00	28,00	2.184,00 YTL	0,015%
İNŞ-103	İNŞ.Ö.057	ETEJER YAPILMASI	AD	98,00	160,00	15.680,00 YTL	0,110%
İNŞ-104	İNŞ.Ö.058	TEKERLEKLİ BİLGİSAYAR KASA ALTIĞI YAPILMASI	AD	67,00	55,00	3.685,00 YTL	0,026%
İNŞ-105	İNŞ.Ö.059	AHŞAP PERDE BANDI YAPILMASI	MT	345,00	12,00	4.140,00 YTL	0,029%
İNŞ-106	İNŞ.Ö.060	KOMPAKT LAMİNAT LABORATUVAR TEZGAHI	MT	84,00	1.234,00	103.656,00 YTL	0,725%
İNŞ-107	İNŞ.Ö.061	KOMPAKT LAMİNAT DUVAR KAPLAMASI	M2	177,00	215,00	38.055,00 YTL	0,266%
İNŞ-108	İNŞ.Ö.062	KOMPAKT LAMİNAT TAVAN KAPLAMASI	M2	118,00	285,00	33.630,00 YTL	0,235%
İNŞ-109	İNŞ.Ö.063	KOMPAKT LAMİNAT DÖNÜŞ PARÇASI	MT	83,00	345,00	28.635,00 YTL	0,200%
İNŞ-110	İNŞ.Ö.064	KOMPAKT LAMİNAT TEZGAH YAPILMASI	MT	46,00	385,00	17.710,00 YTL	0,124%
İNŞ-111	İNŞ.Ö.065	KOMPAKT LAMİNAT WC BÖLMESİ YAPILMASI	M2	98,00	154,00	15.092,00 YTL	0,106%
İNŞ-112	İNŞ.Ö.066	SU KONTRASI SÜPÜRGELİK YAPILMASI	MT	3.450,00	30,00	103.500,00 YTL	0,724%
İNŞ-113	İNŞ.Ö.067	PASLANMAZ ÇELİK DUVAR BANDI KORUYUCUSU YAPILMASI	AD	186,00	85,00	15.810,00 YTL	0,111%
İNŞ-114	İNŞ.Ö.068	PASLANMAZ ÇELİK DIŞ KÖŞE KORUYUCU	MT	165,00	50,00	8.250,00 YTL	0,058%
İNŞ-115	İNŞ.Ö.069	PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU	MT	54,00	175,00	9.450,00 YTL	0,066%
İNŞ-116	İNŞ.Ö.070	PASLANMAZ ÇELİK DUVAR TUTAMAĞI	MT	85,00	120,00	10.200,00 YTL	0,071%
İNŞ-117	İNŞ.Ö.071	PASLANMAZ ÇELİK ÇEŞİTLİ İMALAT YAPILMASI	KG	835,00	26,00	21.710,00 YTL	0,152%
İNŞ-118	İNŞ.Ö.072	PASLANMAZ ÇELİK KONSTRÜKSİYON CAM MARKIZ YAPILMASI	M2	48,00	1.845,00	88.560,00 YTL	0,620%
İNŞ-119	İNŞ.Ö.073	MAİZEME GEÇİŞ PROFİLİ	MT	38,00	23,00	874,00 YTL	0,006%
İNŞ-120	İNŞ.Ö.074	KİLİTLİ PENCERE KOLU	AD	415,00	35,00	14.525,00 YTL	0,102%
İNŞ-121	İNŞ.Ö.075	GÖMME KAPI KİLİDİ	AD	23,00	45,00	1.035,00 YTL	0,007%
İNŞ-122	İNŞ.Ö.076	SİSTEM KAPI VE PENCERE MENTEŞESİ	AD	835,00	11,00	9.185,00 YTL	0,064%
İNŞ-123	İNŞ.Ö.077	GÖMME KAPI POMPASI	AD	34,00	435,00	14.790,00 YTL	0,104%
İNŞ-124	İNŞ.Ö.078	ALÜMİNYUM KAPI ALTI FIRÇASI	AD	38,00	10,00	380,00 YTL	0,003%
İNŞ-125	İNŞ.Ö.079	ALÜMİNYUM KAPI ATLAMALI KAPI SÜRGÜSÜ	AD	38,00	32,00	1.216,00 YTL	0,009%
İNŞ-126	İNŞ.Ö.080	DAİRESEL BORU KOL	TK	34,00	150,00	5.100,00 YTL	0,036%
İNŞ-127	İNŞ.Ö.081	ÇİFT AÇILIM PENCERE MEKANİZMASI	AD	296,00	125,00	37.000,00 YTL	0,259%
İNŞ-128	İNŞ.Ö.082	ELEKTRİKLİ KİLİT TAKILMASI	AD	8,00	63,00	504,00 YTL	0,004%
İNŞ-129	İNŞ.Ö.083	KAPI ÇEK TAKILMASI	AD	43,00	124,00	5.332,00 YTL	0,037%
İNŞ-130	İNŞ.Ö.084	4X4X CAM İÇİ JALUZİ TAKILMASI	M2	36,00	285,00	10.260,00 YTL	0,072%
İNŞ-131	İNŞ.Ö.085	VİTRAY İŞLEMELİ CAM YAPILMASI	M2	22,00	563,00	12.386,00 YTL	0,087%
İNŞ-132	İNŞ.Ö.086	İTHAL TAM OTOMATİK FOTOSEL KAPI	AD	39,00	5.875,00	229.125,00 YTL	1,604%
İNŞ-133	İNŞ.Ö.087	ÖZEL MERMER DNİZLİK YAPILMASI	M2	118,00	128,00	15.104,00 YTL	0,106%
İNŞ-134	İNŞ.Ö.088	KARTONPIYER YAPILMASI	MT	5.350,00	8,00	42.800,00 YTL	0,300%
İNŞ-135	İNŞ.Ö.089	90X90 CM DUŞA KABİN YAPILMASI	AD	14,00	515,00	7.210,00 YTL	0,050%
İNŞ-136	İNŞ.Ö.090	TV KONSOLU TEMİNİ VE TAKILMASI	AD	34,00	68,00	2.312,00 YTL	0,016%
İNŞ-137	İNŞ.Ö.091	SERAMİK BORDÜR YAPILMASI	MT	345,00	28,00	9.660,00 YTL	0,068%
İNŞ-138	İNŞ.Ö.092	DAİRESEL DÖNÜŞLÜ DUVAR TAVAN PROFİLİ	MT	348,00	13,00	4.524,00 YTL	0,032%
İNŞ-139	İNŞ.Ö.093	2 KAT ALÇI PLAKA ASMA TAVAN YAPILMASI	M2	218,00	45,00	9.810,00 YTL	0,069%
İNŞ-140	İNŞ.Ö.094	LENTO YAPILMASI	MT	675,00	26,00	17.550,00 YTL	0,123%
İNŞ-141	İNŞ.Ö.095	ÇATI ÜZERİ YÜRÜME YOLLARI AHŞAP TAKOZ YAPILMASI	AD	285,00	6,00	1.710,00 YTL	0,012%
İNŞ-142	İNŞ.Ö.096	CAM KAPI YAPILMASI	TK	2,00	1.875,00	3.750,00 YTL	0,026%
İNŞ-143	İNŞ.Ö.097	KONDAKTİV ÖZELLİKTE PVC DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI	M2	138,00	78,00	10.764,00 YTL	0,075%
İNŞ-144	İNŞ.Ö.098	AHŞAP LAMİNE PARKE DÖŞEME KAPLAMASI	M2	86,00	87,00	7.482,00 YTL	0,052%
İNŞ-145	İNŞ.Ö.099	İTHAL DUVAR KAĞIDI KAPLAMASI YAPILMASI	M2	1.376,00	28,00	38.528,00 YTL	0,270%
İNŞ-146	İNŞ.Ö.100	2MM MEMRAN İLE İZOLE YAPILMASI	M2	340,00	26,00	8.840,00 YTL	0,062%
İNŞ-147	İNŞ.Ö.101	KOLON VE KİRİŞLERE EPOKSI İLE FİLİZ EKİLMESİ	AD	143,00	38,00	5.434,00 YTL	0,038%
İNŞ-148	İNŞ.Ö.102	EPOKSI DÖŞEME KAPLAMASI	M2	1.456,00	55,00	80.080,00 YTL	0,560%
İNŞ-149	İNŞ.Ö.103	KURŞUN LEVHALARLA KAPI+BÖLME DUVAR KAPLAMASI	KG	5.835,00	8,00	46.680,00 YTL	0,327%
İNŞ-150	İNŞ.Ö.104	DÖŞEME VE DUVARA KURŞUN KAPLANMASI	KG	20.650,00	8,00	165.200,00 YTL	1,156%
GENEL TOPLAM						6.255.044,50 YTL	43,777%

MEKANİK İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş No	Kalem	İş Kalemının Adı ve Kısa Açıklaması	Birimli	Miktarı	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
TES-01	71.105	Lavabo		AD	67,00	88,80	5.949,60 YTL	0,042%
TES-02	71.106	Lavabo		AD	94,00	139,10	13.075,40 YTL	0,092%
TES-03	72.701	Lavabo Tesisatı Gömme Tip		AD	146,00	164,30	23.987,80 YTL	0,168%
TES-04	80.102	Pisuar ve Tesisatı		AD	19,00	89,70	1.704,30 YTL	0,012%
TES-05	81.301	Pisuar Ara Bölmesi		AD	14,00	54,10	757,40 YTL	0,005%
TES-06	84.101	Evye Tesisatı		AD	5,00	116,20	581,00 YTL	0,004%
TES-07	86.302	Gömme Baş ve El Duşlu Banyo Takımı		AD	23,00	349,40	8.036,20 YTL	0,056%
TES-08	87.702	Duş Teknesi		AD	23,00	208,40	4.793,20 YTL	0,034%
TES-09	97.504	Pirinç Kromajlı Izgaralı Banyo Süzgeçi		AD	80,00	63,30	5.064,00 YTL	0,035%
TES-10	103.109	Soğuk su sayacı 100 Ø mm. Flanşlı		AD	1,00	636,40	636,40 YTL	0,004%
TES-11	106.205	ULTRAVİOLE STERİLİZASYON CİHAZI (1,5-50 m³/h) Debi-m3/h:15.0 Min Harcanan Güç-Watt:225 Cihaz Giriş Çıkış:2" -2 1/2"		AD	1,00	6.625,00	6.625,00 YTL	0,046%
TES-12	107.644	Uç Pompalı Düşey Millî Santrifüj Pompalı Hidrofor Debi-m3/h:20 - 50 Basınç-mSS:60 - 90		AD	2,00	8.675,00	17.350,00 YTL	0,121%
TES-13	108.910	Tam. Oto. Tandem Su Yum.Cihazı		AD	1,00	27.650,00	27.650,00 YTL	0,194%
TES-14	1002.118	Yangın Dolebi		AD	28,00	1.200,00	33.600,00 YTL	0,235%
TES-15	167.807	Fan-Coil Cihazı		AD	162,00	932,00	150.984,00 YTL	1,057%
TES-16	167.810	Fan-Coil Cihazı		AD	4,00	1.142,00	4.568,00 YTL	0,032%
TES-17	170.202	Radyalör Musluğu 3/4"		AD	332,00	15,10	5.013,20 YTL	0,035%
TES-18	173.201	Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan 57/2,9 ø mm.		MT	3,00	14,60	43,80 YTL	0,0003%
TES-19	173.202	Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan 82,5/3,2 ø mm.		MT	2,00	20,80	41,60 YTL	0,0003%
TES-20	173.204	Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan 133/4,0 ø mm.		MT	8,00	36,40	291,20 YTL	0,002%
TES-21	173.205	Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan 150 mm.		MT	4,00	51,00	204,00 YTL	0,0014%
TES-22	173.206	Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan 200 mm.		MT	12,00	98,80	1.185,60 YTL	0,0083%
TES-23	173.207	Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan 267/6,3 ø mm.		MT	12,00	104,00	1.248,00 YTL	0,009%
TES-24	173.208	Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan 324/7,1 ø mm.		MT	4,00	118,60	474,40 YTL	0,0033%
TES-25	173.302	Kollektör ağızı 20mm		AD	25,00	3,10	77,50 YTL	0,0005%
TES-26	173.304	Kollektör ağızı 32mm		AD	15,00	4,70	70,50 YTL	0,0005%
TES-27	173.306	Kollektör ağızı 50mm		AD	15,00	5,90	88,50 YTL	0,001%
TES-28	173.307	Kollektör ağızı 65mm		AD	10,00	6,80	68,00 YTL	0,0005%
TES-29	173.308	Kollektör ağızı 80mm		AD	8,00	7,80	62,40 YTL	0,0004%
TES-30	173.309	Kollektör ağızı 100mm		AD	15,00	9,00	135,00 YTL	0,001%
TES-31	173.310	Kollektör ağızı 125mm		AD	12,00	11,30	135,60 YTL	0,001%
TES-32	173.311	Kollektör ağızı 150mm		AD	8,00	13,40	107,20 YTL	0,001%
TES-33	173.312	Kollektör ağızı 200mm		AD	7,00	19,10	133,70 YTL	0,001%
TES-34	174.402	Silindirik Havalandırma Deposu 10 Lt.		AD	52,00	10,30	535,60 YTL	0,004%
TES-35	174.615	Değişebilir Diyaframalı Genleşme Deposu 500L		AD	2,00	1.041,59	2.083,18 YTL	0,015%
TES-36	174.617	Değişebilir Diyaframalı Genleşme Deposu 1000L		AD	3,00	2.336,07	7.008,21 YTL	0,049%
TES-37	23.176	Kaynaklı İmalat İşleri -Çelik Profil		Kg	7.350,00	4,45	32.707,50 YTL	0,230%
TES-38	201.104	Dikşil Siyah Boru 1/2"		MT	845,00	3,36	2.839,20 YTL	0,020%
TES-39	201.105	Dikşil Siyah Boru 3/4"		MT	1.220,00	3,84	4.684,80 YTL	0,033%
TES-40	201.106	Dikşil Siyah Boru 1"		MT	645,00	5,16	3.328,20 YTL	0,023%
TES-41	201.107	Dikşil Siyah Boru 1 1/4"		MT	883,00	6,48	5.721,84 YTL	0,040%
TES-42	201.108	Dikşil Siyah Boru 1 1/2"		MT	507,00	7,56	3.832,92 YTL	0,027%
TES-43	201.109	Dikşil Siyah Boru 2"		MT	344,00	9,84	3.384,96 YTL	0,024%
TES-44	201.110	Dikşil Siyah Boru 2 1/2"		MT	516,00	12,96	6.687,36 YTL	0,047%
TES-45	201.111	Dikşil Siyah Boru 3"		MT	327,00	16,56	5.415,12 YTL	0,038%
TES-46	201.112	Dikşil Siyah Boru 4"		MT	725,00	22,92	16.617,00 YTL	0,116%
TES-47	201.113	Dikşil Siyah Boru 5"		MT	409,00	31,20	12.760,80 YTL	0,089%
TES-48	201.114	Dikşil Siyah Boru 6"		MT	185,00	36,60	6.771,00 YTL	0,047%
TES-49	201.134	Dikşil Siyah Boru 8"		MT	660,00	66,00	43.560,00 YTL	0,305%
TES-50	201.500	Kaynaklı Boru Montaj Malzeme Bedeli		%	0,25	115.603,20	28.900,80 YTL	0,202%
TES-51	201.203	Dikşil Galvaniz Boru 1/2"		MT	850,00	4,08	3.468,00 YTL	0,024%
TES-52	201.204	Dikşil Galvaniz Boru 3/4"		MT	449,00	4,80	2.155,20 YTL	0,015%
TES-53	201.205	Dikşil Galvaniz Boru 1"		MT	526,00	7,08	3.724,08 YTL	0,026%
TES-54	201.206	Dikşil Galvaniz Boru 1 1/4"		MT	330,00	9,00	2.970,00 YTL	0,021%
TES-55	201.207	Dikşil Galvaniz Boru 1 1/2"		MT	415,00	9,96	4.133,40 YTL	0,029%
TES-56	201.208	Dikşil Galvaniz Boru 2"		MT	372,00	13,68	5.088,96 YTL	0,036%
TES-57	201.209	Dikşil Galvaniz Boru 2 1/2"		MT	106,00	16,92	1.793,52 YTL	0,013%
TES-58	201.400	Vidalı Boru Montaj Malzeme Bedeli		%	0,30	23.333,16	6.999,95 YTL	0,050%

SOMU

SOMU M.T. PARS. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Büyükdere Sokak No: 4/2 06560 Kavaklıdere / ANK.
Tel: (0.312) 467-07 26 - 27 Fax: (0.312) 426 91 51
Kavaklıdere Vergi Dairesi 774 000 3310

MEKANİK İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
TES-59	204.411	Sert PVC Plastik Pis Su Borusu 50/3,2mm	MT	188,00	2,95	554,98 YTL	0,004%
TES-60	204.412	Sert PVC Plastik Pis Su Borusu 70/3,2mm	MT	310,00	4,15	1.287,12 YTL	0,009%
TES-61	204.413	Sert PVC Plastik Pis Su Borusu 100/3,2mm	MT	666,00	6,88	4.579,42 YTL	0,032%
TES-62	204.414	Sert PVC Plastik Pis Su Borusu 125/3,2mm	MT	125,00	8,41	1.051,50 YTL	0,007%
TES-63	204.415	Sert PVC Plastik Pis Su Borusu 150/4,0mm	MT	50,00	16,16	808,20 YTL	0,006%
TES-64	204.416	Sert PVC Plastik Pis Su Borusu 200	MT	35,00	19,22	672,84 YTL	0,005%
TES-65	204.501	Plastik Pis Su Borusu Montaj Malzeme Bedeli	%	0,35	8.954,05	3.133,92 YTL	0,022%
TES-66	210/790.702	Tam Geçişli Küresel Vana 1/2"	AD	105,00	77,00	8.085,00 YTL	0,057%
TES-67	210/790.703	Tam Geçişli Küresel Vana 3/4"	AD	22,00	96,60	2.125,20 YTL	0,015%
TES-68	210/790.704	Tam Geçişli Küresel Vana 1"	AD	10,00	126,00	1.260,00 YTL	0,009%
TES-69	210/790.705	Tam Geçişli Küresel Vana 1 1/4"	AD	24,00	149,80	3.595,20 YTL	0,025%
TES-70	210/790.706	Tam Geçişli Küresel Vana 1 1/2"	AD	29,00	187,60	5.440,40 YTL	0,038%
TES-71	210/790.707	Tam Geçişli Küresel Vana 2"	AD	72,00	260,40	18.748,80 YTL	0,131%
TES-72	210/790.708	Tam Geçişli Küresel Vana 2 1/2"	AD	50,00	333,20	16.660,00 YTL	0,117%
TES-73	210/790.709	Tam Geçişli Küresel Vana 3"	AD	14,00	470,40	6.585,60 YTL	0,046%
TES-74	210/790.710	Tam Geçişli Küresel Vana 4"	AD	80,00	554,40	44.352,00 YTL	0,310%
TES-75	210/790.711	Tam Geçişli Küresel Vana 5"	AD	19,00	828,80	15.747,20 YTL	0,110%
TES-76	210/790.712	Tam Geçişli Küresel Vana 6"	AD	9,00	1.610,00	14.490,00 YTL	0,101%
TES-77	210/790.713	Tam Geçişli Küresel Vana 8"	AD	12,00	2.485,00	29.820,00 YTL	0,209%
TES-78	216.504	Sirkülasyon pompası	AD	2,00	525,72	1.051,44 YTL	0,007%
TES-79	220.202	Kompansatör 20mm	AD	4,00	162,96	651,84 YTL	0,005%
TES-80	220.204	Kompansatör 32mm	AD	6,00	201,60	1.209,60 YTL	0,008%
TES-81	220.207	Kompansatör 65mm	AD	4,00	283,92	1.135,68 YTL	0,008%
TES-82	220.209	Kompansatör 100mm	AD	5,00	413,28	2.066,40 YTL	0,014%
TES-83	220.210	Kompansatör 125mm	AD	4,00	517,44	2.069,76 YTL	0,014%
TES-84	220.211	Kompansatör 150mm	AD	3,00	606,48	1.819,44 YTL	0,013%
TES-85	220.212	Kompansatör 200mm	AD	6,00	816,48	4.898,88 YTL	0,034%
TES-86	221.202	Pislik Tutucu 20mm	AD	12,00	39,24	470,88 YTL	0,003%
TES-87	221.204	Pislik Tutucu 1 1/4" - DN32	AD	7,00	69,36	485,52 YTL	0,003%
TES-88	221.205	Pislik Tutucu 1 1/2" - DN40	AD	3,00	84,36	253,08 YTL	0,002%
TES-89	221.206	Pislik Tutucu 2" - DN50	AD	3,00	106,32	318,96 YTL	0,002%
TES-90	221.207	Pislik Tutucu 2 1/2" - DN65	AD	8,00	143,28	1.146,24 YTL	0,008%
TES-91	221.209	Pislik Tutucu 4" - DN100	AD	14,00	249,60	3.494,40 YTL	0,024%
TES-92	221.210	Pislik Tutucu 5" - DN125	AD	1,00	397,56	397,56 YTL	0,003%
TES-93	221.211	Pislik Tutucu 6" - DN150	AD	3,00	477,24	1.431,72 YTL	0,010%
TES-94	221.212	Pislik Tutucu 8" - DN200	AD	6,00	927,96	5.567,76 YTL	0,039%
TES-95	228.402	Geri Tepme Ventili 20mm	AD	6,00	76,80	460,80 YTL	0,003%
TES-96	228.404	Geri Tepme Ventili 32mm	AD	4,00	140,40	561,60 YTL	0,004%
TES-97	228.406	Geri Tepme Ventili 50mm	AD	7,00	222,00	1.554,00 YTL	0,011%
TES-98	228.408	Geri Tepme Ventili 80mm	AD	4,00	345,60	1.382,40 YTL	0,010%
TES-99	228.409	Geri Tepme Ventili 100mm	AD	3,00	474,00	1.422,00 YTL	0,010%
TES-100	228.410	Geri Tepme Ventili 125mm	AD	5,00	744,00	3.720,00 YTL	0,026%
TES-101	229.103	Emniyet Ventili 25mm	AD	2,00	21,96	43,92 YTL	0,0003%
TES-102	229.302	Emniyet Ventili 40mm	AD	3,00	490,80	1.472,40 YTL	0,010%
TES-103	231.101	Boru Boyanması Süylenle 15-50mm Arası	MT	5.340,00	0,35	1.869,00 YTL	0,013%
TES-104	231.102	Boru Boyanması Süylenle 50-100mm Arası	MT	2.550,00	0,46	1.173,00 YTL	0,008%
TES-105	231.103	Boru Boyanması Süylenle 100-150mm Arası	MT	745,00	0,57	424,65 YTL	0,003%
TES-106	231.104	Boru Boyama 6"-8"	MT	1.120,00	0,76	851,20 YTL	0,006%
TES-107	236.303	Delik Açma ve Kapama	Cm	4.970,00	1,50	7.455,00 YTL	0,052%
TES-108	239.605	Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası; Debisi m3/h : 10 - 15 Basıncı mSS	AD	3,00	1.100,00	3.300,00 YTL	0,023%
TES-109	241.305	PE Esaslı Prefabrik Boru İzolesi 1/2"	MT	442,00	10,10	4.465,97 YTL	0,031%
TES-110	241.310	PE Esaslı Prefabrik Boru İzolesi 3/4"	MT	330,00	10,88	3.591,72 YTL	0,025%
TES-111	241.315	PE Esaslı Prefabrik Boru İzolesi 1"	MT	516,00	12,18	6.284,88 YTL	0,044%
TES-112	241.319	PE Esaslı Prefabrik Boru İzolesi 1 1/4"	MT	536,00	14,77	7.917,79 YTL	0,055%
TES-113	241.323	PE Esaslı Prefabrik Boru İzolesi 1 1/2"	MT	580,00	17,36	10.071,12 YTL	0,070%
TES-114	241.327	PE Esaslı Prefabrik Boru İzolesi 2"	MT	373,00	24,62	9.184,75 YTL	0,064%
TES-115	241.331	PE Esaslı Prefabrik Boru İzolesi 2 1/2"	MT	352,00	25,92	9.123,84 YTL	0,064%
TES-116	241.335	PE Esaslı Prefabrik Boru İzolesi 3"	MT	128,00	51,71	6.618,62 YTL	0,046%
TES-117	241.340	PE Esaslı Prefabrik Boru İzolesi 4"	MT	682,00	58,58	39.954,29 YTL	0,280%
TES-118	251.507	Radyal Vanilatör 8.000 m3/h	AD	4,00	1.755,00	7.020,00 YTL	0,049%
TES-119	251.511	Radyal Vanilatör 20.000 m3/h 150mmss	AD	4,00	3.138,75	12.555,00 YTL	0,088%
TES-120	251.512	Radyal Vanilatör 25.000 m3/h 150mmss	AD	6,00	3.341,25	20.047,50 YTL	0,140%
TES-121	254.202	Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi	AD	5,00	178,25	891,25 YTL	0,006%
TES-122	254.203	Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi	AD	14,00	204,70	2.865,80 YTL	0,020%
TES-123	254.204	Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi	AD	14,00	230,00	3.220,00 YTL	0,023%
TES-124	257.209	Santral Isıtıcısı	AD	7,00	2.175,00	15.225,00 YTL	0,107%



SOĞ.MET.İNS. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Büyükdere Sokak No: 47/2 06680 Kavaklıdere / ANK.
Tel: (0.312) 467 07 26 - 27 Fax: (0.312) 426 91 51
Kavaklıdere Vergi Dairesi: 774 000 3310

MEKANİK İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş Kalemi No	İş Kalemının Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Tutar	Pursantaj Tutar
TES-125	258.211	Santral Soğutucusu	AD	2,00	2.055,00	4.110,00 YTL	0,029%
TES-126	257.212	Santral Soğutucusu	AD	1,00	2.997,00	2.997,00 YTL	0,021%
TES-127	257.213	Santral Soğutucusu	AD	4,00	3.350,00	13.400,00 YTL	0,094%
TES-128	259.1106	Buharlı Nemlendirici	AD	2,00	5.850,00	11.700,00 YTL	0,082%
TES-129	259.1107	Buharlı Nemlendirici	AD	5,00	6.850,00	34.250,00 YTL	0,240%
TES-130	260.601/203	Klima Santrali Hücresi	MT2	288,00	173,00	49.824,00 YTL	0,349%
TES-131	261.101-2	Fanşlı Havalandırma Kanalı 0,50mm	MT2	185,00	46,00	8.510,00 YTL	0,060%
TES-132	261.102-2	Fanşlı Havalandırma Kanalı 0,60mm	MT2	1.465,00	49,00	71.785,00 YTL	0,502%
TES-133	261.103-2	Fanşlı Havalandırma Kanalı 0,75mm	MT2	2.675,00	56,00	149.800,00 YTL	1,048%
TES-134	261.104-2	Fanşlı Havalandırma Kanalı 0,90mm	MT2	4.365,00	68,00	296.820,00 YTL	2,077%
TES-135	261.105-2	Fanşlı Havalandırma Kanalı 1,00mm	MT2	485,00	73,00	35.405,00 YTL	0,248%
TES-136	261.106-2	Fanşlı Havalandırma Kanalı 1,15mm	MT2	108,00	77,00	8.316,00 YTL	0,058%
TES-137	261.200	Silindirik Havalandırma Kanalı Yapılması	MT2	624,00	56,00	34.944,00 YTL	0,245%
TES-138	261.502	Flexibel Borudan Havalandırma Kanalı	MT2	576,00	40,00	23.040,00 YTL	0,161%
TES-139	261.600	Flexibel Borudan Havalandırma Kanalı M.M.B	%	0,35	23.040,00	8.064,00 YTL	0,056%
TES-140	263.304	Hava Damperi	MT2	7,60	491,00	3.731,60 YTL	0,026%
TES-141	263.305	Hava Damperi	MT2	5,55	436,00	2.419,80 YTL	0,017%
TES-142	266.502	Polüüretan yalıtım sınırlı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması	MT2	162,00	42,00	6.804,00 YTL	0,048%
TES-143	267.101/A	Alüminyum Üfleme Menfezi	AD	12,00	30,24	362,88 YTL	0,003%
TES-144	267.102/A	Alüminyum Üfleme Menfezi	AD	17,00	42,34	719,71 YTL	0,005%
TES-145	267.103/A	Alüminyum Üfleme Menfezi	AD	23,00	52,08	1.197,84 YTL	0,008%
TES-146	267.104/A	Alüminyum Üfleme Menfezi	AD	31,00	79,30	2.458,18 YTL	0,017%
TES-147	267.105/A	Alüminyum Üfleme Menfezi	AD	93,00	94,25	8.765,06 YTL	0,061%
TES-148	267.106/A	Alüminyum Üfleme Menfezi	AD	16,00	117,77	1.884,29 YTL	0,013%
TES-149	267.201/A	Alüminyum Emiş Menfezi	AD	22,00	24,86	547,01 YTL	0,004%
TES-150	267.202/A	Alüminyum Emiş Menfezi	AD	28,00	30,58	856,13 YTL	0,006%
TES-151	267.203/A	Alüminyum Emiş Menfezi	AD	14,00	42,00	588,00 YTL	0,004%
TES-152	267.204/A	Alüminyum Emiş Menfezi	AD	26,00	53,76	1.397,76 YTL	0,010%
TES-153	267.205/A	Alüminyum Emiş Menfezi	AD	96,00	79,30	7.612,42 YTL	0,053%
TES-154	267.206/A	Alüminyum Emiş Menfezi	AD	6,00	95,76	574,56 YTL	0,004%
TES-155	267.301	Menfez Damperi	AD	38,00	17,36	659,68 YTL	0,005%
TES-156	267.302	Menfez Damperi	AD	52,00	19,60	1.019,20 YTL	0,007%
TES-157	267.303	Menfez Damperi	AD	43,00	25,20	1.083,60 YTL	0,008%
TES-158	267.304	Menfez Damperi	AD	62,00	28,56	1.770,72 YTL	0,012%
TES-159	267.305	Menfez Damperi	AD	293,00	31,92	9.352,56 YTL	0,065%
TES-160	267.306	Menfez Damperi	AD	24,00	41,72	1.001,28 YTL	0,007%
TES-161	269.103	Alüminyum Panjur	MT2	17,59	200,20	3.521,52 YTL	0,025%
TES-162	270.000	Tel Kafes	MT2	17,59	37,10	652,59 YTL	0,005%
TES-163	272.205	Klima Cihazı 9,0 kw	AD	9,00	5.840,00	52.560,00 YTL	0,368%
TES-164	790.212	Elektrik Motoru	AD	2,00	418,80	837,60 YTL	0,006%
TES-165	790.213	Elektrik Motoru	AD	2,00	507,80	1.015,60 YTL	0,007%
TES-166	790.215	Elektrik Motoru	AD	4,00	856,50	3.426,00 YTL	0,024%
TES-167	790.216	Elektrik Motoru	AD	3,00	1.012,60	3.037,80 YTL	0,021%
TES-168	790.217	Elektrik Motoru	AD	3,00	1.186,90	3.560,70 YTL	0,025%
TES-169	790.218	Elektrik Motoru	AD	2,00	1.605,70	3.211,40 YTL	0,022%
TES-170	451.201	Paslanmaz Çelik Çalışma Tezgahı	MT	32,00	458,20	14.662,40 YTL	0,103%
TES-171	451.203	Paslanmaz Çelik Çalışma Tezgahı	MT	33,00	848,10	27.987,30 YTL	0,196%
TES-172	451.411	Paslanmaz Çelik Eviye Çalışma Tezgahı	MT	40,00	417,00	16.680,00 YTL	0,117%
TES-173	451.614	Paslanmaz Çelik Eviye	AD	34,00	234,20	7.962,80 YTL	0,056%
TES-174	451.701	Paslanmaz Çelik Çekmece İlavesi	AD	75,00	122,30	9.172,50 YTL	0,064%
TES-175	451.801	Paslanmaz Çelik Dolap İlavesi	MT	50,00	388,70	19.435,00 YTL	0,136%
TES-176	451.811	Paslanmaz Çelik Ara Raf İlavesi	MT	50,00	160,10	8.005,00 YTL	0,056%
TES-177	451.901	Paslanmaz Çelik Duvar Dolabı	AD	23,00	718,15	16.517,45 YTL	0,116%
TES-178	457.104	İzgaralı İstif Rafı	MT	44,00	645,00	28.380,00 YTL	0,199%
TES-179	457.105	İzgaralı İstif Rafı	MT	48,00	685,00	32.880,00 YTL	0,230%
TES-180	457.106	İzgaralı İstif Rafı	MT	58,60	735,00	43.071,00 YTL	0,301%
TES-181	477.300	DAVLUMBAZ FİLTRESİZ (Paslanmaz Çelikten)	M2	15,00	469,00	7.035,00 YTL	0,049%
TES-182	477.400	DAVLUMBAZ FİLTRELİ (Paslanmaz Çelikten)	M2	23,00	515,00	11.845,00 YTL	0,083%
TES-183	692.200	Basınçlı hava prizi	AD	23,00	87,00	2.001,00 YTL	0,014%
TES-184	694.1002	Medikal gaz alarm paneli 3 Gaz için	AD	11,00	2.400,00	26.400,00 YTL	0,185%
TES-185	694.1003	Medikal gaz alarm paneli 4 Gaz için	AD	7,00	2.650,00	18.550,00 YTL	0,130%
TES-186	694.1004	Medikal gaz alarm paneli 5 Gaz için	AD	3,00	2.975,00	8.925,00 YTL	0,062%
TES-187	694.1102	Medikal gaz vana kutuları 3 Gaz için	AD	12,00	2.300,00	27.600,00 YTL	0,193%
TES-188	694.1103	Medikal gaz vana kutuları 4 Gaz için	AD	13,00	2.850,00	37.050,00 YTL	0,259%
TES-189	694.1104	Medikal gaz vana kutuları 5 Gaz için	AD	4,00	3.350,00	13.400,00 YTL	0,094%

SOMUT

MÜHÜR
BÜKÜM SOKAK NO: 172 06680 KAVAKLIDERE / ANK.
TEL: (0.312) 487 07 28 27 FAKS: (0.312) 426 91 51
KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ: 774 000 000 000

MEKANİK İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
TES-190	694.1701	Oksijen prizi	AD	32,00	240,00	7.680,00 YTL	0,054%
TES-191	694.1702	Vakum prizi	AD	24,00	240,00	5.760,00 YTL	0,040%
TES-192	226.111	DEBI (AKS) KONTROL CİHAZI	AD	3,00	454,00	1.362,00 YTL	0,010%
TES-193	301.202	Donma Termostadı	AD	7,00	99,70	697,90 YTL	0,005%
TES-194	303.400	Manual reset ilavesi	AD	24,00	93,20	2.236,80 YTL	0,016%
TES-195	308.101	Fark Basınç Presostadı	AD	42,00	256,00	10.752,00 YTL	0,075%
TES-196	308.202	Fark Basınç Presostadı	AD	11,00	268,90	2.957,90 YTL	0,021%
TES-197	315.102	Kanal Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı	AD	7,00	132,80	929,60 YTL	0,007%
TES-198	315.104	Daldırma Tip Elektronik Sıc. Duyar Elemanı	AD	12,00	143,50	1.722,00 YTL	0,012%
TES-199	315.105	Dış Hava Tipi Elektronik Sıc. Duyar Elemanı	AD	2,00	101,80	203,60 YTL	0,001%
TES-200	315.203	Kanal Tipi Nem Duyar Elemanı	AD	7,00	391,00	2.737,00 YTL	0,019%
TES-201	318.300	Elektrik Kesintisi Program ilavesi	AD	7,00	67,50	472,50 YTL	0,003%
TES-202	319.101	Oransal elektronik sıcaklık kontrol paneli	AD	42,00	380,30	15.972,60 YTL	0,112%
TES-203	319.201	Oransal elektronik sıcaklık kontrol paneli	AD	44,00	656,60	28.890,40 YTL	0,202%
TES-204	320.100	Sıcaklık Kompansasyon ilavesi	AD	12,00	183,20	2.198,40 YTL	0,015%
TES-205	320.200	Su-Üfleme Havası Limitleme ilavesi	AD	12,00	169,20	2.030,40 YTL	0,014%
TES-206	320.300	Servomotor Konumu Limitleme ilavesi	AD	14,00	111,40	1.559,60 YTL	0,011%
TES-207	320.400	Yaz Kış Çalışma Durum ilavesi	AD	14,00	177,80	2.489,20 YTL	0,017%
TES-208	320.700	Interlok ilavesi	AD	14,00	108,20	1.514,80 YTL	0,011%
TES-209	320.800	Behir İsi Kademesi ilavesi	AD	142,00	83,50	11.857,00 YTL	0,083%
TES-210	327.101	İki Konumlu Servomotor	AD	4,00	717,60	2.870,40 YTL	0,020%
TES-211	327.201	Denge Rölesiz Servomotor	AD	7,00	809,70	5.667,90 YTL	0,040%
TES-212	327.202	Denge Rölesiz Servomotor	AD	2,00	926,50	1.853,00 YTL	0,013%
TES-213	328.101	Yay Geri Dönüş ilavesi	AD	13,00	264,60	3.439,80 YTL	0,024%
TES-214	328.401	El kumanda potansiyometresi	AD	13,00	137,10	1.782,30 YTL	0,012%
TES-215	331.101	Vana-Servomotor Bağlantı Mekanizması	AD	4,00	199,20	796,80 YTL	0,006%
TES-216	331.102	Vana-Servomotor Bağlantı Mekanizması	AD	9,00	212,10	1.908,90 YTL	0,013%
TES-217	331.201	Damper-Servomotor Bağlantı Mekanizması	AD	10,00	91,10	911,00 YTL	0,006%
TES-218	332.101	Fan-Coll Termostadı	AD	171,00	45,00	7.695,00 YTL	0,054%
TES-219	358.503	Uç yolu, PN-16 flanşlı otomatik vana gövdesi 25 e mm	AD	1,00	563,20	563,20 YTL	0,004%
TES-220	358.505	Uç yolu, PN-16 flanşlı otomatik vana gövdesi 40 e mm	AD	4,00	750,60	3.002,40 YTL	0,021%
TES-221	358.506	Uç yolu, PN-16 flanşlı otomatik vana gövdesi 50 e mm	AD	4,00	843,70	3.374,80 YTL	0,024%
TES-222	358.507	Uç yolu, PN-16 flanşlı otomatik vana gövdesi 65 e mm	AD	5,00	1.075,00	5.375,00 YTL	0,038%
TES-223	358.508	Uç yolu, PN-16 flanşlı otomatik vana gövdesi 80 e mm	AD	5,00	1.350,00	6.750,00 YTL	0,047%
TES-224	701.201	Pano (Kapak Alanı)	AD	5,00	726,00	3.630,00 YTL	0,025%
TES-225	716.301	Elektronik motor koruma cihazı	AD	12,00	57,20	686,40 YTL	0,005%
TES-226	717.101	Tablo arkasına monte edilen lipen otomatik enversör şalter	AD	5,00	147,00	735,00 YTL	0,005%
TES-227	553.307	Kompresör 244 Kw	AD	1,00	43.007,92	43.007,92 YTL	0,301%
TES-228	553.311	Kompresör 350 Kw	AD	2,00	46.700,00	93.400,00 YTL	0,654%
TES-229	553.317	Kompresör 478 Kw	AD	2,00	40.300,00	80.600,00 YTL	0,564%
TES-230	556.817	Kondenser 440 Kw	AD	1,00	26.500,00	26.500,00 YTL	0,185%
TES-231	556.819	Kondenser 700 Kw	AD	6,00	28.000,00	168.000,00 YTL	1,176%
TES-232	562.428	Chiller 925 Kw	AD	1,00	18.500,00	18.500,00 YTL	0,129%
TES-233	562.427	Chiller 830 Kw	AD	1,00	19.500,00	19.500,00 YTL	0,136%
TES-234	566.515	Term.Ex.Valf	AD	2,00	1.452,65	2.925,30 YTL	0,020%
TES-235	572.105	Selenoid valf	AD	2,00	283,70	567,40 YTL	0,004%
TES-236	576.104	Soğutucu akışkan geri tepme ventili	AD	2,00	110,60	221,20 YTL	0,002%
TES-237	577.102	Köşe Tip soğutucu akışkan vanası	AD	2,00	31,50	63,00 YTL	0,0004%
TES-238	577.204	Düz Tip soğutucu akışkan vanası	AD	6,00	54,80	328,80 YTL	0,002%
TES-239	577.208	Düz Tip soğutucu akışkan vanası	AD	4,00	128,30	513,20 YTL	0,004%
TES-240	577.210	Düz Tip soğutucu akışkan vanası	AD	4,00	222,80	891,20 YTL	0,006%
TES-241	579.400	SOĞUK ODA TERMOSTATLARI	AD	3,00	115,30	345,90 YTL	0,002%
TES-242	580.300	Al.Yük.Bas..Presostadı	AD	2,00	176,70	353,40 YTL	0,002%
TES-243	580.400	Al.Yük.Bas..Presostadı	AD	2,00	211,40	422,80 YTL	0,003%
TES-244	583.109	Soğutucu Akışkan Hattı Nem Alıcısı 3200cm3	AD	2,00	188,60	377,20 YTL	0,003%
TES-245	586.103	Gözetleme Camı	AD	2,00	18,90	37,80 YTL	0,0003%
TES-246	590.1406	PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI	AD	6,00	7.350,00	44.100,00 YTL	0,309%
TES-247	590.504	SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI	AD	3,00	1.500,00	4.500,00 YTL	0,031%
TES-248	590.811	MODÜLER TİP SOĞUK ODA PANELLERİ	MT2	65,40	207,00	13.537,80 YTL	0,095%
TES-249	590.831	MODÜLER TİP SOĞUK ODA PANELLERİ	AD	62,50	207,00	12.937,50 YTL	0,091%
TES-250	590.861	MODÜLER TİP SOĞUK ODA PANELLERİ	AD	63,86	343,20	21.916,75 YTL	0,153%
TES-251	591.500	Gaz Temini ve Sarfı	AD	144,00	25,70	3.700,80 YTL	0,026%
TES-252	593.101	SOĞUK ODA TERMOMETRESİ	AD	3,00	24,90	74,70 YTL	0,001%
TES-253	701.201	Pano (Kapak Alanı)	AD	4,00	726,00	2.904,00 YTL	0,020%
TES-254	713.401	Pako şalter	AD	1,00	4,40	4,40 YTL	0,00003%
TES-255	718.201	Kontakör	AD	9,00	46,30	416,70 YTL	0,003%
TES-256	718.204	Kontakör	AD	2,00	194,90	389,80 YTL	0,003%



SOMUT
SOMUT MÜHÜR, İNŞAAT VE SAN. LTD. ŞTİ.
Büyükdere Sokak No: 47/2 06560 Kavaklıdere / ANK.
Teli: (0 312) 487 07 26 - 27 Fax: (0 312) 426 91 51
Kavaklıdere Vergi Dairesi 774 000 3310

MEKANİK İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş Kalemi No	İş Kalemının Adı ve Kısa Açıklaması	Birimli	Miktar	Birim Fiyat	Tutar	Pursantaj Tutar
TES-257	718.302	Zaman Rölesi	AD	6,00	49,90	299,40 YTL	0,002%
TES-258	722.104	Transformatör	AD	1,00	37,40	37,40 YTL	0,00026%
TES-259	724.401	Otomatik Sigorta	AD	1,00	4,60	4,60 YTL	0,00003%
TES-260	790.307	Elektrik Motoru	AD	8,00	253,90	2.031,20 YTL	0,014%
TES-261	TES.Ö.001	Duvardan Askılı Tip Ayaksız Klozet	AD	82,00	325,00	26.650,00 YTL	0,187%
TES-262	TES.Ö.002	Çift Kumandalı, Ayaklı Gömme Rezervuar Seti	AD	82,00	675,00	55.350,00 YTL	0,387%
TES-263	TES.Ö.003	Fotosel Kumandalı Sıcak-Soğuk Batarya	AD	32,00	865,00	27.680,00 YTL	0,194%
TES-264	TES.Ö.004	Pas.Çelik Doklor El Yıkama Ünitesi	MT	9,00	2.830,00	25.470,00 YTL	0,178%
TES-265	TES.Ö.005	Pas.Çelik Kağıt Havluluk	AD	43,00	42,00	1.806,00 YTL	0,013%
TES-266	TES.Ö.006	Pas.Çelik Sıvı Sabun makinası-duvar tipi	AD	92,00	75,00	6.900,00 YTL	0,048%
TES-267	TES.Ö.007	Pas.Çelik Tuvalet Kağıtlığı	AD	82,00	43,00	3.526,00 YTL	0,025%
TES-268	TES.Ö.008	Pas.Çelik Tuvalet fırçalığı	AD	82,00	53,00	4.346,00 YTL	0,030%
TES-269	TES.Ö.009	Fan coil bağlantı parçası	AD	171,00	54,00	9.234,00 YTL	0,065%
TES-270	TES.Ö.010	Plakalı Eşanjör 400.000 kcal/h	AD	3,00	3.850,00	11.550,00 YTL	0,081%
TES-271	TES.Ö.011	Plakalı Eşanjör 500.000 kcal/h	AD	2,00	4.850,00	9.700,00 YTL	0,068%
TES-272	TES.Ö.012	Plakalı Eşanjör 2.400.000 kcal/h	AD	2,00	8.300,00	16.600,00 YTL	0,116%
TES-273	TES.Ö.013	PE Esaslı Prefabrik Boru İzoleli 5"	MT	68,00	42,00	2.856,00 YTL	0,020%
TES-274	TES.Ö.014	PE Esaslı Prefabrik Boru İzoleli 6"	MT	320,00	48,00	15.360,00 YTL	0,107%
TES-275	TES.Ö.015	PE Esaslı Prefabrik Boru İzoleli 8"	MT	86,00	68,00	5.848,00 YTL	0,041%
TES-276	TES.Ö.016	INLINE POMPA 11m3/h	AD	4,00	3.760,00	15.040,00 YTL	0,105%
TES-277	TES.Ö.017	INLINE POMPA 31m3/h	AD	2,00	6.078,00	12.156,00 YTL	0,085%
TES-278	TES.Ö.018	INLINE POMPA 65m3/h	AD	2,00	8.150,00	16.300,00 YTL	0,114%
TES-279	TES.Ö.019	INLINE POMPA 85m3/h	AD	3,00	9.150,00	27.450,00 YTL	0,192%
TES-280	TES.Ö.020	INLINE POMPA 122m3/h	AD	4,00	10.250,00	41.000,00 YTL	0,287%
TES-281	TES.Ö.021	Frekans konvertörülü sirkülasyon pompası 32mss	AD	2,00	1.450,00	2.900,00 YTL	0,020%
TES-282	TES.Ö.022	Tesisat Demontaj işleri	GR.	1,00	8.500,00	8.500,00 YTL	0,059%
TES-283	TES.Ö.023	Mini-Plate Filtre F9/8	AD	22,00	315,00	6.930,00 YTL	0,049%
TES-284	TES.Ö.024	Shut-Off Damper d:100	AD	6,00	425,00	2.550,00 YTL	0,018%
TES-285	TES.Ö.025	Shut-Off Damper d:125	AD	24,00	530,00	12.720,00 YTL	0,089%
TES-286	TES.Ö.026	Shut-Off Damper d:160	AD	32,00	680,00	21.760,00 YTL	0,152%
TES-287	TES.Ö.027	Manuel Volüm Regülatörü d:100	AD	6,00	530,00	3.180,00 YTL	0,022%
TES-288	TES.Ö.028	Manuel Volüm Regülatörü d:125	AD	24,00	610,00	14.640,00 YTL	0,102%
TES-289	TES.Ö.029	Manuel Volüm Regülatörü d:160	AD	32,00	675,00	21.600,00 YTL	0,151%
TES-290	TES.Ö.030	Kutulu, Dişli, Karet Anemostat	AD	78,00	415,00	32.370,00 YTL	0,227%
TES-291	TES.Ö.031	PE Esaslı kanal izolesi 19mm	MT2	3.000,00	38,00	114.000,00 YTL	0,798%
TES-292	TES.Ö.032	Santral Tipi Difiöör	AD	7,00	750,00	5.250,00 YTL	0,037%
TES-293	TES.Ö.033	Santral Tipi Sustunucu 30 Db/A	AD	17,00	835,00	14.195,00 YTL	0,099%
TES-294	TES.Ö.034	Radyoaktif atık tankı	KG	4.150,00	23,00	95.450,00 YTL	0,668%
TES-295	TES.Ö.035	Medikal Tiple Üretilmiş Bakır Boru 12mm	MT	1.800,00	48,00	86.400,00 YTL	0,605%
TES-296	TES.Ö.036	Medikal Tiple Üretilmiş Bakır Boru 15mm	MT	1.600,00	52,00	83.200,00 YTL	0,582%
TES-297	TES.Ö.037	Medikal Tiple Üretilmiş Bakır Boru 22mm	MT	758,00	61,00	46.238,00 YTL	0,324%
TES-298	TES.Ö.038	Medikal Tiple Üretilmiş Bakır Boru 28mm	MT	200,00	66,00	13.200,00 YTL	0,092%
TES-299	TES.Ö.039	Medikal Tiple Üretilmiş Bakır Boru 35mm	MT	134,00	85,00	11.390,00 YTL	0,080%
TES-300	TES.Ö.040	Medikal Tiple Üretilmiş Bakır Boru 42mm	MT	105,00	93,00	9.765,00 YTL	0,068%
TES-301	TES.Ö.041	Medikal Tiple Üretilmiş Bakır Boru 54mm	MT	80,00	115,00	9.200,00 YTL	0,0640%
TES-302	TES.Ö.042	Duvarda monte gaz prizi	AD	14,00	325,00	4.550,00 YTL	0,032%
TES-303	TES.Ö.043	Basınçlı hava fittingi	AD	13,00	325,00	4.225,00 YTL	0,030%
TES-304	TES.Ö.044	H2 Fittingi	AD	6,00	325,00	1.950,00 YTL	0,014%
TES-305	TES.Ö.045	N2 Fittingi	AD	4,00	325,00	1.300,00 YTL	0,0091%
TES-306	TES.Ö.046	CH4 Fittingi	AD	4,00	325,00	1.300,00 YTL	0,0091%
TES-307	TES.Ö.047	HE Fittingi	AD	4,00	325,00	1.300,00 YTL	0,0090%
TES-308	TES.Ö.048	N2/O2 Karışım Gazı Fittingi	AD	2,00	325,00	650,00 YTL	0,005%
TES-309	TES.Ö.049	BSU, BASINÇLI HAVA	AD	2,00	285,00	570,00 YTL	0,004%
TES-310	TES.Ö.050	BSU, H2	AD	2,00	285,00	570,00 YTL	0,004%
TES-311	TES.Ö.051	BSU, N2	AD	2,00	285,00	570,00 YTL	0,004%
TES-312	TES.Ö.052	BSU, CH4	AD	2,00	285,00	570,00 YTL	0,004%
TES-313	TES.Ö.053	BSU, HE	AD	2,00	285,00	570,00 YTL	0,004%
TES-314	TES.Ö.054	BSU, N2/O2	AD	2,00	285,00	570,00 YTL	0,004%
TES-315	TES.Ö.055	2"1 H2 MANIFOLDU	AD	2,00	2.350,00	4.700,00 YTL	0,033%
TES-316	TES.Ö.056	2"1 N2 MANIFOLDU	AD	2,00	2.350,00	4.700,00 YTL	0,033%
TES-317	TES.Ö.057	2"1 CH4 MANIFOLDU	AD	2,00	2.350,00	4.700,00 YTL	0,033%
TES-318	TES.Ö.058	2"1 HE MANIFOLDU	AD	2,00	2.350,00	4.700,00 YTL	0,033%
TES-319	TES.Ö.059	2"1 N2/O2 MANIFOLDU	AD	2,00	2.350,00	4.700,00 YTL	0,033%
TES-320	TES.Ö.060	Frekans Konvertörü 7kw	AD	4,00	4.850,00	19.400,00 YTL	0,136%
TES-321	TES.Ö.061	Frekans Konvertörü 11-15kw	AD	4,00	6.350,00	25.400,00 YTL	0,178%
TES-322	TES.Ö.062	Mikro Proses Kontrol Ünitesi	AD	3,00	4.250,00	12.750,00 YTL	0,089%
TES-323	TES.Ö.063	Ana İşlemci Terminali	AD	2,00	6.385,00	12.770,00 YTL	0,089%
TES-324	TES.Ö.064	Otomasyon sistem program yazılımı	AD	1,00	5.850,00	5.850,00 YTL	0,041%
GENEL TOPLAM						3.968.362,83 YTL	27,773%

SOĞUTMA

SOĞUTMA TİC. A.Ş. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Büyükdere Sokak No: 27/2 06680 Kavaklıdere / ANK.
Tel: (0.312) 487 07 26 - 27 Faks: (0.312) 429 91 51
Kavaklıdere / Ankara

ELEKTRİK İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

İstanbul Kültür Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Kalış Poz No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
EK-01	701.202	Önden kapaklı pano	AD	28,00	1.062,50	29.750,00 YTL	0,208%
EK-02	705.101	Gömme tip sac tablolar 0,05 - 0,10m ² 'ye kadar (0,10 m2 dahil)	AD	62,00	46,75	2.898,50 YTL	0,020%
EK-03	705.102	Gömme tip sac tablolar 0,10 - 0,20m ² 'ye kadar (0,20 m2 dahil)	AD	2,00	55,25	110,50 YTL	0,001%
EK-04	705.103	Gömme tip sac tablolar 0,20 - 0,30m ² 'ye kadar (0,30 m2 dahil)	AD	6,00	72,25	433,50 YTL	0,003%
EK-05	705.105	Gömme tip sac tablolar 0,40 - 0,50m ² 'ye kadar (0,50 m2 dahil)	AD	74,00	106,25	7.862,50 YTL	0,055%
EK-06	710.100	bakır bara temin ve montajı	KG	370,00	21,25	7.862,50 YTL	0,055%
EK-07	715.309	Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter 3 x 100 A.e kadar (Trifaze)	AD	135,00	232,05	31.326,75 YTL	0,219%
EK-08	715.310	Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter 3 x 200 A.e kadar (Trifaze)	AD	26,00	267,75	6.961,50 YTL	0,049%
EK-09	715.311	Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter 3 x 300 A.e kadar (Trifaze)	AD	1,00	709,75	709,75 YTL	0,005%
EK-10	715.312	Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter 3 x 600 A.e kadar (Trifaze)	AD	8,00	1.487,50	11.900,00 YTL	0,083%
EK-11	715.314	Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter 3 x 800 A.e kadar (Trifaze)	AD	6,00	1.785,00	10.710,00 YTL	0,075%
EK-12	715.315	Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter 3 x 400 A.e kadar (Trifaze)	AD	2,00	1.402,50	2.805,00 YTL	0,020%
EK-13	715.317	Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter 3 x 1600 A.e kadar (Trifaze)	AD	3,00	3.888,75	11.666,25 YTL	0,082%
EK-14	715.319	Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter 3 x 2500 A.e kadar (Trifaze)	AD	1,00	7.849,75	7.849,75 YTL	0,055%
5	715.320	Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter 3 x 3200 A.e kadar (Trifaze)	AD	1,00	15.172,50	15.172,50 YTL	0,106%
EK-16	718.507	Kaçak akım koruma şalterleri 4 x 25 A.e kadar (30 m A)	AD	83,00	72,25	5.996,75 YTL	0,042%
EK-17	718.508	Kaçak akım koruma şalterleri 4 x 40 A.e kadar (30 m A)	AD	85,00	76,50	6.502,50 YTL	0,046%
EK-18	718.509	Kaçak akım koruma şalterleri 4 x 63 A.e kadar (30 m A)	AD	34,00	89,25	3.034,50 YTL	0,021%
EK-19	718.528	Kaçak akım koruma şalterleri 4 x 224 A.e kadar (30 m A)	AD	6,00	2.533,00	15.198,00 YTL	0,106%
EK-20	718.564	Pano tipi aşırı gerilim koruyucu	AD	5,00	1.593,75	7.968,75 YTL	0,056%
EK-21	723.401	Otomatik kumandalı merkezli kompanzasyon 400 V.a kadar	KVAR	485,00	38,25	18.551,25 YTL	0,130%
EK-22	724.401	Anahtarlı Otomatik Sigorta 16 A.e kadar	AD	78,00	6,80	530,40 YTL	0,004%
EK-23	724.406	Anahtarlı Otomatik Sigorta Üç fazlı anahtarlı 16 A.e kadar	AD	16,00	21,25	340,00 YTL	0,002%
EK-24	724.407	Anahtarlı Otomatik Sigorta Üç fazlı anahtarlı 40 A.e kadar	AD	32,00	23,80	761,60 YTL	0,005%
EK-25	724.408	Anahtarlı Otomatik Sigorta Üç fazlı anahtarlı 63 A.e kadar	AD	75,00	27,20	2.040,00 YTL	0,014%
EK-26	724.601	Anahtarlı Otomatik Sigorta Üç fazlı anahtarlı 16 A.e kadar	AD	456,00	15,30	6.976,80 YTL	0,049%
EK-27	724.601/A	Anahtarlı Otomatik Sigorta 25 A.e kadar	AD	89,00	12,75	1.134,75 YTL	0,008%
EK-28	724.606	Anahtarlı Otomatik Sigorta 3*16 A.e kadar	AD	16,00	20,40	326,40 YTL	0,002%

ELEKTRİK İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
ELEK-29	724.707	Anahtarlı Otomatik Sigorta 3*40 A.e kadar	AD	58,00	29,75	1.725,50 YTL	0,012%
ELEK-30	724.708	Anahtarlı Otomatik Sigorta 3*63 A.e kadar	AD	26,00	35,70	928,20 YTL	0,006%
ELEK-31	725.102	Voltmetreler 0 -500 V.a kadar	AD	16,00	23,80	380,80 YTL	0,003%
ELEK-32	725.203	Voltmetre Komütatörleri 5 ve daha fazla pozisyonlu	AD	14,00	18,70	261,80 YTL	0,002%
ELEK-33	725.303	Ampermetre 100 - 2000 A.e kadar	AD	45,00	23,80	1.071,00 YTL	0,007%
ELEK-34	725.402	Ölçü Akım Trafosu 501 - 2000/5 A.	AD	34,00	40,80	1.387,20 YTL	0,010%
ELEK-35	725.905	İŞARET LAMBASI 220V.a kadar	AD	185,00	3,40	629,00 YTL	0,004%
ELEK-36	726.301	ANA VE TALİ TABLO TOPRAKLAMA HATTI 4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	MT	2.860,00	2,13	6.077,50 YTL	0,043%
ELEK-37	727.719	ANA HAT VE BESLEME HATTI 3x240 +120/6 mm2	MT	4.215,00	100,00	421.500,00 YTL	2,950%
ELEK-38	742.116	Enkandesan armatür Tip M girilmez armatür	AD	13,00	12,75	165,75 YTL	0,001%
ELEK-39	742.284	Tip U etanjlı floresan armatür U - 2 x 40 W.lık Armatür	AD	84,00	36,55	3.070,20 YTL	0,021%
ELEK-40	742.512	SBPR- 400 W Simetrik reflektörü	AD	23,00	433,50	9.970,50 YTL	0,070%
ELEK-41	742.532	DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRÜ ATY2 - 4 x 18 (Çift parabolik parlak reflektörü)	AD	865,00	68,00	58.820,00 YTL	0,412%
ELEK-42	742.538	DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRÜ ATY8 - 2 x 18 W (Çift Parabolik, reflektörü)	AD	176,00	29,00	5.104,00 YTL	0,036%
ELEK-43	742.565	Ameliyathane Armatürleri ATH-2x36	AD	73,00	242,25	17.684,25 YTL	0,124%
ELEK-44	742.606	10 kVA izolasyon güç panosu	AD	2,00	8.350,00	16.700,00 YTL	0,117%
ELEK-45	751.116	Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı 100 kVA 20 dakikaya kadar akü besleme süreli	AD	9,00	37.650,00	338.850,00 YTL	2,372%
ELEK-46	751.134	Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı 300 kVA 20 dakikaya kadar akü besleme süreli	AD	3,00	97.100,00	291.300,00 YTL	2,039%
ELEK-47	752.114	Mekanik by-pass 300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı için	AD	3,00	7.650,00	22.950,00 YTL	0,161%
ELEK-48	753.113	Paralelleme kiti 300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı için	AD	3,00	4.250,00	12.750,00 YTL	0,089%
ELEK-49	754.101	Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli	AD	1,00	297,50	297,50 YTL	0,002%
ELEK-50	754.102	SNMP yazılımı ve adaptörü	AD	3,00	1.232,50	3.697,50 YTL	0,026%
ELEK-51	782.101	1,5 mm.lık Galvaniz sac kablo kanalı	KG	18.760,00	5,00	93.800,00 YTL	0,656%
ELEK-52	791.311	Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı 3x2,5 mm2	MT	53.850,00	3,50	188.475,00 YTL	1,319%
ELEK-53	791.312	Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı 3x1,5 mm2	MT	18.760,00	3,00	56.280,00 YTL	0,394%
ELEK-54	791.415	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 3x240+120 mm2	MT	1.450,00	144,50	209.525,00 YTL	1,466%
ELEK-55	791.416	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 3x185+95 mm2	MT	850,00	119,00	101.150,00 YTL	0,708%
ELEK-56	791.417	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 3x150+75 mm2	MT	680,00	108,80	73.984,00 YTL	0,518%
ELEK-57	791.418	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 3x120+70 mm2	MT	625,00	80,75	50.468,75 YTL	0,353%
ELEK-58	791.419	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 3x95+50 mm2	MT	850,00	67,00	56.950,00 YTL	0,399%
ELEK-59	791.420	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 3x70+35 mm2	MT	586,00	53,00	31.058,00 YTL	0,217%
ELEK-60	791.421	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 3x50+25 mm2	MT	1.350,00	40,00	54.000,00 YTL	0,378%
ELEK-61	791.422	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 3x35+16 mm2	MT	1.645,00	30,00	49.350,00 YTL	0,345%
ELEK-62	791.423	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 3x25+16 mm2	MT	1.850,00	25,00	46.250,00 YTL	0,324%

ELEKTRİK İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Kelime Poz No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
ELEK-63	791.424	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 4x16 mm2	MT	1.234,00	16,00	19.744,00 YTL	0,138%
ELEK-64	791.425	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 4x10 mm2	MT	5.340,00	11,00	58.740,00 YTL	0,411%
ELEK-65	791.426	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 4x6 mm2	MT	3.670,00	10,20	37.434,00 YTL	0,262%
ELEK-66	791.427	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 4x4 mm2	MT	7.650,00	7,00	53.550,00 YTL	0,375%
ELEK-67	791.428	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 4x2.5 mm2	MT	7.700,00	6,80	52.360,00 YTL	0,366%
ELEK-68	791.439	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 1x6 mm2	MT	7.350,00	4,25	31.237,50 YTL	0,219%
ELEK-69	791.440	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 1x10 mm2	MT	7.650,00	5,95	45.517,50 YTL	0,319%
ELEK-70	791.441	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 1x16 mm2	MT	4.560,00	8,50	38.760,00 YTL	0,271%
ELEK-71	791.442	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 1x25 mm2	MT	980,00	12,75	12.495,00 YTL	0,087%
ELEK-72	791.447	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 1x120 mm2	MT	1.320,00	27,20	35.904,00 YTL	0,251%
ELEK-73	791.450	1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı 1x240 mm2	MT	875,00	40,80	35.700,00 YTL	0,250%
ELEK-74	794.301	Etanj aydınlatma sortisi	AD	380,00	51,00	19.380,00 YTL	0,136%
ELEK-75	794.302	Komutator Sorti	AD	164,00	67,15	11.012,60 YTL	0,077%
ELEK-76	794.303	Vavien Sorti	AD	176,00	106,25	18.700,00 YTL	0,131%
ELEK-77	794.304	Paralel Sorti	AD	743,00	29,75	22.104,25 YTL	0,155%
ELEK-78	796.103	Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigon (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi.	AD	938,00	52,70	49.432,60 YTL	0,346%
ELEK-79	818.104	Bina içerisinde ana hat tesisatı 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18	MT	145,00	2,13	308,13 YTL	0,002%
ELEK-80	818.106	Bina içerisinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.) 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26	MT	376,00	3,40	1.278,40 YTL	0,009%
ELEK-81	818.108	Bina içerisinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.) 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37	MT	187,00	5,95	1.112,65 YTL	0,008%
ELEK-82	818.207	Bina haricinde ana hat tesisatı 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	MT	545,00	8,50	4.632,50 YTL	0,032%
ELEK-83	819.101	Telefon dağıtım kutuları 10 Çifte kadar	AD	172,00	23,80	4.093,60 YTL	0,029%
ELEK-84	819.201	Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları 20 Çifte kadar	AD	4,00	55,25	221,00 YTL	0,002%
ELEK-85	819.203	Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları 50 Çifte kadar	AD	9,00	80,75	726,75 YTL	0,005%
ELEK-86	819.206	Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları 200 Çifte kadar	MT	4,00	276,25	1.105,00 YTL	0,008%
ELEK-87	819.302	Plastik Etanj telefon dağıtım kutuları 50 Çifte kadar	AD	5,00	106,25	531,25 YTL	0,004%
ELEK-88	880.3001	LIH(S)H HALOJEN FREE SINYAL ve KUMANDA KABLOSU 2x2x0.22 mm2	MT	4.675,00	2,13	9.934,38 YTL	0,070%
ELEK-89	833.303	Analog adresli yangın alarm santrali 4 çevrimli, 48 bölge analog adresli yangın alarm santrali 508 adres kapasiteli, 48 yangın bölgesi göstergeli	AD	1,00	8.075,00	8.075,00 YTL	0,057%
ELEK-90	833.304	Analog adresli yangın alarm santrali Network arabirim kartı (her santrale veya tekrarlayıcı panele 1 adet yerleştirilecek) 32 adet analog adresli yangın alarm santrali ve tekrarlayıcı panel network ağında çalışabilmelidir.	AD	1,00	1.657,50	1.657,50 YTL	0,012%
ELEK-91	833.305	Termal mini printer	AD	1,00	1.644,75	1.644,75 YTL	0,012%
ELEK-92	833.403	Analog adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli 48 bölge analog adresli yangın alarm tekrarlayıcı paneli	AD	1,00	6.655,50	6.655,50 YTL	0,047%

ELEKTRİK İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
ELEK-93	833.500	Analog adresli optik duman detektörü	AD	173,00	208,25	36.027,25 YTL	0,252%
ELEK-94	833.555	Analog adresli yangın ihbar butonu	AD	25,00	187,00	4.675,00 YTL	0,033%
ELEK-95	833.580	Analog adresli kısa devre izalatör modülü	AD	29,00	276,25	8.011,25 YTL	0,056%
ELEK-96	833.590	Dahili elektronik yangın ihbar sireni	AD	25,00	170,00	4.250,00 YTL	0,030%
ELEK-97	833.686	Sürekli yanar acil durum yönlendirme armatürü 3 saat süreli, çift yüzü sürekli yanar acil durum yönlendirme armatürü	AD	31,00	208,25	6.455,75 YTL	0,045%
ELEK-98	833.699/2	Acil Durum Aydınlatma Kiti 20 w 4uçlu floresan lambalar için, 3 saat süreli,	AD	33,00	89,25	2.945,25 YTL	0,021%
ELEK-99	838.211	SES KONTROL VE KAYIT MİKSERİ 12 kanal Ses Mikseri	AD	4,00	667,25	2.669,00 YTL	0,019%
ELEK-100	838.242	CD ÇALAR Besli CD Çalar	AD	4,00	463,25	1.853,00 YTL	0,013%
ELEK-101	838.250	KASET ÇALAR	AD	4,00	454,75	1.819,00 YTL	0,013%
ELEK-102	840.102	3 - 5 W.lık çift taraflı hoparlör.	AD	165,00	23,80	3.927,00 YTL	0,027%
ELEK-103	841.102	Potansiyometre Kanal seçici (0çü)	AD	153,00	5,95	910,35 YTL	0,006%
ELEK-104	842.101	Masa tipi mikrofon	AD	4,00	71,40	285,60 YTL	0,002%
ELEK-105	844.106	Amplifikatör 300 W 1ık	AD	4,00	765,00	3.060,00 YTL	0,021%
ELEK-106	845.103	Televizyon sortisi	AD	32,00	13,60	435,20 YTL	0,003%
ELEK-107	845.107	Televizyon anteni 17 Elemanlı Anten	AD	4,00	55,25	221,00 YTL	0,002%
ELEK-108	845.202	Televizyon kolektif anten santrali Anten kazancı 21- 40 db, olan santral	AD	4,00	208,25	833,00 YTL	0,006%
ELEK-109	880.1256	RACK KABİNER Şunucu kabinler	AD	8,00	1.062,50	8.500,00 YTL	0,059%
ELEK-110	880.1273	RACK KABİNER Sabit raf 800 mm derinlik için	AD	8,00	21,25	170,00 YTL	0,001%
ELEK-111	880.1276	RACK KABİNER Hareketli raf 800 mm derinlik için	AD	8,00	46,75	374,00 YTL	0,003%
ELEK-112	880.1280	RACK KABİNER Termostatlı fan modülü (2 fanlı)	AD	8,00	80,75	646,00 YTL	0,005%
ELEK-113	880.1282	RACK KABİNER 19 rack tipi 3 lü grup priz anahtarı	AD	8,00	19,55	156,40 YTL	0,001%
ELEK-114	880.1289	RACK KABİNER 19 1U yatay kablo düzenleyici	AD	8,00	17,85	142,80 YTL	0,001%
ELEK-115	880.2001	JH(S)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOSU 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	MT	13.450,00	1,70	22.865,00 YTL	0,160%
ELEK-116	880.3014	LIH(S)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU 2x2x0.34 mm2	MT	3.650,00	2,13	7.756,25 YTL	0,054%
ELEK-117	880.3189	LIH(S)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU 2X1.5 mm2	MT	14.500,00	3,40	49.300,00 YTL	0,345%
ELEK-118	880.3190	LIH(S)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU 3X1.5 mm2	MT	3.875,00	3,83	14.821,88 YTL	0,104%
ELEK-119	880.3191	LIH(S)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU 4X1.5 mm2	MT	2.456,00	4,25	10.438,00 YTL	0,073%
ELEK-120	880.402	Koaksiyal Kablolar RG 6 A/U-2 75	MT	905,00	2,55	2.307,75 YTL	0,016%
ELEK-121	880.505	Splitters (Bölücü) 1/8 12,0	AD	8,00	29,75	238,00 YTL	0,002%
ELEK-122	880.5611	Utp Cat5H HALOJEN FREE 4X2X24	MT	7.350,00	1,70	12.495,00 YTL	0,087%
ELEK-123	880.5631	Utp Cat5H HALOJEN FREE 4X2X23	MT	13.950,00	2,55	35.572,50 YTL	0,249%
ELEK-124	880.567	Utp Cat5e Sıva Üstü Tekli Priz	AD	275,00	6,80	1.870,00 YTL	0,013%
ELEK-125	880.579	Utp Cat5e Patch Panel 48 Portlu	AD	8,00	246,50	1.972,00 YTL	0,014%

ELEKTRİK İMALATLARI PURSANTAJ ORANLARI CETVELİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Eksik İşlerin Tamamlanması Ve I. Kısımın Tadilat Ve Büyük Onarımları

Teklif Poz No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Tutarı	Pursantaj Tutarı
ELEK-126	880.565	Utp Cat6 Patch Panel 48 Portlu	AD	63,00	722,50	45.517,50 YTL	0,319%
ELEK-127	880.603	MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO 6 core MM Zırhlı F/O Kablo	MT	645,00	4,25	2.741,25 YTL	0,019%
ELEK-128	880.633	MM SC pigtail	AD	3,00	23,80	71,40 YTL	0,0005%
ELEK-129	880.875	Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi 6 Fiber Kapasiteli ST / MM	AD	243,00	12,00	2.916,00 YTL	0,020%
ELEK-130	880.963	PVC KABLO KANALLARI 40 x 17- 74 x 21 mm' ye kadar	AD	60,00	16,15	969,00 YTL	0,007%
ELEK-131	880.964	PVC KABLO KANALLARI 101 x34 mm	MT	87,00	25,50	2.218,50 YTL	0,015%
ELEK-132	880.971	KABLO KANAL PRİZLERİ	AD	324,00	9,35	3.029,40 YTL	0,021%
ELEK-133	911.371	Sınıf III asansörü 2 Duraklı 063/0.15 m/sn hızlı	AD	2,00	70.000,00	140.000,00 YTL	0,980%
ELEK-134	917.102	Toplamalı kumanda donanımı 5 Duraklı	AD	2,00	2.635,00	5.270,00 YTL	0,037%
ELEK-135	918.102	Grup kumanda donanımı 5 Duraklı	AD	2,00	1.572,50	3.145,00 YTL	0,022%
ELEK-136	921.200	İLAVE DURAK KAPILARI	AD	2,00	1.105,00	2.210,00 YTL	0,015%
ELEK-137	921.405	TAM OTOMATİK KABIN KAPILARI	AD	2,00	4.835,00	9.670,00 YTL	0,068%
ELEK-138	922.300	KAT YÜKSEKLİK FİYAT FARKI	AD	2,00	293,25	586,50 YTL	0,004%
ELEK-139	923.104	KADEMESİZ HIZ AYARLI (FREKANS KONTROLLÜ-VF) TAHRİK FİYAT FARKI	AD	2,00	15.937,50	31.875,00 YTL	0,223%
ELEK-140	923.202	ACIL KURTARMA GÜÇ TERTİBATI FİYAT FARKI	AD	2,00	3.697,50	7.395,00 YTL	0,052%
ELEK-141	923.300	KABIN İÇ YÜZEYİNİN SATINE PASLANMAZ ÇELİK SAC KAPLAMA FİYAT FARKI	MP	32,00	340,00	10.880,00 YTL	0,076%
ELEK-142	923.400	İŞİN PERDESİ FİYAT FARKI	AD	2,00	1.700,00	3.400,00 YTL	0,024%
ELEK-143	950-121	1000 KVA DİZEL ELEKTROJEN GRUBU	AD	1,00	112.812,50	112.812,50 YTL	0,790%
ELEK-144	951-105	1000 KVA OTOMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI	AD	1,00	4.122,50	4.122,50 YTL	0,029%
ELEK-145	981.101	YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI 50 mm2 elektrolitik bakır tel	MT	8.340,00	10,00	83.400,00 YTL	0,583%
ELEK-146	983.102	YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır	AD	86,00	162,00	13.932,00 YTL	0,097%
ELEK-147	ELEK.Ö.001	1*16 A. KADAR DARBE AKIM ANAHTARI	AD	65,00	49,30	3.204,50 YTL	0,022%
ELEK-148	ELEK.Ö.002	DEKORATİF TOPRAKLI PRİZ	AD	985,00	6,80	6.698,00 YTL	0,047%
ELEK-149	ELEK.Ö.003	DEKORATİF NORMAL ANAHTAR	AD	345,00	4,25	1.466,25 YTL	0,010%
ELEK-150	ELEK.Ö.004	DEKORATİF KOMÜTATÖR ANAHTAR	AD	142,00	6,80	965,60 YTL	0,007%
ELEK-151	ELEK.Ö.005	DEKORATİF VAEVİEN ANAHTAR	AD	345,00	5,10	1.759,50 YTL	0,012%
ELEK-152	ELEK.Ö.006	TV AMPLİFİKATÖRÜ	AD	4,00	471,75	1.887,00 YTL	0,013%
ELEK-153	ELEK.Ö.007	PATCH CORD 1 MT	AD	134,00	5,10	683,40 YTL	0,004%
ELEK-154	ELEK.Ö.008	PATCH CORD 3 MT	AD	134,00	7,65	1.025,10 YTL	0,007%
ELEK-155	ELEK.Ö.009	MCC PANOLARI MALZEMELİ	SET	31,00	4.397,00	136.307,00 YTL	0,954%
ELEK-156	ELEK.Ö.010	REGÜLATÖR 100KVA	AD	4,00	11.900,00	47.600,00 YTL	0,333%
ELEK-157	ELEK.Ö.011	DEKORATİF APLİK	AD	63,00	276,25	17.403,75 YTL	0,122%
ELEK-158	ELEK.Ö.012	DIMMERLİ ARMATÜR	AD	58,00	276,25	16.022,50 YTL	0,112%
ELEK-159	ELEK.Ö.013	3X1600 A TRANSFER SWİÇİ	AD	1,00	27.200,00	27.200,00 YTL	0,190%
ELEK-160	ELEK.Ö.014	3X1600 TERMİK MANYETİK ŞALTER 65 'KA	AD	2,00	6.672,50	13.345,00 YTL	0,093%
ELEK-161	ELEK.Ö.015	3X1250 TERMİK MANYETİK ŞALTER 65 'KA	AD	2,00	4.122,50	8.245,00 YTL	0,058%
ELEK-162	ELEK.Ö.016	3X1000 TERMİK MANYETİK ŞALTER 42 'KA	AD	3,00	3.400,00	10.200,00 YTL	0,071%
ELEK-163	ELEK.Ö.017	3X800 TERMİK MANYETİK ŞALTER 42 'KA	AD	1,00	2.932,50	2.932,50 YTL	0,020%
ELEK-164	ELEK.Ö.018	3X630 TERMİK MANYETİK ŞALTER 42 'KA	AD	2,00	2.932,50	5.865,00 YTL	0,041%
GENEL TOPLAM						4.065.014,88 YTL	28,450%

Sayı : 17

Tarih : 26/01/2009

MUAYENE KOMİSYON RAPORU

12.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine dair yönetmelik 13/07/2007 tarih ve 26 sayılı siparişle MARUBENİ EUROPE PLC firmasından 130707 no'lu faturada cins miktarı yazılı 1 kalem malzeme Komisyonumuzca muayene edilmiş olup, şartname sipariş niteliklerine uygundur.

KOMİSYON BAŞKANI
Prof. Dr. Şuayip YALÇIN
Onkoloji Hastanesi Başhekimisi

ÜYE
Ertuğrul KALE
Onkoloji Hastanesi Müdürü

ÜYE
Meral KIRAZLI
Onkoloji Hast.Md.Yrd.

Marubeni Europe plc Düsseldorf Branch



IMMERMANNSTR. 45
DEUTSCH-JAPANISCHES
CENTER
40210 DÜSSELDORF

Postfach 10 36 64
40027 DÜSSELDORF
TEL-NR. (0211) 3671-0
TELEFAX (0211) 3671-325
Internet: www.europe.marubeni.com

RUBENI EUROPE PLC • Postfach 10 36 64 • 40027 DÜSSELDORF

For Account And Risk Of:
HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU
ANKARA-TURKEY

End Destination:
HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU
ANKARA-TURKEY

Invoice No. / Rechnung Nr.: FE130707

Date / Datum: 13.07.2007

Our Reference: HU-JUL-07-HERMES-II

LC Number: 01156AKR44749

Shipped from/Verschiffung von:
Moenchengladbach, Germany

Mode of Transport:
Truck

Contract No./Vertrags Nr.:

Contract Date / Vertrags Datum:
02.08.2001.

In respect of the above-referenced Contract signed on 02.08.2001
WE HEREBY request you to pay the following sum to us

CORRESPONDING TO PARTIAL SHIPMENT OUT OF
74 ITEMS OF MACHINERY, MATERIAL AND EQUIPMENT. CIP ANKARA TURKEY

Item List No.	Item Code	Description (English)	Qty	Model	Price (€)	US\$	Euro Counter-value (for Customs purposes, only)
175	HKS 1	Air condition system	1	MEDICLEAN/KWH Hygiene	1,266,496.00		1,266,496.00
TOTAL					1,266,496.00		1,266,496.00

EURO TOTAL

1,266,496.00 Euro

TOTAL (EURO COUNTER-VALUE) for Customs purposes only 1,266,496.00 Euro

AMOUNT PAYABLE UNDER LC No. 01156AKR44749)

1,076,521.60 Euro

[= 85% x 1,266,496.00 Euro]

For and on behalf of
Marubeni Europe plc

[Authorized Signature]

London (Headquarters)
Marubeni Europe plc
20 Moorgate
London
EC2M 6SS
UK

Hamburg Branch
Marubeni Europe plc
Stadthausbrücke 7
20355 Hamburg
Germany

Berlin Office
Marubeni Europe plc
Bornholmer Strasse 7
10439 Berlin
Germany

Bankverbindungen:

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.
IBAN: DE94 3001 0700 0000 0150 81
SWIFT Code: BOTK DEDX
Konto-Nr.: 511-015 081 (BLZ 300 107 00)

Deutsche Bank AG
IBAN: DE94 3007 0010 0319 4701 00
SWIFT Code: DEUT 3333
Konto-Nr.: 3 194 701 (BLZ 300 700 10)

Registergericht Düsseldorf, HRB 37814
Geschäftsführer: Mr. Hitoshi Sakamoto

UST-ID-Nr.: DE 811 357 225

Paris Branch
Marubeni Europe plc
1, Boulevard de la Madeleine
75001 Paris
France

Milan Branch
Marubeni Europe plc
Viale Della Liberazione 18
20124 Milan
Italy

Stockholm Branch
Marubeni Europe plc
Kungsgatan 33, (8th floor)
SE-111 58 Stockholm
Sweden

RESMİ KULLANIMA MAHSUS

		G.T.L.P.	Eşya No	Eşya No	Eşya No
A. Kıymet- Hesabın Temel Unsuru		11. (a) Döviz cinsine göre (tutarıda yer alan net SATIŞ FİYATI) (gümrük kıymetinin tespit edilme aşamasında) gerçekleştirilen ödemeler ve ödenecek fiyat) (b) Döviz Ödemeleri (Bkz. 8 (b)) 1.266.496,00 TL (Döviz Kuru : 1,7157 TL) (Döviz Kuru : 1,7157 TL)			
B. İZLEMLER		12. TOPLAM (A) (n Olarak) 2.172.928,00 TL			
Yukarıda (A) ya ilave edilmiş TL cinsinden maliyet unsurları (*)		13. Alıcı tarafından üstlenilen giderler (a) Satılma komisyonları dışındaki komisyonlar (b) Tellefiye (c) Kap ve Ambalaj Bedeli			
Bu konuda Gümrük İstisnası önceden verilmiş bir karar var mı? Belirtiliniz		14. İthal eşyasının üretiminde ve ihrac amacıyla satışta kullanılmak üzere dışı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatla karşılaştırılmış olan aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin kıymetlerinden çıkarılacak uygun miktardaki pay: (a) İthal eşyasına katılan malzeme, aksesuar, parça ve benzerleri (b) İthal eşyasının üretiminde kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler (c) İthal eşyasının üretiminde kullanılan maddeler (d) İthal eşyasının üretiminde kullanılan ve ithal ülkesi dışında üretilen mühendislik, geliştirme, satış ve çizim çalışmaları, plan ve testler hazırlama hizmetleri			
		15. Royalti ve lisans ücretleri (Bkz. 9 (c))			
		16. İthal eşyasının tek bir satış ve diğer herhangi bir şekilde elde edilmesi için sağlanan doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya ilişkin diğer kısımlar (Bkz. 9 (b))			
		17. (a) İthal eşyasının gümrük liman veya mahalline kadar yapılan (i) Nakliye (ii) Boyama ve etiketleme giderleri (b) Sigorta giderleri			
		18. TOPLAM (B)			
C. İNDİKİMLER		19. Varsa İthal eşyası için gümrük mahallinden sonra yapılan nakliye giderleri			
(A) ya ilave edilmiş ancak gerçekte ödenen veya ödenecek		20. Varsa İthal eşyası için İthalattan sonra yapılan inşaat, kurulum, montaj, bakım ve teknik yardımlara ilişkin giderler			
Ödenecek		21. Varsa diğer ödemeler 2.000,00 TL (Nakliye belirlenmiştir)			
İyileştirme aydınlatma binaları ve tesisleri		22. Eşyasın ithali veya satış nedeniyle Türkiye'de ödenecek gümrük vergileri ile diğer vergi, harç ve fonlar			
Kısıtlı TL cinsinden maliyet unsurları (*)		23. TOPLAM (C)			
24. BEYAN EDİLECEK KİTAP (A+B-C) 2.174.928,00 TL					

(*) Söz konusu maliyet unsurları döviz cinsinden ödenmiş veya ödenecek ise, 11 nolu kütüde belirtilen kur üzerinden, her bir eşya için TL'ye çevirmek suretiyle beyan ediniz.

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

1. Ausführer (Name, vollständige Anschrift, Staat) FOR AND ON BEHALF OF MARUBENI EUROPE PLC. DÜSSELDORF BRANCH IMMERMANNSTR. 45 40210 DÜSSELDORF	A.TR. Nr. AR 148203 2. Frachtpapier (Ausfüllung freigestellt) Nr. _____ vom _____	
3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Staat) (Ausfüllung freigestellt) HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU REKTORLUGU TK ANKARA Türkei	4. ASSOCIATION zwischen der EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT und der TÜRKEI	
7. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) Straßenverkehr	5. Ausführstaats EG	6. Bestimmungsstaat ¹⁾ Türkei
	8. Bemerkungen	

9. Laufende Nr.	10. Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke (bei lose geschütteten Waren je nach Fall Name des Schiffes, Waggon- oder Kraftwagennummer); Warenbezeichnung	11. Rohgewicht (kg) oder andere Maße (hl, m³, etc.)
1	Gesamtendung Marubeni FE130707, bestehend aus 4 Colli Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen - Ursprung: Deutschland	6614,0kg

12. BESCHEINIGUNG DER ZOLLSTELLE Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt. Ausfuhrpapier: ²⁾ AE 6066743 Art/Muster: _____ Nr. _____ vom: _____ Zollstelle: Mönchengladbach Ausstellender Staat: Bundesrepublik Deutschland Mönchengladbach 12.07.2007 (Ort und Datum) <i>[Signature]</i> (Unterschrift)	13. ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS Der Unterzeichner erklärt, daß die vorgenannten Waren die Voraussetzungen erfüllen, um diese Bescheinigung zu erlangen. Mönchengladbach 13.07.07 <i>[Signature]</i> (Ort und Datum) MICHAEL ZINTEL <i>[Signature]</i> (Unterschrift)



CERTIFICATE OF MARINE INSURANCE

NIPPONKOA INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED

CANTADORSTRASSE 3, 40211 DÜSSELDORF, GERMANY, PHONE: 02 11-17 86 70, FAX: 02 11-16 22 66

Amount EUR 1.393.145,60 Certificate No. NED/C/ 00289 Export No. MGE-02532

This Certificate of Insurance Witnesseth, that on 13.07.2007 and in consideration of premiums for EUR 8.358,87 0,60% (x x x) as agreed to be paid, we, the undersigned, did make Insurance and cause HACETTEPE UNIVERSITY REKTORLUGU ANKARA, TURKIYE to be Assured, for account of whom it may concern.

In the sum of the same as Amount Insured.

On MEDICAL EQUIPMENT SUBJECT TO INVOICE FE13Q707
Per TRUCK Sailing (Leaving) or B/L Date 13.07.07 Valued at sum insured.
At and From: NED Moencengladbach Warehouse Via: --
To: CUSTOMS OFFICE ESENOGA AIRPORT ANKARA, TURKIYE

This certificate represents and takes the place of Open Policy No. NKE-D-2002-10, in the name of Nippon Express (Deutschland) GmbH and has been issued in accordance with the COMPANY'S standard form of contract. All rights of the original policy holder are conveyed to the holder of this certificate. Losses, if any, shall be payable to the order of the Assured hereon upon surrender of this certificate.

Conditions:

Claims to be adjusted according to the terms of the Policy which contains, inter alia the following clauses:

Institute Cargo Clauses (A), Institute War Clauses (Cargo), Institute Strike Clauses (Cargo), Institute Cargo Clauses (Air), (excluding sending by post) (applying to air cargo), Institute War Clauses (Air Cargo), (excluding sending by post) (applying to air cargo), Institute Strikes Clauses (Air Cargo) (applying to air cargo), Institute Replacement Clause (applying to machinery), Institute Classification Clause, Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause, Cargo ISM Endorsement, Termination of Transit Clause (Terrorism)

Marks and Numbers

LC NUMBER: 01156aKR44749

THIS CERTIFICATE IS
issued IN ONE ORIGINAL
AND TWO COPIES ONLY.

MADE OUT TO THE ORDER
OF THE APPLICANT COVERING
THE GOODS AGAINST ALL RISKS:

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, it is specially understood and agreed that,

1. In respect of automobile, any claim for scratching is not covered by this insurance unless caused by the vessel or craft being stranded, sunk, burnt or in collision.
2. Where any insured item consists of articles in a pair or set this insurance is not to pay more than the value of any particular part or parts which may be lost or damaged, without reference to any special value which such article or articles may have as part of such pair or set; nor more than a proportionate part of the insured value of the pair or set.
3. In the event of loss or damage to the labels arising from risks covered hereunder, this company shall pay the cost of relabelling and repacking.

ANY LOSS OF OR DAMAGE to the goods hereby insured must be promptly reported to:

() NIPPON EXPRESS CO. LTD Branch

(x x) NIPPON EXPRESS (D) GmbH
MARIE-BERNAYS-RING 23, 41199 MOENCHENGLADBACH

and settlement to be made in accordance with German law and practice

IN WITNESS WHEREOF, this certificate shall not be valid unless signed by a duly authorised representative of the Company and countersigned by NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GmbH. This insurance is subject to English jurisdiction.

Countersigned: NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GmbH
Düsseldorf Ocean Cargo Branch
Mönchengladbach Distribution Center
Klausanschrift: Marie-Bernays-Ring 23
41199 Mönchengladbach
Postanschrift: Postfach 30 03 51
41033 Mönchengladbach
by MICHAEL ZENDEL
Telefon 021 86/906-6
Fax: 021 86/906-995

NIPPONKOA INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED

SEE IMPORTANT INSTRUCTIONS ON REVERSE

Marubeni Europe plc Düsseldorf Branch



IMMERMANNSTR. 45
DEUTSCH-JAPANISCHES
CENTER
40210 DÜSSELDORF

Postfach 10 36 64
40027 DÜSSELDORF
TEL-NR. (0211) 3671-0
TELEFAX (0211) 3671-325
Internet: www.europe.marubeni.com

MARUBENI EUROPE PLC • Postfach 10 36 64 • 40027 DÜSSELDORF

For Account And Risk Of:
HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU
ANKARA-TURKEY

End Destination:
HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU
ANKARA-TURKEY

Packing List

Invoice No. / Rechnung Nr.: FE130707

Date / Datum: 13.07.2007

Our Reference: HU-JUL-07-HERMES-II

LC Number: 01156AKR44749

Shipped from/Verschiffung von:
Moenchengladbach, Germany

Mode of Transport:
Truck

Contract No./Vertrags Nr.:

Contract Date / Vertrags Datum:
02.08.2001

PAGE : 1 of 1

CASE NO. : 1 to 4

WEIGHT	NET: KGS	GROSS: 6,614 KGS															
CONTENTS																	
ITEM LIST NO. / CODE	DESCRIPTION	QUANTITY															
175 HKS 1	MACHINERY, MATERIAL AND EQUIPMENT. (PER INVOICE)	4 pallets Total = 4 pallets <table><tr><th>L</th><th>W</th><th>H</th></tr><tr><td>2.600</td><td>2.400</td><td>2.310</td></tr><tr><td>2.600</td><td>2.400</td><td>2.310</td></tr><tr><td>2.600</td><td>2.400</td><td>2.310</td></tr><tr><td>2.300</td><td>2.100</td><td>2.310</td></tr></table>	L	W	H	2.600	2.400	2.310	2.600	2.400	2.310	2.600	2.400	2.310	2.300	2.100	2.310
L	W	H															
2.600	2.400	2.310															
2.600	2.400	2.310															
2.600	2.400	2.310															
2.300	2.100	2.310															

For and on behalf of
Marubeni Europe plc

[Signature]
[Authorized Signature]

London (Headquarters)
Marubeni Europe plc
120 Moorgate
London
EC2M 6SS
UK

Hamburg Branch
Marubeni Europe plc
Stadthausbrücke 7
20355 Hamburg
Germany

Berlin Office
Marubeni Europe plc
Bornholmer Strasse 7
10439 Berlin
Germany

Paris Branch
Marubeni Europe plc
5, Boulevard de la Madeleine
75001 Paris
France

Milan Branch
Marubeni Europe plc
Viale Della Liberazione 18
20124 Milan
Italy

Stockholm Branch
Marubeni Europe plc
Kungsgatan 33, (8th floor)
SE-111 56 Stockholm
Sweden

Bankverbindungen:

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.
IBAN: DE64 3001 0700 0000 0150 81
SWIFT Code: BOTK DE33
Konto-Nr.: 511-015 081 (BLZ 300 107 00)

Deutsche Bank AG
IBAN: DE94 3007 0010 0319 4701 00
SWIFT Code: DEUT 3333
Konto-Nr.: 3 194 701 (BLZ 300 700 10)

Registriergericht Düsseldorf, HRB 37614
Geschäftsführer: Mr. Hiroshi Sakamoto

UST-ID-Nr.: DE 811 357 225



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

SAYI : B 14 4 İLM 0 06 00 02/02
KONU : Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri

02.08.07 31620

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA

İLGİ : 01.08.2007 tarih ve 17645 varide sayılı yazınız.

Üniversiteniz, ihtiyacında kullanılmak üzere ithal edilmek istenilen 13.07.2007 tarihli ve FE130707 no'lu faturada yer alan 1 adet **MEDICLEAN/KWH HYGIENE** için, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 18 nci maddesine göre garanti belgesi düzenlenmesine gerek görülmemektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Abdullah EMİR
İl Müdürü a.
İl Müdür Yardımcısı



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kimya Mühendisliği Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara

Tarih : 03.08.2007

Sayı : 100 - 687

ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

İlgi: Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 03.08.2007 tarih ve 52-13921 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 03.09.2007 tarih ve sayılı yazısında, Üniversitemiz Onkoloji Hastanesinde kullanılacak olan "Ameliyathaneler İçin Havalandırma Sistemleri-Kompakt Klima Santrali-Weiss Sistem" de floro kloro karbon gazının bulunup bulunmadığının bildirilmesi istenmiştir. İlgide kayıtlı yazının ekinde bulunan cihaz katoloğu incelenmiş ve cihazın DIN 1946 Bölüm 4 normuna uygun olarak imal edildiği anlaşılmıştır. DIN normuna göre üretilen klima cihazlarında Atmosfere salınması sakıncalı olan floro kloro karbon gazları bulunmaz. Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ahmet R. Özçural
Bölüm Başkan Vekili

08.08.2007

TUTANAK

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne dış kredi ile alınan Makine Ekipman ve Malzemelerin ilk yüklemeğinde (İkinci Tır – Hijyenik Klima Sistemi) muhtelif ebatlarda ...~~4 (Dört)~~..... adet koli kapalı olarak teslim edilmiştir.
(paket)

Teslim Eden
İncekara A.Ş.
Proje Asistanı
Özgür CİVİ

Teslim Alan
Hacettepe Onkoloji Hastanesi
Hastane Müdür Yrd.
Ertuğrul KALE

18.10.2007

TUTANAK

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne dış kredi ile alınan Makine Ekipman ve Malzemelerin dördüncü yüklemeinde (G.E. – Cyclotron Cihaz ve Ekipmanları) muhtelif ebatlarda 14. (Dört)..... adet koli kapalı olarak teslim edilmiştir.

Teslim Eden
İncekara A.Ş.
Proje Asistanı
Özgür CİVİ

Teslim Alan
Hacettepe Onkoloji Hastanesi
Hastane Müdür Yrd.
Ertuğrul KALE

305 20 01 } Rektörlük
20 02 } ~~Genel Kurul~~



HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ

Erişkin Hastanesi
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
Onkoloji Hastanesi



EK-56

Sayı: B.30. 2. HAC.0. H3.00.00-1307

21.06.2012

H.Ü. Soruşturma Komisyonu

Sn. Prof. Dr.Filiz Ercan,

HAC.0.70.01.00/440-2389 ilgi yazınız ile üniversitemiz 19901001900 nolu Onkoloji Hastanesi (II. kısım) kapsamında uluslar arası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem; makine, malzeme ve ekipmanlar arasında problem olan cihazlar, sorunları, bulundukları birimler, teslim tarihleri ve konuyla ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiş, belgeler ekte sunulmuştur.

1. Sıra No: 150 TRP1 2 adet Lineer Akseleratör:

Belirtilen 2 adet Lineer Akseleratör cihazı üniversitemize 2008 yılında teslim edilmiştir. Cihazlar Onkoloji Hastanesi -2. katta Radyasyon Onkolojisi ünitesinde hizmet vermektedir. Cihazların geçici kabulü 13.10.2010 tarihinde yapılmıştır. Cihazların ekleri ve aksesuarları ile birlikte kabul protokolünün imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı satıcının sorumluluğu ve garantisi altında olduğu yapılan ihale sözleşmesinde belirtilmiş olmasına rağmen MARUBENİ EUROPE PLC firması, tedarikçi Varian Medical Systems International AG'nin garantinin ve uzatılmış garanti sürelerinin 31.12.2011 tarihi itibariyle sona ermiş olduğunu belirtmektedir. Firma, Üniversitemizden kaynaklanan nedenlerle montaj ve kabul işlemlerinin üniversitenin zaman cetveli uyarınca uyması gereken süreden çok sonra gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. Bu nedenle firma, 13.12.2012 tarihine kadar devam etmesi gereken ikinci yıl garanti hizmetini vermeyi kabul etmemektedir.

2. Sıra No: 161 TRP12 Cerrahi Streotaktik Işınlama Sistemi:

Belirtilen cihaz tarafımıza 2007 yılında teslim edilmiş olup Onkoloji Hastanesi -2. katta Radyasyon Onkolojisine bağlı olarak hizmet vermektedir. Cihazın geçici kabulü 13.02.2012 tarihinde yapılmıştır. Cihazların ekleri ve aksesuarları ile birlikte kabul protokolünün imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı satıcının sorumluluğu ve garantisi altında olduğu yapılan ihale sözleşmesinde belirtilmiş olmasına rağmen Marubeni Europe Plc firması, tedarikçi Varian Medical Systems International AG'nın garantinin ve uzatılmış garanti sürelerinin 31.12.2011 tarihi itibarıyla sona ermiş olduğunu belirtmektedir. Firma, Üniversitemizden kaynaklanan nedenlerle montaj ve kabul işlemlerinin üniversitenin zaman cetveli uyarınca uyması gereken süreden çok sonra gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. Bu nedenle firma, 13.02.2014 tarihine kadar devam etmesi gereken iki yıllık garanti hizmetini vermeyi kabul etmemektedir.

3. Sıra No: 175 HKS1 Hijyenik Klima Sistemi:

08.08.2007 tarihinde cihaza ilişkin ekipmanlar 4 adet koli halinde Üniversitemize teslim edilmiştir. 24.03.2010 tarihinde Bölüm 94 Kemik İliği ve Bölüm 93 Yoğun Bakım servislerinin inşaatları ile birlikte 3 paket cihazın ilgili alanlara kurulumları tamamlanmıştır. 2012 yılı başında inşaatların tamamlanmasından sonra belirtilen servislerin hizmete girebilmesi için hijyenik klima sistemlerinin çalıştırılması gerekmiştir. Konuyla ilgili olarak Marubeni Europe Plc firmasına bilgi verilmiş ancak cihazlar çalıştırılmamıştır. Cihazın üreticisi Weiss Klima Teknik firması ve Türkiye tek yetkili satıcısı Beyaz Teknik Firması 3 yıl boyunca açık alanda yağmur, kar ve güneş gibi olumsuz hava koşullarına maruz bırakılması sebebi ile cihazların hasar gördüğünü belirtmişler ve cihazları çalıştırmayı kabul etmemişlerdir. Marubeni Europe Plc firması ile konuyla ilgili olarak mahkeme süreci başlamıştır.


4. Sıra No:155 TRP6 Brakiterapi Sistemi:

Belirtilen cihaz 2008 yılında tarafımıza teslim edilmiştir. Cihaz -1. Katta Radyasyon Onkolojisi Ünitesinde hizmet vermektedir. Cihazın geçici kabulü 13.12.2010 tarihinde yapılmıştır. Cihazın her kaynak değişiminde yapılması gerekli aktive ölçümü için kullanılacak olan kuyu tipi (well-type) iyon odasının bulunmadığı anlaşılmıştır. Kaynak değişimi sırasında kullanılması gereken bu parçanın eksikliği sıkıntı yaratmaktadır.

5. Sıra No: 178 Nuk2 PET-BT Cihazı:

Belirtilen cihazın kurulumu ve montajı yaklaşık 1 yıl önce -2. Kat Nükleer Tıp Ünitesinde tamamlanmıştır. Ancak PET-BT cihazının kurulumunda teknik şartnamede firmanın taahhüt ettiği malzeme_ve ekipmanlarda eksiklikler mevcuttur. Bu eksiklikler ile ilgili olarak firma ile görüşmeler devam etmektedir. Cihazın geçici kabulü yapılamadığı için taahhüt edilen garanti süresi henüz başlamamıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.



Prof. Dr. Mustafa CENGİZ
Onkoloji Hastanesi Başhekimi

Ek: 7



Sayı : B.30.2.HAC.0.70.10.14-D- 1164

14.11. 2007

Ek-57

Hacettepe Üniversitesi
Hastaneler Genel Direktörlüğü'ne,

Onkoloji Hastanesi'ne dış kredili alımla temin edilen makina, ekipman ve malzemelerin geçici kabullerinin yapılabilmesi için kurulacak olan komisyonda yer alacak kişilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. M. Tezer KUTLUK
Onkoloji Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Şuayib YALÇIN
H.Ü. Onkoloji Hastanesi
Başhekim Yardımcısı

Adı Soyadı

Prof. Dr. M. Tezer Kutluk

Prof. Dr. Şuayib Yalçın

Prof. Dr. Faruk Zorlu

Mak. Müh. M. Sabri Üstün

Ertuğrul Kale

Görevi

Onkoloji Hastanesi Başhekimi

Onkoloji Hastanesi Başhekim Yrd.

Radyasyon Onk. ABD Başkanı

Yapı İşl. Tek. Daire Bşk. Yrd.

Onkoloji Hast. Müdür Yrd.

MK/mb

T.C.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Ş. NURAY DEMİRTAŞ
Çarşı Caddesi No:22
1. Levent-İST.
Tel: (0212) 278 42 12

Ek-58a

10513

İHTARNAME

- 2 Mart 2012

İHTARNAMEYE
CEVAP VEREN

Marubeni Europe Plc
River Plate House, 7-11 Finsbury Circus, London
EC2M 7AF, İngiltere

VEKİLİ

Av. Günha : Yalçın
Levent Cad. Alt Zeren Sok., No: 7, Daire: 2, 34330,
Levent, İstanbul

İHTAR EDİLEN

Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 06100, Sıhhiye,
Ankara

KONU

22 Şubat 2012 tarihinde Ankara 11. Noterliği'nden 002128
yevmiye numarası ile gönderilen ihtarnamenize
cevabımızdır.

AÇIKLAMALAR

OLAYLAR

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51. maddesi (p) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılan 171 parça tıbbi makine ve teçhizatın ("Materyal" veya "Materyaller") uluslararası dış kredili olarak satın alınmasına ilişkin ihalenin ardından, satıcı Marubeni Europe PLC Dusseldorf Şubesi ("Marubeni") ile alıcı Hacettepe Üniversitesi ("Hacettepe") arasında söz konusu satın almaya dair 2 Ağustos 2001 tarihli sözleşme ("Sözleşme") imzalanmıştır.
- Marubeni, teklifinde de belirttiği üzere, tüm Materyalleri bir yıl içinde teslim etmeyi planlarken, Materyallerin sipariş ve ithalatı Hacettepe tarafından iki yıla yayılarak yapılmıştır. Marubeni bu gecikmeden dolayı zarara uğramıştır.
- Bugüne kadar 2 Materyal tarafların karşılıklı mu'abakatı ile Sözleşme kapsamından çıkarılmış, 157 Materyalin geçici ve kesin kabulleri tamamlanmış ve geriye kalan 12 Materyal Marubeni tarafından Sözleşme'de öngörülen süreler içinde Hacettepe'ye teslim edilmiştir. Bunların bir kısmının halihazırda montaj ve kabul işlemleri devam etmektedir ve bunların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
- Hacettepe Marubeni'ye göndermiş olduğu 12 Ocak 2007 tarihli ilk sipariş mektubu ile Marubeni'den söz konusu mektup ekinde listesi verilen Materyallerin kendisine gönderilmesini istemiştir.
- Marubeni, Hacettepe'ye göndermiş olduğu 16 Ağustos 2007 tarihli uyarı mektubunda:
 - Hacettepe yetkilerinin sözlü olarak verdiği bilgilerden "Cerrahi Stereotaktik Işınlama Sistemi (TRP 12)'nin montajı için Onkoloji Hastanesi civarında inşa edilecek binanın inşaatına henüz başlanılmadığını; bunun için bir ihale açılması gerektiğini; ancak bütçesel nedenlerle söz konusu ihalenin henüz açılmamış olduğunu" anladığını;
 - sözleşme uyarınca Marubeni'nin TRP 12 cihazına dair garanti süresinin kabul protokolünün imzalandığı tarihten itibaren başlaması ve buna karşılık Marubeni ile TRP 12 cihazının tedarikçisi arasındaki tedarik sözleşmesi uyarınca söz konusu tedarikçinin Marubeni'ye karşı TRP 12 cihazına dair garanti süresinin söz konusu TRP 12 cihazının Marubeni'ye teslim edildiği tarihten

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HUKUK MÜSAVİRLİĞİ
Kayıt No :
Kayıt Tarihi : 1091
DAN : DEĞ :
SOR : 06 Mart 2012
TES :
HAVALİ :

6.3.012
M. N. 3. sayı

itibaren başlaması nedeniyle, şayet TRP 12 cihazının kabulü Hacettepe'den kaynaklanan bir sebeple gecikirse bu iki garanti süresi arasında uyumsuzluk olacağını;


- bu nedenle TRP 12 cihazına dair garanti süresinin ilgili tedarikçinin Marubeni'ye olan garanti süresine eşit olacak şekilde kısaltılmasını; ve
- şayet Marubeni'nin Sözleşme tahtındaki garanti süresinin bu şekilde kısaltılmaması halinde, TRP 12 cihazında ilgili tedarik sözleşmesi tahtındaki garanti süresinin dolmasından sonra ortaya çıkacak arızalardan Marubeni'nin sorumlu tutulamayacağını,

Hacettepe'ye bildirmiştir.

- Marubeni bunun ardından Sözleşme uyarınca ilgili Materyalleri Sözleşme ekindeki (Ek-2) Teslim ve Zaman Cetveli'nde öngörülen süre içinde Hacettepe'ye teslim etmiştir.
- Marubeni, Hacettepe'ye göndermiş olduğu 17 Mart 2008 tarihli uyarı mektubunda:-
 - gönderilen Materyallerin bazılarının montajının Idare'nin montaj mahallerini Marubeni'ye göstermemesi nedeniyle yapılamadığını öğrendiğini;
 - bu nedenle bu Materyallerin tedarikçilerinin Marubeni'ye karşı olan garanti süresinin Marubeni'nin Sözleşme tahtında Hacettepe'ye karşı olan garanti süresinden daha kısa hale geleceğini;
 - bu sebeple bu Materyallere dair garanti süresinin ilgili tedarikçilerin Marubeni'ye olan garanti süresine eşit olacak şekilde kısaltılması gerektiğini; ve
 - şayet Marubeni'nin garanti süresinin bu şekilde kısaltılmaması halinde, bu Materyallerde ilgili tedarik sözleşmesi tahtındaki garanti süresinin dolmasından sonra ortaya çıkacak arızalardan Marubeni'nin sorumlu tutulamayacağını,


Hacettepe'ye bildirmiştir.

- Hacettepe Marubeni'ye göndermiş olduğu 1 Nisan 2008 tarihli ikinci sipariş mektubuyla Marubeni'den Sözleşme kapsamındaki geriye kalan tüm Materyallerin kendisine gönderilmesini istemiştir.
- Marubeni 22 Nisan 2008 tarihli sevk ihbarı ile sipariş edilen Materyallerin Hacettepe'ye sevk edileceğini Hacettepe'ye bildirmiştir.
- Marubeni sipariş edilen Materyalleri Sözleşme ekindeki (Ek-2) Teslim ve Zaman Cetveli'nde öngörülen süre içinde Hacettepe'ye teslim etmiştir.
- Hacettepe, Marubeni'nin yukarıda değinilen 17 Mart 2008 tarihli uyarı mektubuna cevaben gönderdiği 11 Nisan 2008 tarihli mektubunda, ilgili inşaatların kısa bir süre içinde tamamlanmasını beklediklerini belirtmiş, ve buna ilaveten geriye kalan Materyallerin siparişini 1 Nisan 2008 tarihinde Marubeni'nin Ankara temsilcisine faksladıklarını söylemiştir.
- Marubeni, Hacettepe'ye göndermiş olduğu 4 Temmuz 2008 tarihli uyarı mektubunda:
 - sevkiyatı tamamlanan ama Hacettepe'nin montaj mahallini göstermemesi nedeniyle montaj yapılamayan ve dolayısıyla kabule alınamayan Materyaller'in sayısının artmasından duyduğu endişeyi dile getirmiştir;
 - bu nedenle bu Materyallere dair Sözleşme tahtındaki garanti süresinin ilgili tedarikçilerin ilgili tedarik sözleşmesi tahtındaki garanti süresine eşit olacak şekilde kısaltılmasını; şayet Marubeni'nin garanti süresinin bu şekilde kısaltılmaması halinde Marubeni'nin bu Materyallerde



ilgili tedarikçilerin tedarik sözleşmeleri tahtındaki garanti süresinin dolmasından sonra ortaya çıkacak arızalardan sorumlu tutulamayacağını belirlemiştir; ve

- bu Materyallerin montaj ve kabullerinin Hacettepe'den kaynaklanan nedenlerle gecikmesi sebebiyle ödemeye devam etmekte olduğu sigorta masraflarının Hacettepe tarafından karşılanmasını talep etmiştir.
- Marubeni ve Hacettepe yetkilileri (Rektör Prof. Dr. Uğur Erdener ve Prof. Dr. M. Tezer Kutluk) arasında 11 Temmuz 2008 tarihinde yapılan toplantıda, Hacettepe yetkilileri, Marubeni'nin Hacettepe'den kaynaklanan nedenlerle garanti hususunda tedarikçilerine rücu edememe riskini anladıklarını ve bu riski bertaraf etmek için gerekli adımları atacaklarını ifade etmişlerdir.
- Marubeni, Hacettepe'ye göndermiş olduğu 22 Temmuz 2008 tarihli mektubunda:
 - Hacettepe'nin Marubeni'nin karşı karşıya bulunduğu yukarıda değinilen riski bertaraf etmek için gerekli adımları atacak olmasına teşekkür etmiş; ve
 - birlikte ilgili tedarikçilerle yazışarak tedarikçilerden garanti sürelerini uzatmalarını istemeyi Hacettepe'ye önermiştir.
- Marubeni ile Hacettepe ilgili tedarikçilerle (HKS 1 ve tedarikçi garanti süreleri dolmakta olan diğer bazı Materyallere ilişkin olarak) süre uzatımına dair yazışmalar yapmıştır.
- Bu yazışmalar arasından HKS 1 cihazının tedarikçisi Weiss Klimantechnik GmbH'a gönderilen yazıda, Hacettepe, adı geçen tedarikçiye, "HKS 1 cihazının 26 Haziran 2007'den bu yana uygun ve kuru bir yerde ve saklama talimatlarına uygun şekilde saklandığını teyit ederiz" demiştir. (Ancak bu ifadenin gerçek dışı olduğu ve söz konusu cihazın yaklaşık 3 yıl açık bir otoparkta ve kar, yağmur, doğrudan güneş ışığı gibi sert hava koşulları altında tutulduğu daha sonra ortaya çıkmıştır.)
- Marubeni 30 Ekim 2008 tarihli mektubuyla tedarikçilerin garanti süresi uzatımına dair ücret tekliflerini Hacettepe'ye iletmıştır. Hacettepe bu mektuba hiçbir zaman cevap vermemiştir.
- Marubeni Hacettepe'ye göndermiş olduğu 23 Aralık 2008 tarihli mektubunda Materyallerin son kısmının gönderildiğini Hacettepe'ye bildirmiş ve Hacettepe'den halihazırda teslim edilmiş Materyallerin kurulacağı mahallerin son durumu hakkında kendisine bilgi vermesini istemiştir.
- Marubeni Hacettepe'ye göndermiş olduğu 9 Ocak 2009 tarihli mektubunda halihazırda teslim edilmiş Materyallerin kurulacağı mahallerin son durumu hakkında Hacettepe'den bir daha bilgi istemiş ve Hacettepe'ye bir kez daha bu Materyallerin tedarikçilerinin garanti sorumluluğu sürelerinin dolmakta olduğunu hatırlatmıştır. Hacettepe bu mektupların hiç birine cevap vermemiştir.
- Marubeni ve Hacettepe yetkilileri (Rektör Prof. Dr. Uğur Erdener ve Prof. Dr. M. Tezer Kutluk) arasında 15 Haziran 2009 tarihinde yapılan toplantıda, Hacettepe yetkilileri, Marubeni'nin garanti hususlarında Hacettepe'den kaynaklanan nedenlerle karşı karşıya bulunduğu riskleri gidereceklerini söylemişlerdir. Marubeni, Hacettepe'ye göndermiş olduğu 29 Haziran 2009 tarihli mektubunda Hacettepe'ye bunun için teşekkür etmiştir.
- Marubeni, Hacettepe'ye göndermiş olduğu 28 Temmuz 2010 tarihli mektubunda, Hacettepe'ye teslim edilmiş ancak Hacettepe'den kaynaklanan nedenlerle henüz montajı ve kabulü yapılamamış Materyallerin listesini vermiş ve yaz ayları geldiğinden montaj ve kabul sürecinin hızlandırılmasını beklediğini belirtmiştir.
- Marubeni, Hacettepe'ye göndermiş olduğu 12 Kasım 2010 tarihli mektubunda:




- bazı Materyallerin kabul işlemleri yapılmadan Hacettepe tarafından kullanılmaya başlanıldığını öğrendiğini;
- kullanılmaya başlanılmasından itibaren 1 ay (Sözleşme'nin 12.6 maddesi - Deneme işletmesi süresi) geçen Materyallerin kabullerini yapılmış addettiğini; ve
- bu Materyallerden bazılarının tedarikçi garanti süreleri Hacettepe'den kaynaklanan nedenlerle dolduğundan, Hacettepe'ye karşı bu Materyallere ilişkin olarak sözleşme tahtında herhangi bir garanti sorumluluğu bulunmadığını,

bildirmiştir.

- Marubeni, Hacettepe'ye göndermiş olduğu 14 Kasım 2011 tarihli mektubunda:
 - montaj ve kabul işlemlerine Hacettepe'den kaynaklanan nedenlerle başlanamayan Materyallerin listesini vermiş; ve
 - Hacettepe'nin TRP 12 cihazını geçici kabul yapmaksızın kullanmakta olduğunu öğrendiğini, bu nedenle Sözleşme uyarınca Hacettepe'nin bu cihazı kullanmaya başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde kabul tutanağı imzalaması veya bir eksik listesi çıkarması gerektiğini belirtmiştir.
- Marubeni, Hacettepe'ye göndermiş olduğu 9 Aralık 2011 tarihli mektubunda:
 - Hacettepe'nin TRP 12 cihazındaki bir arızaya ilişkin olarak doğrudan bu cihazın tedarikçisi ile temasa geçtiğini ancak söz konusu tedarikçinin garanti süresi dolduğundan bu arızayı gidermeyi reddettiğini, öğrendiğini;
 - söz konusu cihazın montaj ve kabulü Hacettepe'den kaynaklanan nedenlerle geciktirildiğinden ve ilgili tedarikçinin de garanti süresi dolduğundan, Marubeni'nin bu cihaza dair herhangi bir garanti sorumluluğu bulunmadığını; ve
 - Hacettepe'nin Materyallerin tedarikçileriyle Marubeni'den habersiz olarak doğrudan temasa geçmemesi gerektiğini,

bildirmiştir.


- Hacettepe, 23 Ocak 2012 tarihli tutanakla HKS 1 cihazının montajının yapılacağı binanın inşaatının tamamlandığını belirtmiş ve HKS 1 cihazının montajının yapılmasını istemiştir.
- Marubeni HKS-1 cihazını Hacettepe'ye 27 Temmuz 2007 tarihinde teslim etmiştir. Hacettepe'nin ise söz konusu cihazı en az 3 yıldır açık bir otoparkta ve kar, yağmur, direkt güneş ışığı gibi sert hava koşulları altında bırakmış olduğu ortaya çıkmıştır (oysa Hacettepe bu cihazın tedarikçisi Weiss Klimantechnik GmbH ile garanti süresinin uzatılması için yapılan yazışmada "HKS 1 cihazının 26 Haziran 2007'den bu yana uygun ve kuru bir yerde ve saklama talimatlarına uygun şekilde saklandığını teyit ederiz" demişti.).
- Marubeni, Hacettepe'ye göndermiş olduğu 1 Mart 2012 tarihli mektubunda, HKS-1 cihazındaki hasarların bu cihazın (i) montajının yapılacağı mahallin Marubeni'ye zamanında bildirilmemesinden; ve (ii) en az 3 yıl süreyle açık bir otoparkta kar, yağmur ve doğrudan güneş ışığı gibi sert hava koşullarına maruz bırakılarak tutulmasından, kaynaklandığını belirtmiştir. Buna ilaveten, tedarikçi firmanın HKS-1 cihazının şu anki haliyle güvenli bir şekilde çalışacağı hususunda çok ciddi şüphelere sahip olduğu ve şayet bu uyarılar dikkate alınmayarak söz konusu ekipman monte edilir ve kullanılırsa, bundan dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan Marubeni'nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı belirtilmiştir.



- Hacettepe, Marubeni'ye göndermiş olduğu 20 Ocak 2012 tarihli yazıyla, 13 Aralık 2010 tarihinde kabul protokolü imzalanan TRP 1 (Doğrusal İvmelendirici) cihazında ortaya çıkan sorunlardan bahsetmiş ve bunların giderilmesini istemiştir.
- Marubeni, Hacettepe'nin yukarıda sözü edilen 20 Ocak 2012 tarihli yazısına cevaben gönderdiği 21 Şubat 2012 tarihli yazıda, TRP 1 cihazının Hacettepe'ye 22 Temmuz 2008'da teslim edildiğini; ancak kabulünün Hacettepe'den kaynaklanan nedenlerle ancak 13 Aralık 2010 tarihinde yapılabildiğini; ve bu cihaza dair tedarik sözleşmesindeki garanti süresinin 31 Aralık 2011 tarihinde sona erdiğini ve Hacettepe'nin bu husustan 30 Ekim 2008 tarihinden beri haberdar olduğunu belirtmiştir. Marubeni, buna ilaveten, cihazın tedarikçisinden cihazın onarımı için Hacettepe'ye fiyat teklifi almış ve bunu Hacettepe'ye bildirmiştir.
- Hacettepe Marubeni'ye 22 Şubat 2012 tarihinde işbu cevabımız konusu ihtarnameyi göndererek Marubeni'nin Sözleşme tahtındaki çeşitli borçlarını yerine getirmediğini iddia etmiş; Marubeni'ye bunları gidermek için 10 gün süre vermiş; ve şayet bunun yapılmaması halinde kesin teminatın irat kaydedileceğini söylemiştir.
- Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Hacettepe'nin 2007 ve 2008 yıllarında sipariş ettiği Materyallerin tamamı Marubeni tarafından Sözleşme ekindeki (Ek-2) Teslim ve Zaman Cetveli'nde öngörülen süre içinde Hacettepe'ye teslim edilmiştir. Hacettepe ise 22 Şubat 2012 tarihli ihtarnamesinde belirttiği Materyallerin montajının yapılacağı mahalleri Marubeni'ye zamanında göstermemiş ve gerekli mimari planları Marubeni ile paylaşmamış; bu Materyallerden bazılarını çok uygunsuz koşullarda saklamış; bazılarını kabul işlemleri yapılmadan kullanmaya başlamış; Marubeni'nin bu aksaklıklara ilişkin olarak gönderdiği ve yukarıda da kısaca değinilen çok sayıda mektubun birçoğuna cevap bile vermemiş; ve Marubeni'nin tedarikçileriyle Marubeni'den habersiz olarak temasa geçmiştir. Dolayısıyla Hacettepe'nin 22 Şubat 2012 tarihli ihtarnamesinde sözünü ettiği olumsuzluklara esasen Hacettepe'nin kusurlu fiil ve Sözleşme ihlalleri neden olmuştur.

İLGİLİ SÖZLEŞME VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİ

- Sözleşme'nin 1.1/(a) maddesi uyarınca, "Satıcı (...) Ek-1 ve teknik spesifikasyonlarda belirtilen Malzemeleri (...) İdarenin cihaz mahalli olarak öngördüğü Mahale nakledecek ve bu yerde montajı yapılmış halde hazır teslim edecektir."
- Sözleşme'nin 1.2/(b) maddesi uyarınca, "İdare teknik şartnamelerde belirtilen ve Malzemenin Satıcı tarafından Mahaline yerleştirilmesini sağlayacak Madde 11'de belirtilen hazırlıkları yapacaktır".
- İdari Şartname'nin 19/(b) maddesi uyarınca, "Cihazların kurulacağı veya monte edileceği yer ve odaların belirlenmesi, su, elektrik, gaz bağlantılarının sağlanması hastane idaresince yapılacaktır".
- Genel Teknik Şartname'nin G.1/(a) maddesi uyarınca, "Yüklenici firma, cihaz ile birlikte cihazların kurulacağı mahallin mimari planları (İdare tarafından verilecek) dikkate alınarak hazırlanacak genel yerleşim planı, makine cihaz montaj yeri planı, su elektrik, buhar vs. tesisat planları ve bu maksatla kullanılacak diğer planları ikiye takım halinde teslim edecektir".
- Genel Teknik Şartname'nin D.1 maddesi uyarınca "İdare, makine ve teçhizatın en kısa süre içinde işletmeye alınması için, gerekli şartların sağlanması için özen gösterecektir".
- Sözleşme'nin 11.1 maddesi uyarınca, " (...) Satıcı (...) Malzemenin montajının yapılacağı mahale hakkında İdareden gerekli bilgi ve planları alarak iş yerinin hazırlanması ile ilgili çalışmalara başlayacaktır (...)".
- Sözleşme'nin 11.3 maddesi uyarınca, "İdare, Malzeme için gerekli olan elektrik, su, buhar gibi alt yapı hizmetlerini Malzemenin yerleştirileceği Mahale kadar getirecektir (...)".



- Sözleşme'nin 11.10 maddesi uyarınca, "İdare malzemelerin montajı yapılana kadar saklanabileceği depolamaya uygun Malzemelerin hava şartlarından etkilenmesini önleyecek emniyetli bir yer tahsis edecektir. Ayrıca montaj elemanlarının ihtiyacı için gerekli tesisler oluşturacaktır".
- Sözleşme'nin 7.2.b maddesi uyarınca, "(...) Ambalajlar Malzemenin gerektiğinde dört ay süreyle açık alanda depolanması durumunda hava koşullarından herhangi bir şekilde etkilenmesine meydan vermeyecek nitelikte olacaktır".
- Sözleşme'nin 11.8 maddesi uyarınca, "Montaj işlemi sırasında İdarenin sorumluluğundaki bir işlemin zamanında yapılmaması sonucu doğabilecek gecikme, süre olarak teslim müddetine eklenecek, bu nedenle Satıcının hak kaybına meydan vermeyecektir".

CEVAPLARIMIZ

- **İhtararnemenizin 2. maddesi:** Bu kısımdaki iddialarınızın aksine Marubeni Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerinin tamamını eksiksiz olarak yerine getirmiştir.

Öncelikle 157 Materyalin geçici ve kesin kabulleri tamamlanmıştır. Geriye kalan 12 Materyal de Marubeni tarafından Sözleşme'de öngörülen sürelerde tarafınıza teslim edilmiştir. Bunların bir kısmının halihazırda montaj ve kabul işlemleri devam etmektedir ve bunların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanması beklenmektedir.


Diğer taraftan Hacettepe Materyallerin montajının yapılacağı mahalleri Marubeni'ye zamanında göstermemiş ve gerekli mimari planları Marubeni ile paylaşmamış; bu Materyallerin kabul işlemlerini zamanında başlatmamış; Materyallerden bazılarını çok uygunsuz koşullarda saklamış; bazılarını kabul tutanağı imzalanmadan kullanmaya başlamış; Marubeni'nin bu aksaklıklara ilişkin olarak gönderdiği ve yukarıda da kısaca değinilen çok sayıda mektuba kayıtsız kalmış; ve Marubeni'nin tedarikçileriyle Marubeni'den habersiz olarak çeşitli konularda temasa geçmiştir.

Dolayısıyla Sözleşme tahtındaki borç ve yükümlülüklerini usulünce yerine getirmeyen taraf Hacettepe'dir.

- **İhtararnemenizin 3. maddesi:** Sözleşme konusu Materyallerin tamamı Marubeni tarafından Sözleşme'de öngörülen sürelerde tarafınıza teslim edilmiştir.

Sözleşme md. 1.2/(b) uyarınca Hacettepe Materyallerin mahalline yerleştirilmesini sağlayacak hazırlıkları yapmalıdır. Teknik Şartname md. D.1 uyarınca Hacettepe Materyallerin en kısa sürede işletmeye alınması için gerekli şartların sağlanması için özen göstermelidir. İdari Şartname md. 19/(b) uyarınca cihazların kurulacağı veya monte edileceği yer ve odaların belirlenmesi, su, elektrik, gaz bağlantılarının sağlanması hastane idaresince yapılacaktır. Teknik Şartname md. G.1/(a) uyarınca Hacettepe Materyallerin kurulacağı mahallin mimari planlarını Marubeni'ye vermelidir. Sözleşme Ek - 2 Teslim ve Zaman Cetveli'ne göre Hacettepe ithalat işlemlerine başlamadan 2 ay önce montaj yeri hazırlıklarına başlamalı ve bunun en geç ithalat işlemleri başlamadan önce tamamlamalıdır.

Hacettepe ihtararnamede belirtilen hiçbir Materyal için yukarıdaki yükümlülüklerinin hiçbirini usulünce yerine getirmemiştir. Hacettepe söz konusu Materyalleri önce sipariş etmiş, ama teslim aldıktan sonra yıllarca bunların montajının yapılacağı mahalleri göstermemiş veya kabul işlemlerini başlatmamıştır. Marubeni tarafından defalarca yazılı olarak kabul işlemlerinin kusurlu bir şekilde geciktirilmesi halinde tedarikçi garantisinin sona erdiği tarihten sonra ortaya çıkabilecek arızalardan Marubeni'nin sorumlu tutulamayacağı ihtar edilmiş olmasına ve teslim edilen Materyallerin montaj mahallerinin hazırlanması istenilmesine rağmen, Hacettepe bu konuda hiçbir adım atmamış ve Marubeni'nin mektuplarına cevap bile vermemiştir. Ayrıca, Hacettepe yetkilileri Marubeni yetkilileri ile yaptıkları toplantılarda Marubeni'nin Hacettepe'den kaynaklanan nedenlerle garanti hususunda



tedarikçilerine rücu edememe riskini anladıklarını ve bu riski bertaraf etmek için gerekli adımları atacaklarını ifade etmişlerdir. Ancak hiçbirşey yapmamışlardır. Sonuç olarak Hacettepe Sözleşme'yi kusurlu olarak ihlal etmiştir.


Son olarak Marubeni'nin hiçbir Materyalin naklinde önceden bildirim yükümlülüğüne uymadığı iddiasını gerçek dışıdır. Öncelikle bu bildirimler yapılmıştır. Buna ilaveten, projenin tabi olduğu uluslararası kredi sözleşmesi gereği Marubeni'nin herhangi bir ödeme alabilmesi için ilgili bankaya sevkiyat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Böyle bir durumda söz konusu banka sizden ödeme yapabilmek için yetki alacaktır. Sonuç olarak sevkiyatlardan en geç bir hafta önce değil, bundan çok daha önce bu suretle haberdar edildiniz.

Yukarıdaki ihlaller ve hukukumuzdaki "dürüstlük kuralı/hakkın kötüye kullanılması yasağı" ve "kimse kendi kusurlu hareketinden bir menfaat elde edememesi" ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde, Hacettepe'nin teslim aldığı cihazların montaj, muayene ve kabullerini yıllar sonra yapması, bunları uygun olmayan koşullarda muhafaza etmesi ve geçen bu uzun sürenin ardından Marubeni'yi buna ilaveten 2 yıl daha arızalardan sorumlu tutmak istemesi dürüstlük kuralına aykırıdır ve hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir.

Buna ilaveten, Marubeni'nin tedarikçisine rücu hakkını kaybetmesine Hacettepe'nin yukarıda sayılan Sözleşme ihlalleri neden olduğundan, bir an için Hacettepe'nin Marubeni'den Sözleşme'nin garanti hükümlerine dayanarak tazmin talebinde bulunabileceği farz edilse bile, Hacettepe'nin bu şekilde yapacağı her talep Marubeni'nin sorumlusu yine Hacettepe olan bir zararını doğuracak ve bu zararın Hacettepe tarafından tazmin edilmesi gerekecektir.

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak, Sözleşme md. 11.10 uyarınca Hacettepe Materyallerin montajı yapılmaya kadar saklanabileceği, depolamaya uygun ve Materyallerin hava şartlarından etkilenmesini önleyecek emniyetli bir yer tesis etmekle yükümlüdür. Diğer taraftan, Hacettepe'nin HKS-1 cihazını en az 3 yıl süreyle açık bir otoparkta kar, yağmur ve doğrudan güneş ışığı gibi sert hava koşullarına maruz bırakılarak sakladığı anlaşılmıştır. Hacettepe'nin bu fiili Sözleşme md. 11.10'ın ihlali niteliğinde olup, Hacettepe kendi kusurlu davranışı nedeniyle bu cihazda meydana gelen arızaların giderilmesini Sözleşme'nin garanti hükümlerine dayanarak Marubeni'den talep edemez.

- **İhtarnamenizin 4. maddesi:** Teknik Şartname md. B/8 uyarınca teknik servis istasyonu Hacettepe'nin tespit edeceği cihaz grupları için kurulacaktır. Bugüne kadar Hacettepe bu yönde bir tespit yaparak, tespit ettiği cihaz grupları için Marubeni'ye herhangi bir teknik servis istasyonu talebinde bulunmamıştır. Buna ilaveten, Marubeni yetkilileri birden çok defa Hacettepe yetkililerine bir teknik servis istasyonu kurmayı önermişler, ama aldıkları cevap hep bunun için yeterli alan olmadığı ve Marubeni'nin Türkiye temsilcisi İncekara Teknik Cihazlar End. ve Tic. A.Ş.'nin ("İncekara") zaten bir telefon uzaklıkta olduğu ve sık sık hastaneye gelerek gerekli teknik desteği verdiği olmuştur. Bu arada şunu da not ediniz ki, İncekara bu görevi 4 yıldır ifa etmektedir ki bu da Sözleşme'de bu hizmetler için aranan sürenin 2 katıdır (ve bu da Marubeni'nin ilave masrafına neden olmaktadır).
- **İhtarnamenizin 5.1. maddesi:** Bu konuda size 21 Şubat 2012 tarihli bir ihtarname göndermişlik. Söz konusu ihtarname referans için ektedir. Burada o ihtarnameimizdeki açıklamalarımıza atıfta bulunmakla yetiniyoruz. Ama yine de çok kısaca cevaplamak gerekirse, TRP 1 cihazı Hacettepe'ye 22 Temmuz 2008'da teslim edilmiş, ancak montaj ve kabulü Hacettepe'den kaynaklanan nedenlerle ancak 13 Aralık 2010 tarihinde yapılabilmektedir. Buna ilaveten, yer gösterme ve kabule alma işlemlerindeki gecikmenin Marubeni'nin tedarikçisinin garantisine rücu etmesini imkansız kılacağı ve Hacettepe'den kaynaklanan böyle bir gecikme halinde Marubeni'nin Sözleşme'nin garanti hükümleri uyarınca sorumlu tutulamayacağı Hacettepe'ye defalarca yazılı olarak bildirilmiştir. Bu nedenle Marubeni'nin TRP 1 cihazına ilişkin olarak Hacettepe'ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- **İhtarnamenizin 5.2. maddesi:** Öncelikle şunu tekrarlamak isteriz ki bu cihazların montaj ve kabul takiben kabul işlemlerinin başlatılamamasının nedeni, Hacettepe'nin Sözleşme ve eklerinde belirtilen



montaj için mahal gösterme ve mimari planları verme yükümlülüklerini yakın tarihe kadar yerine getirmemesidir. ✓

✓ ✓ ✓ ✓
Diğer taraftan, 23 Ocak 2012 tarihli tutanağınız ile SER13, CER13, YOB8 ve KI07 Materyalleri için tarafınızca yer gösterilmiş ve buna istinaden gerekli montaj işlemlerine tarafımızca başlanılmıştır. Montaj işlemlerine başlanıldığı 21 Şubat 2012 tarihli mektubumuzla tarafınıza bildirilmiştir. Bu arada, tesliminden çok uzun zaman sonra daha yeni sayılabilecek bir tarihte kurulum mahallini gösterdiğiniz ve buna istinaden de montajına hemen başladığımız bu cihazlara ihtarnamenizde neden yer verdiğinizizi anlamakta güçlük çekiyoruz.

✓ ✓ ✓ ✓
Buna ilaveten, CER10, CER11, KPT6 ve STR1 cihazları ile ilgili olarak henüz Hacettepe tarafından herhangi bir mahal tayini yapıp tarafımıza bildirilmemiştir. Bu nedenle bu cihazlara ihtarnamenizde neden yer verdiğinizizi yine anlamakta güçlük çekiyoruz.


* HKS 1 cihazı ile ilgili olarak size 1 Mart 2012 tarihinde bir ihtarname göndermiştik. Burada söz konusu ihtarnamemizdeki açıklamalara atıfta bulunuyoruz. Ancak yine de kısaca tekrarlamak gerekirse, HKS-1 cihazındaki hasarlar (i) bu cihazın montajının yapılacağı mahallin Marubeni'ye zamanında bildirilmemesinden (cihaz Hacettepe'ye 27 Temmuz 2007 tarihinde teslim edilmiş ancak montaj mahallinin kurulum için hazır olduğu Hacettepe tarafından 23 Ocak 2012 tarihinde bildirilmiştir); ve (ii) bu cihazın en az 3 yıl süreyle açık bir otoparkta kar, yağmur ve doğrudan güneş ışığı gibi sert hava koşullarına maruz bırakılarak tutulmasından, kaynaklanmıştır.

* TRP 12 ile ilgili olarak, söz konusu cihazın kabulü Hacettepe'nin zamanında montaj mahalli göstermemesi nedeniyle yıllarca geciktikten ve ilgili tedarikçinin de garanti süresi dolduğundan, Marubeni'nin bu cihaza dair herhangi bir garanti sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda yukarıda Madde 3'deki açıklamalarımızı tekrarlıyoruz.

• **İhtarnamenizin 5.3 maddesi:**

- **5.3.1:** Sizi daha önce defalarca bizi aradan çıkararak tedarikçilerle doğrudan temasa geçmemeniz konusunda uyarmıştık. Böyle bir durumda bir tedarikçi ile üzerinde mutabık kaldığınız ek parçalar veya herhangi başka bir değişiklik için hiçbir sorumluluğumuzun bulunmayacağını belirtmek isteriz. Buna ilaveten, böyle bir eksiklikten bize ilk defa bahsediyorsunuz. Hemen ilgili tedarikçi ile temasa geçip size bilgi vereceğiz.
- **5.3.2:** Böyle bir eksiklikten bize ilk defa bahsediyorsunuz. Hemen ilgili tedarikçi ile temasa geçip size bilgi vereceğiz.
- **5.3.3:** Böyle bir eksiklikten bize ilk defa bahsediyorsunuz. Hemen ilgili tedarikçi ile temasa geçip size bilgi vereceğiz.
- **5.3.4:** İlgili tedarikçi ile yaptığımız görüşmeden bu konuda kendileriyle doğrudan temasa geçtiğinizi anlıyoruz. Sanırım bu maddede sözü geçen detektör yerine bir "laptop workstation" verilmesi hususunda tedarikçi ile anlaştınız. Yönetiminiz değişince de bunu tekrar söz konusu detektörle değiştirmek istiyorsunuz. Yukarıda da ifade edildiği üzere tedarikçilerle doğrudan temasa geçerek yaptığınız değişiklikler hususunda hiçbir sorumluluğumuzun bulunmayacağını tekrarlamak isteriz.
- **5.3.5:** Konuyu süratle inceleyip en kısa zamanda bilgi vereceğiz.
- **5.3.6:** Konuyu süratle inceleyip en kısa zamanda bilgi vereceğiz.

- **İhtarnamenizin 5.4 maddesi:** Siklotron cihazının montaj ve bunu takiben kabul işlemlerinin tamamlanamamasının nedeni, Hacettepe'nin Sözleşme ve eklerinde belirtilen montaj için mahal gösterme ve mimari planları verme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmemesidir. Bu konuda yukarıda Madde 3'deki açıklamalarımızı tekrarlıyoruz.



- 5.4.1: Bu konuda size daha önce göndermiş olduğumuz 28 Temmuz 2010 ve 14 Kasım 2011 tarihli mektuplarımıza atıfta bulunuyoruz.

Hacettepe sürekli olarak bu cihazın kurulması sürecini ötelemiş ve geciktirmiştir.

İlgili tedarikçimiz GE çeşitli zamanlarda bu konuda sizinle temasa geçmiştir. Ancak bütçe sıkıntılarınız, söz konusu cihazın yerinin değiştirilmesinin düşünülmesi ve ilgili müteahhidin çok meşgul olması gibi nedenlerle bu konuda ilerleme sağlanamamıştır. Sizden çeşitli zamanlarda söz konusu cihazın montajı için çalışma programı istenmiştir ancak herhangi bir cevap alınamamıştır.

17 Ocak 2012 tarihinde yeni yönetiminizle yaptığımız toplantıda, bu cihazın daha önce bildirilen montaj mahallini değiştirmek istediğinizi söylediniz. Cihazın yerleştirilmesi istenilen yer şu an faal olan bir kafeteryadır. Bu yönde bir değişiklik ciddi miktarda ilave zarar ve masrafa neden olacaktır. Bu arada aynı toplantıda söz konusu yeni binanın inşaat masraflarına katılmamızı istediğinizi de not ediyoruz. İhale kapsamında böyle bir görev öngörülmediğinden, bu isteğinizi kabul edilmemiştir.

Bu vesileyle şunu da belirtmek isteriz ki, bu cihazın kurulacağı mahalli keyfi olarak değiştirmeniz cihazın montajının tamamlanmasını en az 9 ay geciktirecektir. Buna ilaveten ilgili binada çok ciddi tadiller yapılması da gerekir, ki bu da Hacettepe için ciddi bir maliyet anlamına gelecektir.


Son olarak, Genel Teknik Şartname'nin G.1/(a) maddesi uyarınca, "Yüklenici firma, cihaz ile birlikte cihazların kurulacağı mahallin mimari planları (İdare tarafından verilecek) dikkate alınarak hazırlanacak (...) planları ikiyeşer takım halinde teslim edecektir". Oysa ki bugüne kadar bize cihazın monte edileceği mahalle dair herhangi bir mimari plan verilmemiştir.

- 5.4.2: İlgili plan ve çizimler hususunda sizden herhangi bir onay alınmadığından, bu çalışmalarını gerçekleştirmemiz doğal olarak mümkün değildir.
- 5.4.3: Burada sözü edilen planlar size teslim edilmiştir. Ancak müteahhidiniz plan ve çizimlerde bazı değişiklikler istemiştir, çünkü anladığımız kadarıyla böyle bir projeyi hayata geçirebilecek uzmanlıkları bulunmamaktadır.

Sizlerle 14 Eylül 2011 tarihinde yapmış olduğumuz toplantıda belirtildiği üzere, ilgili planlar GE tarafından size Ağustos 2011 içinde verilmiştir. Daha sonra 17 Ocak 2012 tarihinde söz konusu cihazın mahallini değiştirdiğinizi öğrendik. Bu durumda tarafınızca ilk gösterilen mahal için hazırlanan planların masrafları boşa gidecek ve sonuç olarak şirketimiz bu keyfi işlem sonucu ilave zarara uğrayacaktır.

- İhtarnamenizin 5.5 maddesi: Geriye kalan 2,750 adet kitin tarafınızca istenildiği zaman tarafınıza teslim edileceği hususunda sizinle sözlü bir mutabakata varmış olduğumuzu teyit ediyoruz. Ancak bugüne kadar bize bu şekilde bir istekte bulunmamıştınız. Bu nedenle bu hususa neden şimdi ihtarnamenizde yer vermiş olduğunuzu anlayamıyoruz. Sonuç olarak söz konusu kitlerin size, işbu isteğiniz üzerine, en kısa zamanda ulaştırılması hususunda gerekli hazırlıkları tamamladık. Eğer bize 9 Mart 2012 tarihine kadar yazılı olarak başka yönde bir istekte bulunmazsanız, söz konusu kitleri size tek sevkியatta ve 10 gün içerisinde iletacağız.
- İhtarnamenizin 6.1 maddesi: Bunların hepsi tarafınıza usulünce sağlanmıştır. Ancak diğer taraftan Hacettepe'nin kabul tutanakları gibi bazı önemli dokümanları doğru muhafaza edemediğinden haberdarız, çünkü bizden zaman zaman bunların suretlerini size faksalamamızı istemiştiniz.

Buna ilaveten, Sözleşme Ek-2 uyarınca Hacettepe ithalat işlemlerinin tamamlanmasından 2 ay önce cihazların montajlarının yapılacağı mahalleri tespit ederek buna dair bildirimleri bize yapmalıydı. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı üzere Hacettepe bize bu bildirimleri yapmamıştır. Esasında Hacettepe genel olarak Sözleşme Ek-2'deki süre gerekliliklerinin hepsini ihlal etmiştir.



- İhtarnamezinin 6.2 maddesi: Tüm Materyaller hava koşullarına karşı 4 ay boyunca dayanacak şekilde ambalajlanmıştır. Elimizde hala hastane koridorlarında bekleyen Materyallere dair bir çok fotoğraf bulunmaktadır.

- İhtarnamezinin 7. maddesi:

İhtarnamezinde tüm Materyallerin montaj ve kabul işlemlerinin tamamlanması için bize 10 gün verdiğinizi söylemektесiniz. Halihazırda montaj mahallerini tarafımıza henüz göstermemiş olduğunuz Materyaller ve tarafınızca otoparkta/açık havada yıllarca bırakıldığı için zarara uğramış cihazlar varken bu isteğinizi nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlayamıyoruz. Ve bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir istek realist ve mantıklı değildir.

İhtarnamezinde geçici kabulleri yapılmayan Materyallerin geçici kabullerindeki gecikmelerin garanti sürelerine eklenmesini istediğinizi söylemektесiniz. Yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere söz konusu gecikmelere Sözleşmeye aykırı olarak siz neden olurken (ve bunun hukuki sorumlusu siz iken), bu gecikilen sürelerin neden bizim garanti sürelerimize eklenilmesi gerektiğini anlayamıyoruz. Ve bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir istek hiç mantıklı değildir.

İhtarnamezinde teslimi geciken Materyallerde gecikilen her gün için cezai şart ödenmesini istediğinizi söylemektесiniz. Şayet teslimden kasıt Materyallerin Hacettepe'ye getirilmesi ise, Materyallerin hepsi Hacettepe'ye yıllar önce zamanında getirilmiştir (ama bunun ardından tarafınızca yıllarca otopark, hastane koridoru gibi yerlerde atıl bir vaziyette bekletilmiştir). Ama şayet teslimden kasıt kabulü yapılmayan Materyallerin kabulünün tamamlanması ise, Materyallerin kabulünü bunların monte edileceği yerleri göstermeyerek siz geciktirirken gecikilen günler için neden bizim cezai şart ödememiz gerektiğini anlamıyoruz. Ve bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir istek hiç mantıklı değildir.

İhtarnamezinde teminat mektubumuzu irat kaydetmek istediğinizi söylemektесiniz. Yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere biz yıllar boyu Sözleşme gereklerine titizlikle uymaya çalışırken siz Sözleşme'nin birçok hükmünü birçok defa ihlal ettiniz ve ihlal etmektесiniz. Sözleşmeyi ihlal eden taraf olarak teminat mektubunu paraya çevirme hakkınız bulunmamaktadır. Bu, diğer hukuka aykırılıkların yanı sıra, hakkın-kötüye kullanılması niteliğindedir. Ayrıca en temel hukuk prensiplerinden biri olan "hiç kimse kendi kusurundan menfaat elde edemez" ilkesine aykırıdır. Bu nedenle teminat mektubumuzu paraya çevirmenizi kabul etmiyoruz. Hukuka aykırı olarak böyle bir girişimde bulunmanız halinde, her türlü zarar ziyanımızın tazmini için aleyhinize adli ve idari yargı mercilerinde hukuki işlem başlatılacaktır.


Sonuç olarak, yukarıda izah edildiği üzere:

1. İşbu cevabi ihtarnameimiz konusu ihtarnameindeki haksız iddia ve isnatların hiçbirini kabul etmiyoruz; ve
2. Tarafınıza karşı faiz, zarar, tazminat ve bunlarla sınırlı olmamak üzere fazlaya dair her türlü hakkımızı saklı tutuyoruz.

Saygılarımızla,
İhtarnameye Cevap Veren
Marubeni Europe Plc
Adına Vekaleten
Av. Günhan Yalçın

Ek 1: 21 Şubat 2012 tarihinde Beşiktaş 11. Noterliği'nden 09159 yevmiye numarası ile gönderilen ihtarname.

Ek 2: 1 Mart 2012 tarihinde Beşiktaş 11. Noterliği'nden 10328 yevmiye numarası ile gönderilen ihtarname.





T.C.
BESİKTAŞ 11. NOTERİ
NURAY DEMİRTAŞ
Çarşı Caddesi No:22
1. Levent-İST.
Tel:(0212) 278 42 12

İHTARNAME

No 09159

21 Şubat 2012 10513

KEŞİDECI : Marubeni Europe Plc
VEKİLİ : Av. Günhan Yalçın
Levent Cad., Alt Zeren Sok., No: 7, Daire: 2, 34330, Levent, İstanbul
MUHATAP : Hacettepe Üniversitesi ("İdare")
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 06100, Sıhhiye, Ankara
KONU : TRP-1 Doğrusal İvmelendirici ("TRP1"), Varian ("Tedarikçi")
AÇIKLAMALAR :

Sayın Rektör,

Sizin 20 Ocak 2012 tarihli TRP1 ile ilgili yazınıza cevaben bu yazıyı dikkatinize sunmaktayız.

Aramızda imzalanmış olan 2 Ağustos 2001 tarihli sözleşmenin ("Anlaşma") 11.1 maddesi uyarınca, teçhizatın kurulumu işine, İdareden teçhizatın kurulacağı yere ait gereken bilgileri ve planların tarafımıza ulaşmasını takiben üç hafta içerisinde başlamamız gerekiyordu. Ancak TRP1 ile ilgili olarak İdareden bu bilgi bize hiç ulaşmadı.

Anlaşmanın 14.1(d) maddesi uyarınca, tüm teçhizat, ve beraberinde eklentileri ve aksesuarlarından, kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile ("Garanti Süresi") tüm imalat ve kurulum hataları yönünden sorumlu olacaktık.


17 Mart 2008'de, belli teçhizat için sahaların İdare tarafından zamanlı bir şekilde hazırlanmamış olduğundan şikayet etmek üzere Rektöre bir yazı yazdık (yazıda TRP1'e atıf yer almıyordu). Bu yazıda, İdarenin gecikmesinden ötürü, tedarikçilerimizden aldığımız garantinin ("Tedarikçi Garantisi"), garanti yönünden yükümlülüklerimizi artık kapsamıyor olduğunu açıkladık. Ayrıca, böylesi bir durumda, söz konusu garantilerin uyusmaması açısından bizim sorumluluk altında olmayacağımızı da açıkladık. Bu, tüm teçhizat için geçerli idi.

4 Temmuz 2008'de yeniden Rektöre yazı yazdık ve sahaya teslim edilmiş olan veya kısa bir süre sonra sahaya teslim edilecek olan, ve İdarenin gecikmesinden ötürü kurulumu yapılamamış olan, kalemlerin listesini gönderdik (özellikle TRP1'i bu yazıya dahil ettik ve bu kalemin hala Gümrükte olduğunu - İdarenin TAEK'ten gereken lisansları temin etmesindeki gecikme yüzünden Gümrükten çıkartılmadığını belirttik). Rektöre, yasal danışmanlarımıza danıştığımızı ve buna istinaden, İdarenin yükümlülüklerini ihlal ediyor olduğundan Anlaşmayı feshetme hakkımız olduğunu öğrendiğimizi, fakat böyle bir adım atmayı tercih etmediğimizi anlattık. Tedarikçinin Garantilerinin sona ermesi yüzünden, sorumluluk altında bulunmama durumumuzu da yeniden vurguladık.

Sonraki 9 Ocak 2009, 29 Temmuz 2009 ve 28 Temmuz 2010 tarihli yazılarımızda da, görebileceğiniz gibi, İdarenin Anlaşmayı ihlal etmeyi devam ediyor olmasından ötürü, Tedarikçi Garantilerinin sona eriyor olduğu konusunda Rektöre şikayetlerimizi yineledik.

11 Temmuz 2008'da yapılan bir toplantıda, Rektörden, TRP1 dahil olmak üzere belli teçhizat için uzatılmış Tedarikçi Garanti Süreleri için müzakere yapmamız yönünde bir talep geldi. 17 Mart 2008 tarihli yazımızda, İdareye böylesi bir hizmeti ücretsiz olarak sağlamayı teklif etmiştik. Bununla ilgili Tedarikçi ile de yazıştık ve 30 Ekim 2008'de Rektöre:

- 1) Tedarikçi Garantisini ücretsiz olarak 12 ay süre ile 31 Aralık 2011'e kadar uzatmak için Tedarikçiyle gerekli müzakereleri tamamlamış olduğumuzu, ve
- 2) Buna ek olarak Tedarikçinin, 31 Aralık 2011'den sonrasındaki 12 aylık bir süre için daha teçhizatın satış fiyatı üzerinden (söz konusu bedel 214,863 ABD Dolarıdır) %8.5'i bedelle



garantiyi uzatmayı teklif ettiğini belirtmek için bir yazı yazdık. İdare, bu teklifi kabul etmemeyi tercih etti.

TRP1, Hacette Üniversitesi Hastanesine 22 Temmuz 2008 tarihinde teslim edildi.

Anlaşmanın 11.3 maddesi uyarınca ilgili sahaya gereken altyapıyı getirmek İdarenin görevi idi.

4 Temmuz 2008 tarihli yazımızı takiben, sahanın TRP1'in kurulumu için ne zaman hazır olacağına dair defalarca bilgi talep ettik. Örneğin Profesör. Kutluk ile 29 Nisan 2009'da yaptığımız bir toplantıda, İdarenin mali kısıtları dolayısıyla sahanın 2009 yılının sonuna kadar hazır olmayacağını öğrendik. Bu tarihte de bir şey gerçekleşmedi ve 12 Ocak 2010'da, İdarenin inşaat müteahhidi Somut'tan, TRP1'in kurulumu için sahanın Mayıs 2010'un sonunda hazır olacağını belirten bir zaman çizelgesi elimize ulaştı.

29 Nisan 2010 tarihinde İdare, Tedarikçinin Türkiye'deki resmi distribütörü olan Varinak A.Ş.'ye ("Varinak"), ilgili sahanın sonunda, TRP1'in teslim tarihinden 21 aydan daha fazla bir süre sonra, TRP1'in kurulumu için hazır olduğunu bildirdi.

Buna istinaden, kurulumun hemen başlaması için gerekli ayarlamaları yaptık. Kurulum 10 Mayıs 2010'da başladı ve kurulum işi Temmuz 2010'un sonunda tamamlandı, ve bu noktada İdareye kurulum, eğitim, kontroller ve uygulamanın tamamlanmış olduğunu bildirdik ve dolayısıyla, kabul protokolünün tanzim edilmesini İdareden rica ettik. Ancak, bizim bilgilerimize göre, İdare, TRP1'in kabul testlerine ilişkin Anlaşmanın 12. Maddesinde tarif edilen resmi adımların hiçbirini atmadı.

12 Kasım 2010 tarihinde, İdareye, Hastanenin TRP1'i bir ayı aşkın bir süredir (ve kabul belgesi tanzim edilmeden) kullanmaya başladığından haberdar olduğumuzu ve buna göre İdarenin TRP1 teçhizatını devralmış olduğunu addettiğimizi belirten bir yazı yazdık.

Bu yazıda ayrıca Tedarikçi Garantisinin 31 Aralık 2011 tarihinde sona ereceğini de Rektöre hatırlattık.

13 Aralık 2010 tarihinde kabul protokolü ("Devir Teslim Tarihi") imzalandı.

20 Ocak 2012 tarihli yazınız, TRP1'de yer alan belli sorunları kalemler halinde göstermekte ve gerekli adımları atmamızı talep ettiğinizi, aksi halde cezalar ve tazminat için yasal prosedürü başlatacağınızı belirtmektedir.

Şunu belirtmek isteriz ki biz, her zamandan, Anlaşma altındaki yükümlülüklerimizi tümüyle yerine getirdik.

İdare, 30 Ekim 2008 tarihinden beri, Tedarikçi Garantisinin 31 Aralık 2011 tarihinde sona ereceğinden haberdardı.

26 Ocak 2012 tarihindeki toplantımız sırasında bize bildirmiş olduğunuz talebe istinaden, sizin için 2008 yılında yürüttüğümüz müzakerelere benzer şekilde, hem tamir maliyetini hem de Tedarikçiden ilave bir garanti süresi edinme maliyetini araştırdık – Devir Teslim Tarihinden başlayarak, yıllık sürenin sona ermeyen kısmını almak yönündeki isteğinizi belirtmiştiniz.


Buna göre Varinak'tan şu teklifleri aldık.

TRP1'i onarmanın fiyatı (Tedarikçi Garantisini uzatmadan) 74,070 TL'dir (lütfen ekteki HAC220120113-001 sayılı teklife bakınız).

İkinci ekli tekliften de görebileceğiniz gibi (HAC20120130-002), hem tamirin yapılması hem de garanti süresinin uzatılmasının fiyatı aylık 37,200 ABD Dolarıdır (ve bu da on iki aylık bir dönem için yaklaşık 253,236 ABD Dolarına denk gelmektedir). Bunun, İdarenin 2008 yılının sonuna doğru kabul etmesi için teşvik ettiğimiz tekliften daha pahalı olduğunu belirtmek isteriz.

Dikkat ediniz ki, yukarıda yer alan fiyatlara KDV vs. dahil değildir.

№ 09/10513



Lütfen bize yazılı olarak hangi seçeneği tercih ettiğinizi bildiriniz (sadece onarım mı yoksa onarım artı garanti süresinin uzatılması mı; ve ikinci seçeneği seçmeniz durumunda, ne kadar süre ile garantinin uzatılmasını istediğinizi de belirtiniz). Tedarikçiyi ve Varinak'ı buna göre bilgilendireceğiz. Bunun ardından ödemeyi doğrudan Varinak'a yapmanız gerekecektir.

Bu arada şunu da belirtmek isteriz ki, İdarenin Anlaşmayı ihlallerinden ötürü zarara uğradık ve buna ilaveten daha fazla zarara uğrama ihtimalimiz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Türk Borçlar Kanunu'nun 96. maddesi altındaki haklar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, İdarenin Anlaşmayı ihlallerinden ötürü ortaya çıkan tüm zararlarımız ve kayıplarımız için İdareye karşı tazminat ve fazlaya dair diğer her türlü hak, talep ve yetkilerimiz saklıdır.


Yazınızda ayrıca Anlaşmanın şartları uyarınca Garanti süresi sırasında bir servis istasyonu da kurmadığımızı belirtmişsiniz. 26 Ocak 2012 tarihli bir sonraki toplantımızda açıklaştırdığımız üzere bu doğru değildir. Biz İdareden defalarca bir mühendis istasyonu kurmamız için bir alan göstermesini rica ettik ancak bize alan olmadığını ve temsilcimiz İncekara'nın Ankara'da yerleşik olmasından ötürü, servis mühendisinin oradan çalışmasının aynı derecede elverişli olduğu bize söylendi.

Saygılarımızla,

Av. Günhan Yalçın

Sayın noter,

İşbu ihtamamenin bir nüshasının muhatabına tebliğine, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanması ve bir nüshasının da tarafınıza verilmesini rica ederiz.

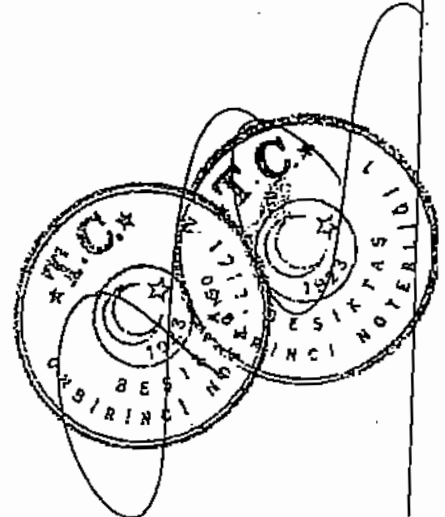



T.C.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Ş. NURAY DEMİRTAŞ
Çarşı Caddesi No:22
1. Levent-İST.
Tel:(0212) 278 42 12

İHTARNAME

- 1 Mart 2012

İHTAR EDEN : Marubeni Europe Plc
River Plate House, 7-11 Finsbury Circus, London
EC2M 7AF, İngiltere

VEKİLİ : Av. Günhan Yalçın
Levent Cad. Alt Zeren Sok., No: 7, Daire: 2, 34330,
Levent, İstanbul

MUHATAP : Hacettepe Üniversitesi ("İdare")
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 06100, Sıhhiye,
Ankara

KONU : Hijyenik Klima Ekipmanı referans HKS-1 ("HKS-1
Ekipmanı") – Weiss ("Tedarikçi")

ACIKLAMALAR :

Sayın Rektör,

Bizden HKS-1 Ekipmanı'nı kurmamızı istediğiniz 23 Ocak 2012 tarihli yazınıza cevaben bu yazıyı göndermekteyiz.

Aramızda akdedilen 2 Ağustos 2001 tarihli sözleşmenin ("Sözleşme") 11.1 maddesi ve Teknik Şartname'nin D/1 ve G/1/(a) maddelerine göre ekipmanın kurulması için gerekli mahalli bize göstermeniz ve bu mahalle dair mimari planları tarafımıza iletmeniz, ve bizim de bunun ardından üç hafta içinde ekipmanları kurma işine başlamamız gerekmektedir.


HKS-1 Ekipmanı Hacettepe Üniversitesine 27 Temmuz 2007'de teslim edilmiştir.

Sıklıkla talep etmemize rağmen; Sözleşmenin ve Teknik Şartnamenin yukarıda değinilen maddeleri uyarınca tarafınızca yapılması gereken yer göstermesini ve verilmesi gerekli bilgileri çok uzun süre sizden alamadık.

Sonunda 23 Ocak 2012 tarihli yazınızda, yani teslimattan dört buçuk yıl sonra montaj mahallinin kurulum için hazır olduğu haberini verdiniz.

17 Mart 2008 tarihinde, Rektör'e, HKS-1 ekipmanı da dâhil olmak üzere ekipmanların kurulum/montaj mahallinin İdare tarafından zamanında hazırlanmadığı ve bize gösterilmediğini bildiren bir şikâyet yazısı gönderdik. Bu yazıya ekli olan dokümanda İdarenin montaj mahalli inşaatı için hala yerel bir ihale duyurusunda bulunduğu ve montaj mahallinin 2008 yılının son çeyreğinde tamamlanma olasılığı olduğu bildirilmekteydi, ve ancak bunun ardından HKS-1 ekipmanı kurulabilecekti.

4 Temmuz 2008 tarihinde Rektöre tekrar bir yazı yazdık ve HKS-1 ekipmanı da dahil montaj mahalline gönderilen ekipman listesini belirterek, İdareden kaynaklı gecikme nedeniyle bu ekipmanların montajının yapılamadığını bildirdik. Buna ilaveten Tedarikçi garantilerinin sürelerinin İdareden kaynaklı gecikme nedeniyle dolması ve sonuç olarak garanti yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle sorumluluğu kabul edemeyeceğimizi de vurguladık.



№ 10328

İdare, bize, HKS-1 ekipmanının belirli bir tarzda tutulması gerektiğini haber vermediğimiz şeklinde bir şikayette bulundu.

Buna cevaben şunları belirtmek isteriz:

- (1) İdare, Sözleşmenin 11.10 maddesine göre, kurulum sahası temin edilene kadar ekipmanları emniyetli ve kuru bir yerde özel depolama şartlarına uygun olarak muhafaza etmekle sorumludur ve
- (2) Temmuz 2008 de Ecz. M. Nejat Ertürk'ün de imzasının bulunduğu bir yazıyı Tedarikçi Weiss'a gönderdik ve burada İdare "ürünlerin 26 Temmuz 2007 tarihinden itibaren emniyetli ve kuru bir yerde, özel depolama şartlarına uygun olarak muhafaza edildiğini" ifade etmekteydi.

Bunlara rağmen, 16 Aralık 2009 tarihinde, Tedarikçi'den, hijyenik hava klima birimleri türü Mediclean ile entegre PLC kontrolörlerin açık bir otoparkta ve kar, yağmur, direkt güneş ışığı gibi sert hava koşulları altında bırakılmış olduğu bilgisini aldık. Ambalajları hasar görmüştü ve HKS-1 ekipmanı sudan zarar görmüştü. Bunların fotoğraflı kanıtları ektedir. Sonuç olarak HKS-1 ekipmanının, İdareniz tarafından, Sözleşme ve Teknik Şartname hükümlerine aykırı olarak, yaklaşık 3 yıl süre ile dışarıda ve bu kötü koşullarda bekletildiği anlaşılmaktadır.

Tedarikçi, aynı zamanda, ekipmanlara bir montaj mahalli oluşturmak amacıyla İdareniz tarafından başlatılan bina inşaatında herhangi bir ilerleme sağlanmadığını da tarafımıza bildirmişti. Bunun fotoğraflı kanıtları da elimizde bulunmaktadır.

Sözleşme'de belirtilen Türkiye temsilcimiz İncekara Teknik Cihazlar Endüstri ve Ticaret A.Ş. derhal bu endişelerini İdarenize bildirmişti, ve 18 Ocak 2010'da yapılan bir toplantıda bu konuyu Profesör Kutluk ile detaylı olarak görüşmüştür. Profesör Kutluk o toplantıda HSK-1 ekipmanlarının yine de hasarlı olarak kurulumunun olası olduğunu düşünmekteydi.

Ayrıca, sözü geçen toplantıda, Tedarikçi'den aldığımız garantinin süresinin halihazırda dolmuş olduğu ancak İdarenin yapması gerekli mahâl tayini ve buna ilişkin ön hazırlıkların hiçbirini henüz tamamlamamış olduğu da, tarafımızca belirtildi. Buna ilaveten, 17 Mart 2008 ve 4 Temmuz 2008 tarihli yazılarımıza da tarafımızca değinildi, ve Sözleşmenin 14.1 (d) maddesinde belirtilen garantinin -İdareden kaynaklanan nedenlerle- artık İdareye karşı herhangi bir yükümlülüğümüzü doğurmayacağı ve herhangi bir garanti uyumsuzluğundan sorumlu olmayacağımızı açıkladık.

Bu arada, Sözleşme'nin İdare tarafından ihlalinin devamı nedeniyle Tedarikçi garantisinin geçersizliği hususunda Rektöre şikâyetle bulunduğumuz 9 Ocak 2009, 29 Temmuz 2009 ve 28 Temmuz 2010 tarihli yazılarımıza da atıfta bulunuyoruz. Lütfen bu yazıları da bir kez daha dikkatle inceleyiniz.

HKS-1 Ekipmanı ile ilgili olarak, esasında ortada garanti süresinin dolmasından kaynaklı bir problemde ziyade, HKS-1 ekipmanının yanlış muhafazası nedeniyle ciddi derecede hasar görmüş olduğu ve problemin bundan kaynaklandığını da açıkladık. 26 Ocak 2012 tarihinde Profesör Uğur ile yaptığımız toplantıda, konuya kendisinin de anladığını not aldık. Lütfen aşağıdaki toplantı tutanağının bir kopyasını inceleyiniz (ki bunu size söz konusu toplantının hemen ardından göndermiştik):



№ 10328

"HU (Hacettepe Üniversitesi), MEU ya (Marubeni Europe Plc'ye) 25 Ocak 2012 tarihinde bir yazı yazarak Weiss ekipmanının kurulmasını istediğini söyledi. Steven Newton buna, MEU nun hasarlı ekipman kurarak hastanede yangına neden olabilecek bir tehlikeye yol açmalarını mı istediğini sorarak cevap verdi. HU "Hayır" dedi. Steven Newton ekipmanının hasar görmesinin nedenini 3 yıl boyunca sözleşmeye aykırı hava koşullarında muhafaza edilmesinden kaynaklandığını söyledi."

№ 10513

Rektör buna karşılık, depolama yeri hakkında yazı ile uyarı yapıp yapmadığınızı sordu. Steven Newton, HU tarafından da imzalanmış olan yazıda, ekipmanın kuru ve emniyetli bir yerde depolandığını belirttiğini gösterdi. Rektör yazının tarihini sordu ve "Bu yazıyı dün yazmadığınızı nereden bilelim?" dedi. Steven Newton yazı üzerindeki orijinal imzayı gösterdi ve "bu kendi ekibiniz tarafından imzalandı, dün yazmış olmamızın imkanı yok ve e-mail üzerindeki tarih bilgileri ile de yazının asıl tarihini kanıtlayabiliriz dedi."

Rektör bununla ilgili kişiyi çağırdı ve neden bu yazıyı imzalamadığınızı sordu. İlgili kişi de kendisine Prof. Kutluk'un imzalama talimatı verdiğini, ancak İngilizce bilmediğini ve ürünlerin de nerede muhafaza edildiğini bilmediğini söyledi. Rektör MEU'ya bu ekipmanının onarım ve çalıştırılma maliyetinin ne olacağını sordu. Sayın Kılıç cevap vererek, Beyaz Teknik (Weiss distribütörü) firmasının 90K Euroya onarabileceğini duyduğunu söyledi ancak Steven Newton bunun garanti kapsamında olmadığını ve MEU'nun sorumluluğunda olmadığını hatırlattı. Rektör konuyu ele alacaklarını söyledi ve MEU'nun neden kurulum yapmak istemediğini belirten maddeleri yazı ile göndermesini istedi."


Tedarikçi tarafından bize söylenene göre, ve İdareyi bilgilendirdiğimiz üzere, HKS-1 ekipmanlarının bazıları şu an kullanım için uygun değildir. Ancak Tedarikçi kanal ve vanalar gibi hasar görmeyen maddeleri mümkün olduğunca kurabileceğini belirtmektedir.

Bu arada İdare ve Tedarikçi arasında toplantılar yapılmasını ve hasarlı HKS-1 ekipmanlarının değiştirilmesi talebini İdare adına Tedarikçiye iletmeyi önerdik. Ancak İdarenin Tedarikçiye hasarlı ürünleri değiştirmekle ilgili bir talepte bulunmadığını anlıyoruz, ve yazınızdan hasarlı HKS-1 ekipmanının kurulumunu istediğinizi düşünüyoruz.

19 Nisan 2011 tarihli yazımızda, İdarenin ekipmanı kurma niyetini öğrendiğimizde İdarenin HKS-1 ekipmanının fonksiyonelliği ile ilgili kendi araştırmalarını yapmasını tavsiye ettik. İdareye bu yazıda ekipman garantisinin sona erdiği tekrar hatırlatmıştık.

Sonuç olarak, HKS-1 Ekipmanı'nın kurulması ve çalıştırılması talebinize cevap olarak söz konusu ekipmandaki zararlar:

- (i) ekipmanının montajının yapılacağı mahalli bize zamanında bildirmemenizden (ekipman size 27 Temmuz 2007 tarihinde teslim edilmişken, siz bunun monte edileceği mahalli bize 23 Ocak 2012 tarihinde, yani fiziki teslimden yaklaşık 5 yıl sonra, bildirmektesiniz) ve ilgili mimari planları tarafımıza iletmemenizden, ve bu suretle Sözleşme'nin 11.1 maddesi ve Teknik Şartname'nin D/1 ve G/1(a) maddelerini ihlal etmenizden; ve
- (ii) söz konusu ekipmanı en az 3 yıl süreyle açık bir otoparkta tutmanızdan ve kar yağmur ve doğrudan güneş ışığı gibi sert hava koşullarına maruz bırakmanızdan, ve bu suretle Sözleşme'nin 11.10 ve ilgili diğer maddelerini ihlal etmenizden,



No 10328

kaynaklanmıştır.

Size belirttiğimiz ve Tedarikçi tarafından da önemle uyarıldığı üzere, Tedarikçi, HKS-1 Ekipmanı'nın şu anki haliyle güvenli bir şekilde çalışacağı hususunda çok ciddi şüphelere sahiptir. Şayet bizim ve Tedarikçi'nin yaptığı bu uyarılar dikkate alınmayarak söz konusu ekipman monte edilir ve kullanılırsa, bundan doğabilecek kişilerin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağımızı ihtar ederiz.

No 10513


Referans için yukarda değinilen yazışmalarımıza tekrar atıfta bulunuyoruz.


Saygılarımızla,

İhtar eden
Marubeni Europa Plc
adına vekaleten
Av. Günhan Yalçın



Ek 1 ve 2: HKS-1 Ekipmanı'nın hastaneniz otoparkında muhafaza edildiğini gösteren 2 adet fotoğraf.



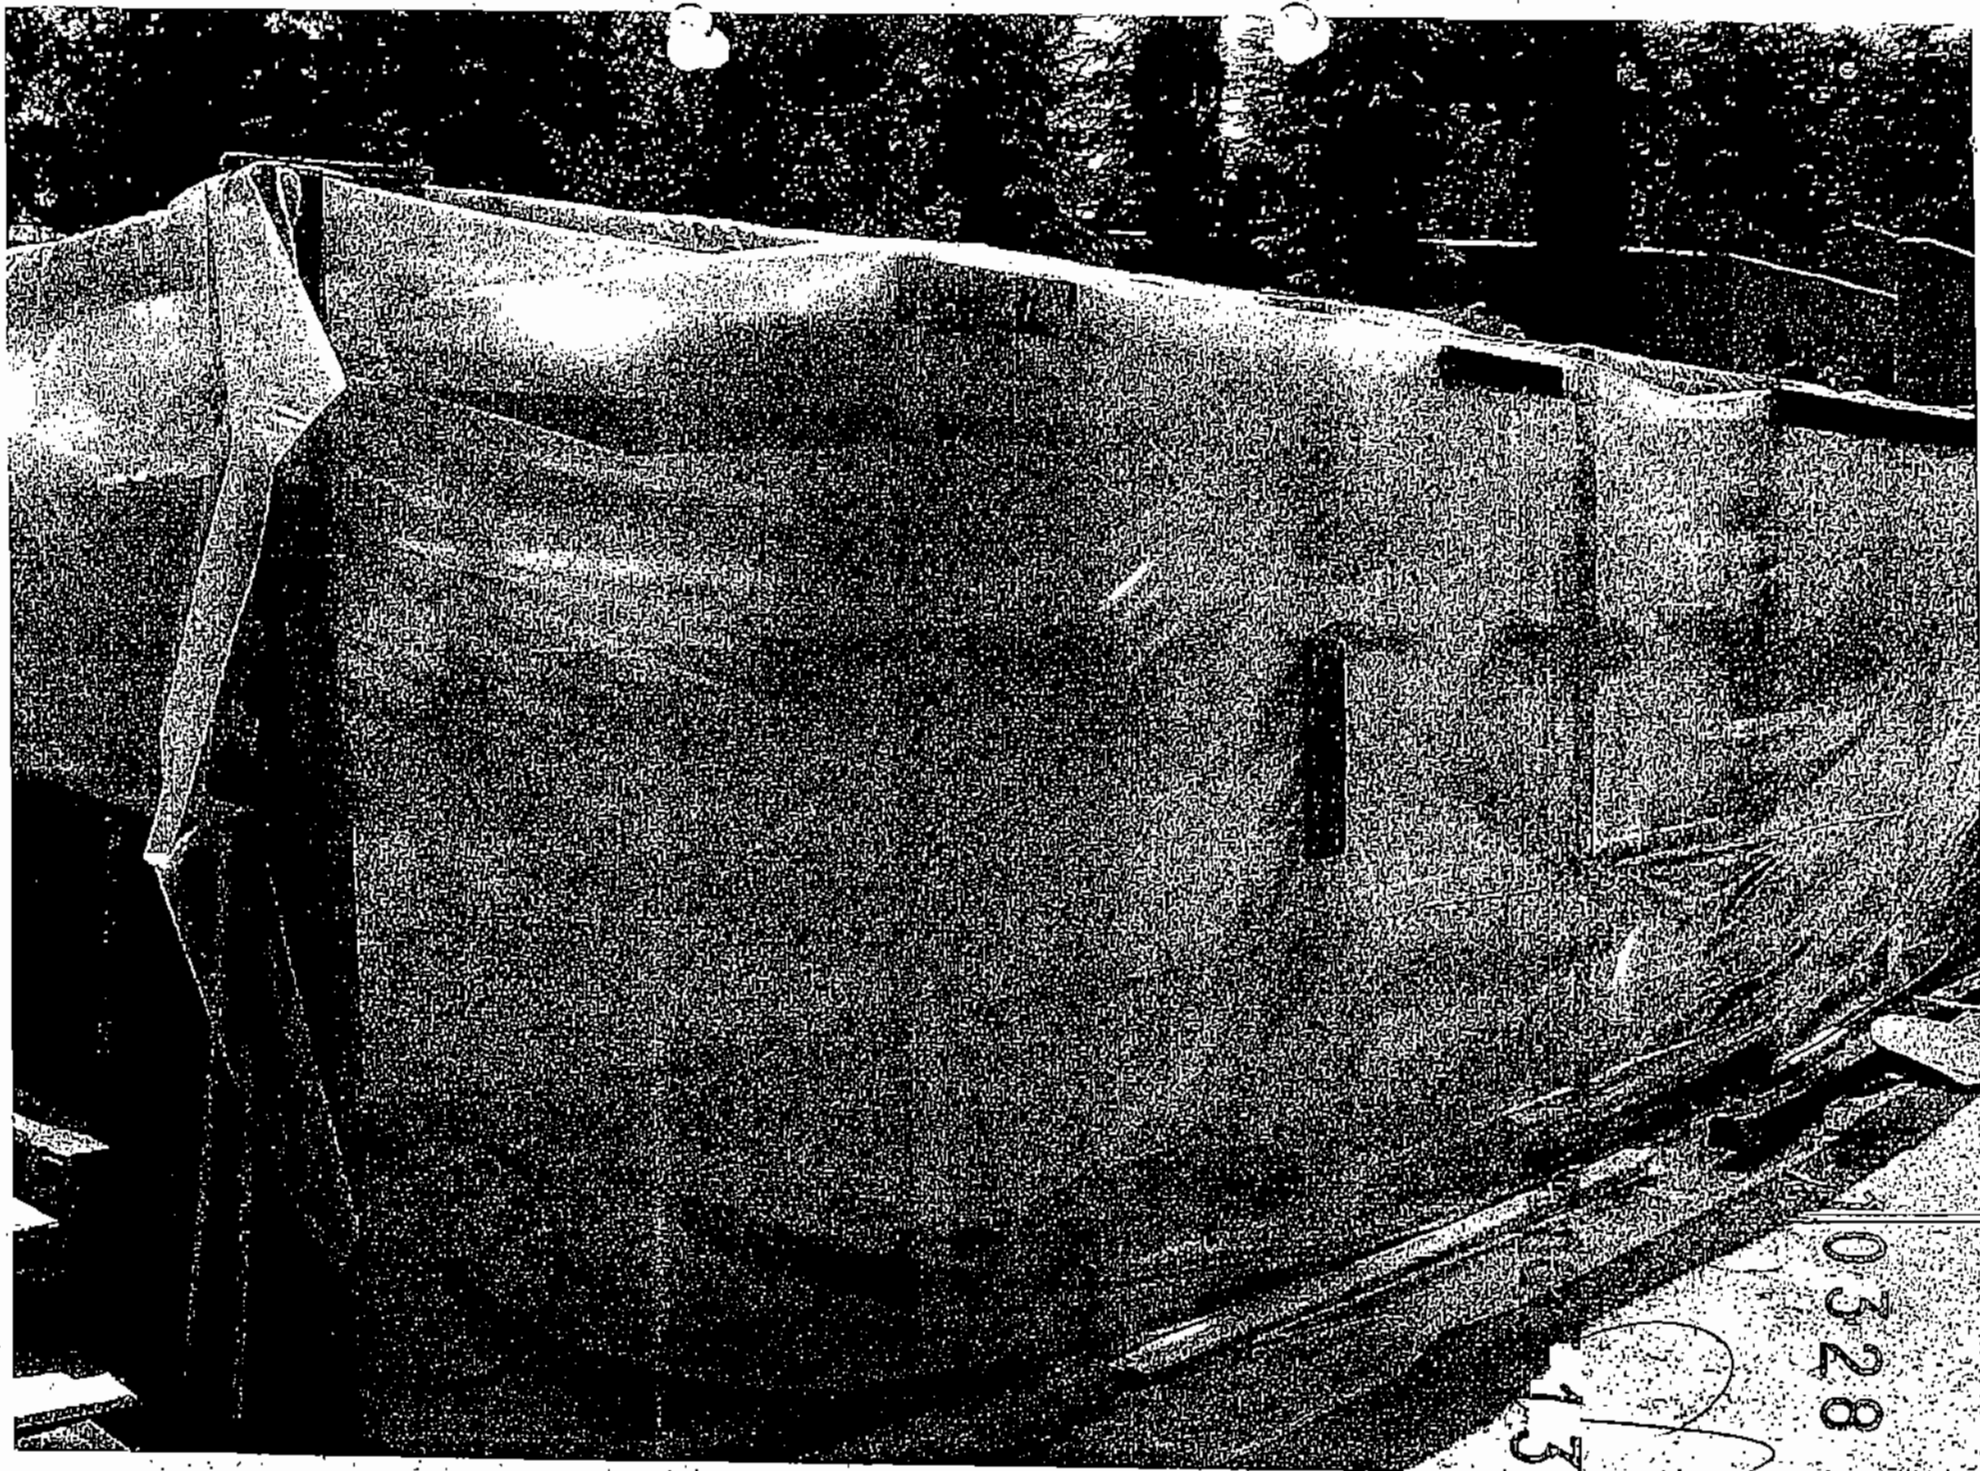

Ek-4



NO 10513

NO 10328

EK-2

Türkiye Cumhuriyeti

Yev.No: (B)

№ 10328

01 Mart 2012

T.C.
BEŞİKTAŞ
11.NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ
11.NOTERİ
ŞAZİYE NURAY
DEMİRTAŞ

ÇARŞI CAD.N:22
1.LEVENT
BEŞİKTAŞ-İST.
Tel : 212-278-42-12



Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) ilgilinin BEŞİKTAŞ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN verilmiş 14.8.2008 tarih, 8044 kayıt, K11 seri ve 475094 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre HATAY ili ERZİN ilçesi KARAMUSTAFALI mahallesi / köyü 5 cilt, 30 aile sıra, 96 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı İLHAN, ana adı YASEMİN, doğum tarihi 1.5.1976, doğum yeri DÖRTYOL olan ve halen AKAT MAH. MELODİ SK 20/16 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 29584711928 T.C. kimlik numaralı GÜNHAN YALÇIN (MARUBENİ EUROPE PLC'ye vekaleten hareketle) isteği üzerine 1 adedinin muhataba tebliğ edilmek üzere işleme alındığını, birisinin kendisine verildiğini, birinin de dairede saklandığını onaylarım. İkibinoniki yılı Mart ayının birinci günü 01.03.2012

BEŞİKTAŞ 11-NOTERİ
ŞAZİYE NURAY DEMİRTAŞ
Vekill İmzaya Yetkili Başkatip SENEM
KARAMAN

DAYANAK: Beşiktaş 11.Noterliğinden tanzim ve tasdikli, 24.02.2012 tarihli, 9/48 yevmiye sayılı tercüme vekaletname ile MARUBENİ EUROPE PLC'nin GÜNHAN YALÇIN'ı vekil tayin ettiği ve yetkileri görülmüştür.

İşbu dayanak Noterlik Yasasının 79.maddesine göre eklenmiştir.

BEŞİKTAŞ 11.NOTERİ
ŞAZİYE NURAY DEMİRTAŞ
Vekili İmzaya Yetkili Başkatip SENEM
KARAMAN



KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli maktbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
(Ş/E) A/S Ka=1022/0, A/S YAZI=2/0, A/S DeK.=1/0, DYNK.Sf.Ka.=,200.13



* T.C.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Ş. NURAY DEMİRTAŞ
Çarşı cad. No: 26/2
1. LEVENT/İSTANBUL

(B) Y.No.:
Tarih: 02-Mart-2012

278.42.12/279.01.05


İşbu İHTARNAME ilgilisinin kimliğini ibraz ettiği (MARU-
BENİ EUROPE Plc adına vekaleten hareketle) Şahıs ve kim
liği dairemizce malum ve marufumuz olan Av: GÜNHAN YALÇIN
'ın isteği üzerine tebliğ olunur. İki Mart ikabinoniki Cuma.
02/03/2012

S/K
D1-Y1-D1

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Ş. NURAY DEMİRTAŞ
Yerine İmzaya Yetkili
BAŞKATİP SENEM KARAMAN

DAYANAK :

Beşiktaş 11. Noterliğinden tasdikli 21.02.2012 tarih ve
9148 y.nolu tercüme vekaletnamede MARUBENİ EUROPE
plc' nin Av: GÜNHAN YALÇIN'ı vekil tayin ettiği ve
yetkileri görülmüştür.



105 13

№ 10328

- 1 Mart 2012

Ek-586

T.C.
BESİKTAŞ 11. NOTERİ
Ş. NURAY DEMİRTAŞ
Çarşı Caddesi No:22
1. Levent-İST.
Tel:(0212) 278 42 12

İHTARNAME

İHTAR EDEN : Marubeni Europe Plc
River Plate House, 7-11 Finsbury Circus, London
EC2M 7AF, İngiltere

VEKİLİ : Av. Günhan Yalçın
Levent Cad. Alt Zeren Sok., No: 7, Daire: 2, 34330,
Levent, İstanbul

MUHATAP : Hacettepe Üniversitesi ("İdare")
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 06100, Sıhhiye,
Ankara

KONU : Hijyenik Klima Ekipmanı referans HKS-1 ("HKS-1
Ekipmanı") – Weiss ("Tedarikçi")

AÇIKLAMALAR :

Sayın Rektör,

Bizden HKS-1 Ekipmanı'nı kurmamızı istediğiniz 23 Ocak 2012 tarihli yazınıza cevaben bu yazıyı göndermekteyiz.

Aramızda akdedilen 2 Ağustos 2001 tarihli sözleşmenin ("Sözleşme") 11.1 maddesi ve Teknik Şartname'nin D/1 ve G/1/(a) maddelerine göre ekipmanın kurulması için gerekli mahalli bize göstermeniz ve bu mahalle dair mimari planları tarafımıza iletmeniz, ve bizim de bunun ardından üç hafta içinde ekipmanları kurma işine başlamamız gerekmektedir.


HKS-1 Ekipmanı Hacettepe Üniversitesine 27 Temmuz 2007'de teslim edilmiştir.

Sıklıkla talep etmemize rağmen, Sözleşmenin ve Teknik Şartnamenin yukarıda değinilen maddeleri uyarınca tarafınızca yapılması gereken yer göstermesini ve verilmesi gerekli bilgileri çok uzun süre sizden alamadık.

Sonunda 23 Ocak 2012 tarihli yazınızda, yani teslimattan dört buçuk yıl sonra, montaj mahallinin kurulum için hazır olduğu haberini verdiniz.

17 Mart 2008 tarihinde, Rektör'e, HKS-1 ekipmanı da dâhil olmak üzere ekipmanların kurulum/montaj mahallinin İdare tarafından zamanında hazırlanmadığı ve bize gösterilmediğini bildiren bir şikâyet yazısı gönderdik. Bu yazıya ekli olan dokümanda İdarenin montaj mahalli inşaatı için hala yerel bir ihale duyurusunda bulunacağı ve montaj mahallinin 2008 yılının son çeyreğinde tamamlanma olasılığı olduğu bildirilmekteydi, ve ancak bunun ardından HKS-1 ekipmanı kurulabilecekti.

4 Temmuz 2008 tarihinde Rektöre tekrar bir yazı yazdık ve HKS-1 ekipmanı da dâhil montaj mahalline gönderilen ekipman listesini belirterek, İdareden kaynaklı gecikme nedeniyle bu ekipmanların montajının yapılamadığını bildirdik. Buna ilaveten, Tedarikçi garantilerinin sürelerinin İdareden kaynaklı gecikme nedeniyle dolması ve sonuç olarak garanti yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle sorumluluk kabul edemeyeceğimizi de vurguladık.



№ 10328

İdare, bize, HKS-1 ekipmanının belirli bir tarzda tutulması gerektiğini haber vermediğimiz şeklinde bir şikayette bulundu.

Buna cevaben şunları belirtmek isteriz:

- (1) İdare, Sözleşmenin 11.10 maddesine göre, kurulum sahası temin edilene kadar ekipmanları emniyetli ve kuru bir yerde özel depolama şartlarına uygun olarak muhafaza etmekle sorumludur ve
- (2) Temmuz 2008 de Ecz. M. Nejat Ertürk'ün de imzasının bulunduğu bir yazıyı Tedarikçi Weiss'a gönderdik ve burada İdare "ürünlerin 26 Temmuz 2007 tarihinden itibaren emniyetli ve kuru bir yerde, özel depolama şartlarına uygun olarak muhafaza edildiğini" ifade etmekteydi.

№ 10513

Bunlara rağmen, 16 Aralık 2009 tarihinde, Tedarikçi'den, hijyenik hava klima birimleri türü Mediclean ile entegre PLC kontrolörlerin açık bir otoparkta ve kar, yağmur, direkt güneş ışığı gibi sert hava koşulları altında bırakılmış olduğu bilgisini aldık. Ambalajları hasar görmüştü ve HKS-1 ekipmanı sudan zarar görmüştü. Bunların fotoğraflı kanıtları ektedir. Sonuç olarak HKS-1 ekipmanının, İdareniz tarafından, Sözleşme ve Teknik Şartname hükümlerine aykırı olarak, yaklaşık 3 yıl süre ile dışarıda ve bu kötü koşullarda bekletildiği anlaşılmaktadır.

Tedarikçi, aynı zamanda, ekipmanlara bir montaj mahalli oluşturmak amacıyla İdareniz tarafından başlatılan bina inşaatında herhangi bir ilerleme sağlanmadığını da tarafımıza bildirmişti. Bunun fotoğraflı kanıtları da elimizde bulunmaktadır.

Sözleşme'de belirtilen Türkiye temsilcimiz İncekara Teknik Cihazlar Endüstri ve Ticaret A.Ş. derhal bu endişelerini İdarenize bildirmişti, ve 18 Ocak 2010'da yapılan bir toplantıda bu konuyu Profesör Kutluk ile detaylı olarak görüşmüştür. Profesör Kutluk o toplantıda HSK-1 ekipmanlarının yine de hasarlı olarak kurulumunun olası olduğunu düşünmekteydi. *Nikol Hosacı makremeyi kurduttu.*

Ayrıca, sözü geçen toplantıda, Tedarikçi'den aldığımız garantinin süresinin halihazırda dolmuş olduğu ancak İdarenin yapması gerekli mahal tayini ve buna ilişkin ön hazırlıkların hiçbirini henüz tamamlamamış olduğu da, tarafımızca belirtildi. Buna ilaveten, 17 Mart 2008 ve 4 Temmuz 2008 tarihli yazılarımıza da tarafımızca değinildi, ve Sözleşmenin 14.1 (d) maddesinde belirtilen garantinin -İdareden kaynaklanan nedenlerle- artık İdareye karşı herhangi bir yükümlülüğümüzü doğurmayacağı ve herhangi bir garanti uyumsuzluğundan sorumlu olmayacağımızı açıkladık.

Bu arada, Sözleşme'nin İdare tarafından ihlalinin devamı nedeniyle Tedarikçi garantisinin geçersizliği hususunda Rektöre şikâyetle bulunduğumuz 9 Ocak 2009, 29 Temmuz 2009 ve 28 Temmuz 2010 tarihli yazılarımıza da atıfta bulunuyoruz. Lütfen bu yazıları da bir kez daha dikkatle inceleyiniz.

HKS-1 Ekipmanı ile ilgili olarak, esasında ortada garanti süresinin dolmasından kaynaklı bir problemten ziyade, HKS-1 ekipmanının yanlış muhafazası nedeniyle ciddi derecede hasar görmüş olduğu ve problemin bundan kaynaklandığını da açıkladık. 26 Ocak 2012 tarihinde Profesör Uğur ile yaptığımız toplantıda, kendisinin de anladığını not aldık. Lütfen aşağıdaki toplantı tutanağının bir kopyasını inceleyiniz (ki bunu size söz konusu toplantının hemen ardından göndermiştik):



№ 10328

"HU (Hacettepe Üniversitesi), MEU ya (Marubeni Europe Plc'ye) 25 Ocak 2012 tarihinde bir yazı yazarak Weiss ekipmanının kurulmasını istediğini söyledi. Steven Newton buna, MEU nun hasarlı ekipman kurarak hastanede yangına neden olabilecek bir tehlikeye yol açmalarını mı istediğini sorarak cevap verdi. HU "Hayır" dedi. Steven Newton ekipmanın hasar görmesinin nedenini 3 yıl boyunca sözleşmeye aykırı hava koşullarında muhafaza edilmesinden kaynaklandığını söyledi.

№ 10513

Rektör buna karşılık, depolama yeri hakkında yazı ile uyarı yapıp yapmadığınızı sordu. Steven Newton, HU tarafından da imzalanmış olan yazıda, ekipmanın kuru ve emniyetli bir yerde depolandığını belirttiğini gösterdi. Rektör yazının tarihini sordu ve 'Bu yazıyı dün yazmadığınızı nereden bilelim?' dedi. Steven Newton yazı üzerindeki orijinal imzayı gösterdi ve "bu kendi ekibiniz tarafından imzalandı, dün yazmış olmamızın imkanı yok ve e-mail üzerindeki tarih bilgileri ile de yazının asıl tarihini kanıtlayabiliriz dedi."

Rektör bununla ilgili kişiyi çağırdı ve neden bu yazıyı imzaladığını sordu. İlgili kişi de kendisine Prof. Kutluk' un imzalama talimatı verdiğini, ancak İngilizce bilmediğini ve ürünlerin de nerede muhafaza edildiğini bilmediğini söyledi. Rektör MEU'ya bu ekipmanın onarım ve çalıştırılma maliyetinin ne olacağını sordu. Sayın Kılıç cevap vererek, Beyaz Teknik (Weiss distribütörü) firmasının 90K Euroya onarabileceğini duyduğunu söyledi ancak Steven Newton bunun garanti kapsamında olmadığını ve MEU'nun sorumluluğunda olmadığını hatırlattı. Rektör konuyu ele alacaklarını söyledi ve MEU'nun neden kurulum yapmak istemediğini belirten maddeleri yazı ile göndermesini istedi."


Tedarikçi tarafından bize söylenene göre, ve İdareyi bilgilendirdiğimiz üzere, HKS-1 ekipmanlarının bazıları şu an kullanım için uygun değildir. Ancak Tedarikçi kanal ve vanalar gibi hasar görmeyen maddeleri mümkün olduğunca kurabileceğini belirtmektedir.

Bu arada İdare ve Tedarikçi arasında toplantılar yapılmasını ve hasarlı HKS-1 ekipmanlarının değiştirilmesi talebini İdare adına Tedarikçiye iletmeyi önerdik. Ancak İdarenin Tedarikçiye hasarlı ürünleri değiştirmekle ilgili bir talepte bulunmadığını anlıyoruz, ve yazınızdan hasarlı HKS-1 ekipmanının kurulumunu istediğini düşünürüz.

19 Nisan 2011 tarihli yazımızda, İdarenin ekipmanı kurma niyetini öğrendiğimizde İdarenin HKS-1 ekipmanının fonksiyonelliği ile ilgili kendi araştırmalarını yapmasını tavsiye ettik. İdareye bu yazıda ekipman garantisinin sona erdiği tekrar hatırlatmıştık.

Sonuç olarak, HKS-1 Ekipmanı'nın kurulması ve çalıştırılması talebinize cevap olarak söz konusu ekipmandaki zararlar:

- (i) ekipmanının montajının yapılacağı mahalli bize zamanında bildirmemenizden (ekipman size 27 Temmuz 2007 tarihinde teslim edilmişken, siz bunun monte edileceği mahalli bize 23 Ocak 2012 tarihinde, yani fiziki teslimden yaklaşık 5 yıl sonra, bildirmenizden), ve ilgili mimari planları tarafımıza iletmemenizden, ve bu suretle Sözleşme'nin 11.1 maddesi ve Teknik Şartname'nin D/1 ve G/1/a) maddelerini ihlal etmenizden; ve
- (ii) söz konusu ekipmanı en az 3 yıl süreyle açık bir otoparkta tutmanızdan ve yağmur ve doğrudan güneş ışığı gibi sert hava koşullarına maruz bırakmanızdan, ve bu suretle Sözleşme'nin 11.10 ve ilgili diğer maddelerini ihlal etmenizden;



№ 10328

kaynaklanmıştır.

Size belirttiğimiz ve Tedarikçi tarafından da önemle uyarıldığı üzere, Tedarikçi, HKS-1 Ekipmanı'nın şu anki haliyle güvenli bir şekilde çalışacağı hususunda çok ciddi şüphelere sahiptir. Şayet bizim ve Tedarikçi'nin yaptığı bu uyarılar dikkate alınmayarak söz konusu ekipman monte edilir ve kullanılırsa, bundan dolayı oluşabilecek kişilerin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağımızı bildiririz.

№ 10513


Referans için yukarda değinilen yazışmalarımıza tekrar atıfta bulunuyoruz.

Saygılarımızla,

İhtar eden
Marubeni Europa Plc
adına vekaleten
Av. Günhan Yalçın



Ek 1-ve 2: HKS-1 Ekipmanı'nın hastaneniz otoparkında muhafaza edildiğini gösteren 2 adet fotoğraf.

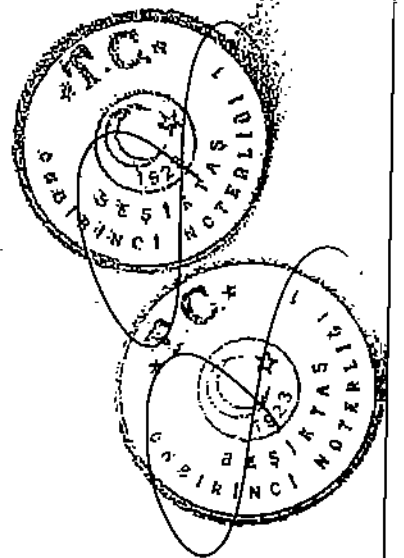

ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

14 Mart 2012

BİLİRKİŞİ TESPİT RAPORU

Adnan ALBAYRAK
Hakim 30702
14 MAYIS 2012

DOSYA NO : 2012/18 D. İş

TESPİT İSTEYEN VEKİLİ : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

KARŞI TARAF VEKİLİ : Av. Mehmet YALÇIN

TESPİTİN KONUSU : Marubeni Europe Plc.
: Av. Nihan KAYA, Av. Togay ÜLKÜ
: Mekanik tesisat inalatlarının tespiti talebine dayanmaktadır.

I-TESPİT İSTEYENİN TALEBİ:

Tespit isteyen vekili 30.03.2012 tarihinde kayda geçen dilekçesinde Özette; Üniversite Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında uluslararası ihale yoluyla tamamı dış kredili, anahtar teslimi olmak kaydıyla ihale yoluyla 171 kalem makina, ekipman ve malzemenin üniversiteye teminin sağlanması için 02.08.2001 tarihinde Marubeni Europe Plc. Düsseldorf şubesi ile Üniversite arasında yapılan sözleşme gereği temin edilecek cihazlardan biri olan Sıra No: 175, HKS-1 kodlu Hijyenik Klima Ekipmanı cihazının sözleşmedeki kabul ve taahhütlerine uygun koşullarda idarelerine çalışır durumda teslim edilmediğinden, geçici kabullerinin yapılamadığını, söz konusu cihazın içindeki ekipmanların üniversiteye nakledildiğini ve cihazların kullanılacağı mahale taşındığını, bu nakil işleminin sözleşmenin 3. maddesi gereği cihazın çalışır şekilde üniversiteye teslimi ve geçici kabulünün yapılması anlamında olmadığını, sadece cihaza ilişkin malzemenin fiilen üniversiteye naklinden ibaret olduğunu, firmanın sözleşmenin 7.1/c maddesine aykırı olarak 1 hafta önceden bildirim yapmadan malzemeyi üniversiteye naklettiğini, ayrıca malzemenin saklama koşulları konusunda da sözleşmeye uygun olarak bir yazılı bildirimde de bulunmadığını, cihazın kurulum işlemleri yapılmadığından henüz çalıştırılabilir durumda olmadığını, cihazın montaj mahallinin hazır olduğunu bildirmek, cihazın kurulumunun yapılması ve sözleşme gereği çalışır vaziyette üniversiteye teslimini sağlamak amacıyla firmaya inşaat işlemlerinin tamamlandığını bildiren ve montaj işlemlerinin yapılmasını talep eden 23.01.2012 tarihli yazının gönderildiğini, ancak firma tarafından Beşiktaş 11. Noterliğinin 01.03.2012 tarih ve 10328 yevmiye numaralı ihtarnameli ile cihazın 27.07.2007 tarihinde Üniversiteye teslim edildiği, Üniversitece yer gösterme işlemlerinde gecikildiğinden montajının yapılmadığı, bu nedenle ihracatçı garantisinin sona erdiği ve cihaza geçici kabul sonrası verilmesi gereken 2 yıllık garantinin verilmeyeceği, cihazın sözleşmeye aykırı olarak olumsuz şartlarda saklandığı ve zarar gördüğü, bu nedenle cihazın kurulum ve tesliminin tehlikelere yol açacağı bildirilerek taleplerinin reddedildiğini, yine üniversite tarafından firmaya gönderilen ve firmaya 23.02.2012 tarihinde tebliğ edilen Ankara 11. Noterliğinin 22.02.2012 tarih ve 002128 yevmiye numaralı ihtarnamenin 5.2 maddesinde, HKS-1 kodlu Hijyenik Klima Ekipmanı ile ilgili olarak sözleşme gereği teslim ve geçici kabullerin yapılması için firmanın yükümlülüklerini yerine getirmedikçe ihtar edilerek, sözleşme gereği yükümlülüklerin ifasının talep edildiğini, ancak firma tarafından Beşiktaş 11. Noterliğinin 02.03.2012 tarih ve 10513 yevmiye numaralı cevabi ihtarname ile 01.03.2012 tarihli cevabi ihtarnameye atıf yapılarak taleplerinin reddedildiğini, cihazın içinde bulunan ekipmanların üniversiteye belirlenen montaj mahallinde bulunmakta olduğunu, cihazın firma tarafından yapılması gerekli olan montaj işlemlerinin gerçekleştirilmediğini, cihazın çalışır şekilde üniversiteye teslim edilmediğini ileri sürerek cihazın mevcut durumunun tespiti ile sözleşme ve teknik şartname

TESPİT RAPORU

gereği cihazın çalışır vaziyette üniversiteye teslimi ve geçici kabulünün yapılmasında engel bir hasarının bulunup bulunmadığının, cihazın mevcut durumda kurulum ve geçici kabulünün yapılması ve kullanılmaya başlanması durumunda herhangi bir tehlikenin veya kaza ihtimalinin ortaya çıkması ihtimalinin bulunup bulunmadığının, cihazın kurulumu ve çalıştırılmasını engelleyecek nitelikte bir hasar bulunması durumunda bu hasarın niteliğinin ve boyutunun ne olduğu ve ayrıca hasara hangi sebeplerinin yol açtığı hususlarının, cihazda hasar bulunması halinde bu hasarın giderilmesinin ve cihazın kullanıma hazır bir hale getirilmesinin mümkün olup olmadığının, cihazda hasar bulunduğunun tespiti ve bu hasarların giderilmesinin mümkün olduğunun tespiti halinde, cihazın çalışır vaziyette getirilmesi için gerekli tamir masraflarının hesaplanmasını talep etmiştir.

II-CEVAPLAR:

Aleyhine tespit istenen vekili 11.04.2012 tarihinde kayda geçen cevap dilekçesinde özetle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan 171 parça tıbbi malzeme ve teçhizatın uluslararası dış kredili olarak satın alınmasına ilişkin ihalenin ardından satıcı müvekkili Marubeni Europe Plc. ile alıcı Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü arasında söz konusu satın almaya dair 2 Ağustos 2001 tarihli sözleşmenin imzalandığını, müvekkili şirketin Üniversiteye sözleşmenin 7.1/c maddesi uyarınca 14 Haziran 2007 tarihinde işbu delil tespiti talebinin konusu Sözleşme Sıra No: 175-HKS-1 kodlu ve sözleşme bedeli 1.266.496,00 EURO olan Hijyenik Klima Ekipmanı Cihazının sevkiyatına ilişkin detayları içeren bir bildirimde bulunduğunu, 27 Temmuz 2007 tarihinde Cihazın Üniversiteye teslim ettiğini ve bunu teyit eden tutanağın 8 Ağustos 2007 tarihinde Üniversite yetkilileri tarafından imzalandığını, dolayısıyla Üniversitenin iddiasının aksine müvekkili şirketin sözleşmenin 7.1/c maddesinde belirtilen fiziksel teslim tarihinden önce bildirim yükümlülüğünü 1 haftalık süreden çok daha önce yerine getirdiğini, bu aşamada Üniversitenin cihazın kurulacağı yer olarak düşündüğü Onkoloji Hastanesi Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinin inşaat işlerinin devam ettiğini belirttiğini ve fiziksel teslim tarihini takiben müvekkili şirkete cihazın montajının yapılması için bir mahal göstermediğini, üniversite tarafından iddia edildiğinin aksine sözleşmede saklama koşulları konusunda müvekkili şirketin yazılı bildirim yükümlülüğünün bulunmadığını, Üniversitenin cihazın tedarikçisi Wiess Klimantechink GmbH tedarikçi firmaya Temmuz 2008'de gönderdiği yazıda, cihazın "26 Haziran 2007'den bu yana sağlam ve kuru bir ortamda ve diğer saklama talimatlarına uygun şekilde saklandığını teyit ettiğini" yetkili ıslak imzası ile ifade ettiğini, ancak Üniversitenin yukarıdaki teyidine aykırı olarak müvekkili şirketin tedarikçiden 16 Aralık 2009 tarihinde, cihazın açık bir otoparkta ve kar, yağmur ve direkt güneş ışığı gibi sert hava koşulları altında bırakılmış olduğu bilgisini aldığını, cihazın ambalajlarının hasar gördüğünü ve cihazın kendisinin de sudan zarar gördüğünü tespit ettiğini, diğer bir deyişle fiziksel teslim tarihinden itibaren yaklaşık 3 yıl boyunca cihazların sözleşme ve sözleşme eki teknik şartname hükümlerine aykırı koşullardan bekletildiğini, Üniversitenin 23 Ocak 2012 tarihli tutanak ile yani fiziksel teslim tarihinden neredeyse 5 yıl sonra cihazın montajının yapılacağı binanın inşaatının tamamlandığını müvekkili şirkete bildirdiğini ve cihazın montajının yapılmasını istediğini, cihazın çalışır şekilde Üniversiteye teslim edilmemesi nedeniyle üniversite tarafından geçici kabulünün yapılmadığı ve üniversite Onkoloji Hastanesi Başhekimliğinin cihazı kullanmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, bu durumun hukuken tek sorumlusunun üniversite olduğunu, müvekkili sözleşme tahtındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ileri sürerek karşı taraf Üniversitenin delil tespitine dayanak gösterdiği tüm iddia ve beyanlarının kabul edilemez nitelikte olduğunu, müvekkili şirketin sözleşme uyarınca tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, iddia edilen gecikme ve zararlardan herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını savunmuştur.

III-BİLİRKİŞİDEN İSTENİLEN:

Taraflar ve konusu yazılı tespit davasında, Yüce Mahkemece resen bilirkişi görevlendirilmemiz üzerine, 06.04.2012 günlü keşif sonucu tespiti konu hususa ilişkin rapor istenilmektedir.

IV-DOSYADAKİ BELGELER, MAHALLİNDE YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

❖ **Sözleşme:** Taraflar arasında imzalanan 02.08.2001 günlü sözleşmenin 1. maddesinde; "bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan idari ve teknik şartnamelerde belirtilen şartlara uygun olarak

TESPİT RAPORU

satıcının; EK-1'de teknik spesifikasyonları belirtilen 171 kalem makina, malzeme ve gerekli ekipman, yedek parçalarını ve ek cihazlarını şartnamedeki ve EK-1'de gösterilen miktarlarda temin ederek idarenin cihaz mahalli olarak öngördüğü yere naklederek ve bu yerde montajı yapılmış halde hazır teslim edeceği", 2. maddesinde; "işin tutarının CİF 16.000.000,00 EURO olduğu", sözleşmenin Nakliyat ve Ambalajlama başlıklı 7.1/a maddesinde; "satıcının malzemeyi Kara, Deniz ve Hava yoluyla nakledeceği, malzemenin teslim yerinin Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, malzemenin üretildiği fabrikadan başlamak üzere nakledilip kara, deniz ve hava limanı ve yollarında taşınarak teslim yerine ulaştırılmasında ve bu güzergahtaki her türlü harcamalardan satıcının sorumlu olacağı", 7.1/c maddesinde; "satıcının malzemenin muhtemel nakledilme tarihini en az 1 (bir) hafta önce idareye bildireceği", 7.1/d maddesinde; "nakliyat ve ambalajlama hatasından meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanın satıcıya ait olacağı" hüküm altına alınmıştır.

❖ **İdari Şartname:** Ocak 2001 tarihli idari şartnamenin Teslimat ve Montaj başlıklı 19. maddesinde; "cihazların kurulacağı veya monte edileceği yer ve odaların belirlenmesi, su, elektrik, gaz bağlantılarının sağlanmasının hastane idaresince yapılacağı, şartnamelerde belirtilmesi halinde montaj yerinin firma tarafından hazırlanacağı, gerek montaj sırasında ve gerekse garanti süresi içinde noksan, yanlış, fabrikasyon hatalı veya Teknik ve İdari Şartnamedeki hususlara uymadığı tespit edilen malzemenin firmaya iade edileceği, eksik ve kusurlu bulunan özelliklerin tutanak ile tespit edilerek verilen süre içerisinde tamamlanmasının yazılı olarak firmaya bildirileceği, muayene komisyonunca cihazın ret edilmesi halinde durumun ilgili firmaya yazılı olarak bildirileceği, muayene sırasında kurulum ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek zarar ve hasarlar sorumlu hasara uğrayan cihazın teslim ve tesliminden satıcı firmanın sorumlu olacağı, kesin teslimat işleminin muayene komisyonunca tamamlanan cihazların geçici kabul tutanaklarının hasata yetkileri tarafından imzalanacağı ve firmaya teslim edileceği", Garanti Süresi, Bakım, Onarım, Belim başlıklı 20. maddesinde; "teknik şartnamede belirtilen veya belirtilmesin cihaz, bütün ve her bir parçasının (tüp ve helyum dahil) üretici firma tarafından madde 19'a göre işletmeye alınduktan itibaren 2 (iki) yıl süre ile bakım ve onarımının ücretsiz olarak yapılması kabul ve garanti edileceği" belirtilmiştir.

❖ **Teknik Şartname:** Genel Hükümler başlıklı bölümün 4. maddesinde; "satın alınmasına karar verilen makina ve cihaz üreticilerinin siparişi müteakip en geç 2 (iki) hafta içerisinde çalışma programlarını idareye verecekleri, makinelerin montajının idarenin belirlediği zaman ve koşullarda yapılacağı", 5. maddesinde; "yüklenici firmanın sistemlerin kurulacağı hacimlerde yapılması gerekli her türlü düzenleme (inşaat, tesisat ve elektrik) ile ilgili planları hazırlayarak Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına teslim edeceği, sistemlerin kurulacağı mahallere elektrik, su, buhar vs. altyapı hizmetlerinin getirilmesinin Üniversite teknik birimlerince deruhte edileceği, makina ve cihazların monte edileceği hacimlerin mimari plana göre tadil edilerek düzenlenmesi ve bu mahalde montajı için gerekli her türlü elektrik ve mekanik sistemlerin teminin yüklenici firma tarafından yapılacağı", Makina ve Cihazların Temin, Montaj ve Kabul İşlemleri başlıklı bölümün 3. maddesinde; "makinaları oluşturan ünitelerin monte edileceği mahallerin montaja hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü plan ve proje çalışması, ünitelerin yerlerine montajı, sistem içinde diğer üniteler ile olan her türlü bağlantılarının yapılarak çalışır hale getirilmesi, yüklenici firma tarafından gerçekleştirileceği", Garanti Süresi başlıklı bölümün 1. maddesinde; "makina ve cihazlarla, bu makinelerin alt üniteleri, fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiş olacağı" belirtilmiştir.

❖ **Teknik Özellikler Formu:** Tespit konu HKS 1 Hijyenik Klima Sistemine ilişkin teknik özellikler formu dosyaya ibraz edilmiştir. Formda sistemin içeriğinin; Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ameliyathaneleri ve yan odaları, yoğun bakım bölümü ve hasta odaları için DIN 1946/4 şartlarına uygun bir hijyenik iklimlendirme sisteminin kurulacağı belirtilmiştir. Sistemin teknik özellikleri teknik şartnamenin diğer maddelerinde sıralanmıştır. Teknik şartnamenin 3. Maddesinde; bütün klima cihazlarının laminar akımlı tavan üniteleri, lif tutucular vb. yüklenici firma tarafından üretilebilir olacağı, böylece tesisin projelendirilmesi ile yapım işlerinin uyum içinde yürütülmesi sayesinde tesis yapımıcısı ile parça üreticileri arasındaki bilgi alışverişindeki kopukluktan doğabilecek gecikmelerin önlenilebilir olacağı, yüklenici firmanın bütün steril bölge havalandırma tesisinin kuruluşunda müşteriye karşı tek sorumlu olacağı, yüklenici firmanın işin başından itibaren tüm projenin sorumluluğunu ve anahtar teslimi genel yüklenicilik görevini üstleneceği belirtilmiştir.

❖ Taraflar arasında çekilen ihtarname ve cevapları dosyada mevcuttur.

❖ Mahallinde yapılan inceleme sırasında; aleyhine tespit istenen tarafın yükümlendiği HKS-1 Hijyenik Klima Sistemi kapsamında; Kemik iliği ünitesini besleyen 1 ve 2 numaralı cihazların hastanenin 6. katına, Yoğun bakım ünitesini besleyen 3 numaralı cihazın hastanenin 4. katına, 92/B Palyatif servisini (ameliyathane) besleyen 4 numaralı cihazın hastanenin 3. katına taşınarak montajının yapıldığı, egzoz montajlarının yapılmadığı görülmüştür. 1 ve 2 numaralı klima cihazlarında yapılan incelemede; cihazların işlemcilerinin yerinde olmadığı, cihazların iç kısımlarına suyun sırayet etmesi nedeniyle iç kısımlarda oksitlenme olduğu, 3 numaralı klima cihazında yapılan incelemede; işlemci ve ekranın yerinde olmadığı, cihazların iç kısımlarına suyun sırayet etmesi nedeniyle iç kısımlarda oksitlenme olduğu, 4 numaralı klima cihazında yapılan incelemede; cihazın işlemcisinin yerinde olmadığı, cihazların iç kısımlarına suyun sırayet etmesi nedeniyle iç kısımlarda oksitlenme olduğu tespit edilmiştir.

❖ Aleyhine tespit istenen tarafından sunulan 08.08.2007 tarihli tutanağa göre, tespiti konu Hijyenik Klima sistemine ilişkin ekipman ve cihazlar 4 adet koli içerisinde hastaneye getirilmiş ve 3 yıl süre dışarıda kaldıktan sonra 24 Mart 2010 tarihinden sonra yerine montajlarının yapıldığı anlaşılmıştır. Aleyhine tespit istenen tarafından sunulan CD'deki resimler incelendiğinde; tespiti konu cihazların montajdan önce 3 yıl süreyle dışarıda bulunmaları nedeniyle elektronik ve mekanik aksamalarının su aldıkları resimlerde de açık bir şekilde görülmektedir. Yaklaşık olarak 3 yıl süreyle dışarıda kar, yağmur ve güneş altında bekletilen ve ambalajları deforme olmuş cihazların gerekli olan elektronik ve mekanik aksamalarının bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra montajının yapılması gerekmektedir. Cihazların kurulu oldukları yerde yapılan incelemede yukarıdan da arz edildiği üzere cihazların iç kısımlarına suyun sırayet etmesi nedeniyle iç kısımlarında oksitlenme olduğu tespit edilmiştir.

❖ Tespiti konu klima cihazları aleyhine tespit istenen tarafından yapıldıktan sonra cihazların testi ve kabul komisyon tarafından kabulleri yapılmamıştır. Taraflar arasında tanzim edilen sözleşme ve eki idari ve teknik şartnamelerde; cihazların garantisinin montajının yapılması ve çalıştırılmasından itibaren iki yıl olacağı belirtilmiştir. Yaklaşık 3 yıl dışarıda montajı yapılmadan kar, yağmur ve güneş altında bekletilen cihazların elektronik aksamalarının su alması nedeniyle çalıştırılması mümkün olmadığından ve eksik montajdan dolayı garanti süresinin işlemeye başlaması mümkün görülmektedir. Garanti süresinin işlemeye başlaması için klima cihazlarının eksiksiz olarak ve çalışır biçimde işverene teslim edilmesi gerekmektedir. Taraflar arasındaki sorumluluk ve hasara neden olma halindeki sorumluluk yargılamayı gerektirdiğinden dolayı bu hususlarda değerlendirme yapılması olanağı görülmemiştir.

❖ Tespiti isteyen taraf cihazın mevcut durumunun tespiti ile sözleşme ve teknik şartname gereği cihazın çalışır vaziyette üniversiteye teslimi ve geçici kabulünün yapılmasında engel bir hasarının bulunup bulunmadığının, cihazın mevcut durumda kurulum ve geçici kabulünün yapılması ve kullanılmaya başlanması durumunda herhangi bir tehlikenin veya kaza ihtimalinin ortaya çıkması ihtimalinin bulunup bulunmadığının, cihazın kurulumu ve çalıştırılmasını engelleyecek nitelikte bir hasar bulunması durumunda bu hasarın niteliğinin ve boyutunun ne olduğu ve ayrıca hasara hangi sebeplerinin yol açtığı hususlarının, cihazda hasar bulunması halinde bu hasarın giderilmesinin ve cihazın kullanıma hazır bir hale getirilmesinin mümkün olup olmadığının, cihazda hasar bulunduğunun tespiti ve bu hasarların giderilmesinin mümkün olduğunun tespiti halinde, cihazın çalışır vaziyette getirilmesi için gerekli tamir masraflarının hesaplanmasını talep etmiştir.

A-Cihazın mevcut durumunun tespiti ile sözleşme ve teknik şartname gereği cihazın çalışır vaziyette üniversiteye teslimi ve geçici kabulünün yapılmasında engel bir hasarının bulunup bulunmadığı hususu: Tespiti konu klima cihazlarının ana kartları ve işletim kartları montajdan sonra test edilmesi amacıyla Beyaz Teknik firması tarafından sökülüştür. Ana kartlar ve mikroişlemciler eksik olduğundan ve mekanik aksamalarda korozyon bulunduğundan dolayı bu aşamada geçici kabulünün yapılması mümkün görülmektedir. Cihazların ana kartları ve işletim kartları montajdan sonra kontrol amacıyla sökülmemiş olsa dahi cihazlar uzun süre dış ortamda yağmur, kar ve güneş altında kaldığından dolayı da kontrol ve teste tabi tutulmadığından montajının yapılmasıyla çalışır vaziyette tespit isteyen tarafa teslim edilmediği anlaşılmaktadır. Cihazlar test edilmeden montajı yapıldığından dolayı geçici

TESPİT RAPORU

kabulünün yapılmasına engel teşkil edebilecek nitelikteki hasarlardır. Tespite konu cihazların elektronik ve mekanik aksamlarındaki hasarlar kullanıcı ve imalat hatasından kaynaklanan hasarlar olmayıp cihazların dış ortamda uzun süre yağmur, kar ve güneş altında bekletilmesinden kaynaklanmaktadır.

B-Cihazın mevcut durumda kurulum ve geçici kabulünün yapılması ve kullanılmaya başlanması durumunda herhangi bir tehlikenin veya kaza ihtimalinin ortaya çıkması ihtimalinin bulunup bulunmadığı hususu: Cihazların ana kart ve işlemciler eksik olduğundan dolayı cihazların tamir edilmeden kullanılması mümkün görülmemektedir. Cihazlar teknik şartnameye uygun olduğundan dolayı ancak tamir edilerek kabulü yapıldıktan sonra herhangi bir tehlike ve kaza ihtimali olmayacaktır.

C-Cihazın kurulumu ve çalıştırılmasını engelleyecek nitelikte bir hasar bulunması durumunda bu hasarın niteliğinin ve boyutunun ne olduğu ve ayrıca hasara hangi sebeplerinin yol açtığı hususu: Tespite konu cihazlarda cihazların kurulumunu ve çalıştırılmasını engelleyen hasarlar olarak ana kartlar ve işlemciler ile mekanik aksamların belirtildiği gibi uzun süre yağmur, kar ve güneş altında kalmasından dolayı meydana gelen elektronik ve mekanik korozyon hasarları bulunmaktadır.

D-Cihazda hasar bulunması halinde bu hasarın giderilmesinin ve cihazın kullanıma hazır bir hale getirilmesinin mümkün olup olmadığı hususu: Tespite konu cihazlarda mevcut olan hasarlar ana kartların ve işlemcilerin değiştirilmesi ile cihazların hazır hale getirilmesi mümkündür.

E-Cihazda hasar bulunduğunun tespiti ve bu hasarların giderilmesinin mümkün olduğunun tespiti halinde, cihazın çalışır vaziyette getirilmesi için gerekli tamir masraflarının hesaplanması hususu: Tespite konu 3 ana ünitenin çalışır hale getirilebilmesi için gerekli ekran, kart, program yükleme, invertör, şalt ekipmanı, soket konektör, disp-board, ünitelerin devreye alma ve testlerin yapılmasının bedelli tespit tarihi itibarıyla piyasa rayıçlarına göre aşağıda arz edilen biçimde hesaplanmıştır:

6780012 kod numaralı MST-BSK Board değişimi; 3 adet x 24.700,00 TL	= 74.100,00 TL
6780016 kod numaralı BSK kart; 32 adet x 3.100,00 TL/adet	= 99.200,00 TL
6780015 kod numaralı BSK OT elektronik kartı; 23 adet x 2.330,00 TL/adet	= 53.590,00 TL
877797 kod numaralı program yükleme; 3 adet x 8.600,00 TL/adet	= 25.800,00 TL
DRV kod numaralı invertör; 6 adet x 2.644,00 TL/adet	= 15.864,00 TL
SLT kod numaralı şalt ekipman; 3 set x 3.400,00 TL/set	= 10.200,00 TL
KN kod numaralı soket konektör değişimi; 3 set x 1.100,00 TL/set	= 3.300,00 TL
844321 kod numaralı Disp-board; 3 adet x 23.000,00 TL/adet	= 69.000,00 TL
Devreye alma ve testlerin yapılması; 3 adet x 24.300,00 TL/adet	= 72.900,00 TL
Toplam	423.954,00 TL
KDV (% 18)	+ 76.311,72 TL
Genel Toplam	500.265,72 TL

V-SONUÇ VE KANAAT: Tespite konu olayda;

1-Tespite konu klima cihazlarının ana kartları ve işletim kartları montajdan sonra test edilmesi amacıyla Beyaz Teknik firması tarafından sökülüldüğü, ana kartlar ve mikroişlemciler eksik olduğundan ve mekanik aksamalarda korozyon bulunduğundan dolayı bu aşamada geçici kabulünün yapılmasının mümkün olmadığı, cihazların ana kartları ve işletim kartları montajdan sonra kontrol amacıyla sökülmemiş olsa dahi cihazlar uzun süre dış ortamda yağmur, kar ve güneş altında kaldığından dolayı da kontrol ve teste tabi tutulmadığından montajının yapılmasıyla çalışır vaziyette tespit isteyen tarafa teslim edilmediği, cihazlar test edilmeden montajı yapıldığından dolayı bu hasarların geçici kabulünün yapılmasına engel teşkil edebilecek nitelikteki hasarlar olduğu, tespite konu cihazların elektronik ve mekanik aksamlarındaki hasarların kullanıcı ve imalat hatasından kaynaklanan hasarlar olmayıp cihazların dış ortamda uzun süre yağmur, kar ve güneş altında bekletilmesinden kaynaklandığı,

2-Tespite konu cihazların ana kart ve işlemciler eksik olduğundan dolayı cihazların tamir edilmeden kullanılmasının mümkün olmadığı, cihazlar teknik şartnameye uygun olduğundan dolayı ancak tamir edilerek kabulü yapıldıktan sonra herhangi bir tehlike ve kaza ihtimalinin olmayacağı,

TESPİT RAPORU


3-Tespit konu cihazlarda, cihazların kurulumunu ve çalıştırılmasını engelleyen hasarlar olarak ana kartlar ve işlemciler ile mekanik aksamaların belirtildiği gibi uzun süre yağmur, kar ve güneş altında kalmasından dolayı meydana gelen elektronik ve mekanik korozyon hasarlarının bulunduğu, ↗


4-Tespit konu cihazlarda mevcut olan hasarların ana kartların ve işlemcilerin değiştirilmesi ile cihazların hazır hale getirilmesinin mümkün olduğu,

5-Tespit konu 3 ana ünitenin çalışır hale getirilebilmesi için gerekli olan ana ekran, kart, program yükleme, invertör, şalt ekipmanı, soket konnektör, disp board, tüm ünitelerin devreye alma ve testlerin yapılmasının bedelinin tespit tarihi itibarıyla piyasa rayıçlarına göre 500.265,72 TL olduğu, ↗

Sonuç ve kanaatiyle tanzim edilen raporu Yüce Mahkemenin takdirlerine saygıyla arz ederiz.

BİLİRKİŞİ KURULU


Bülent ARAS
Makina Mühendisi
İTÜ-1991/36391





Muhittin MURAT
Elektrik Mühendisi
Endüstri Yüksek Mühendisi

EKİ: Tespit konu cihazlara ilişkin 24 adet resim (Dosya).






MONTAJ ÖNCESİ RESİMLER-CİHAZLARIN BULUNDUĞU DIŞ ORTAM







16.01.10 09:41

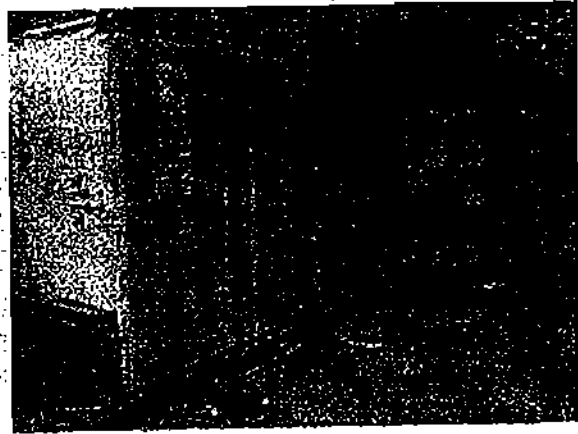
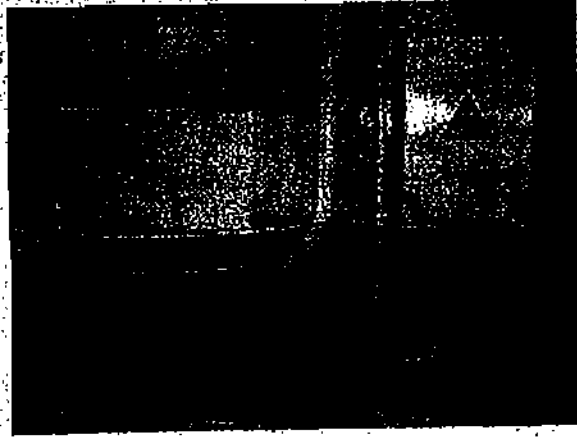
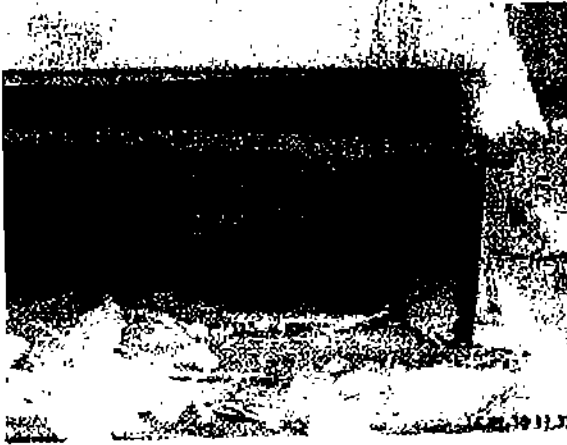


[Handwritten signature]

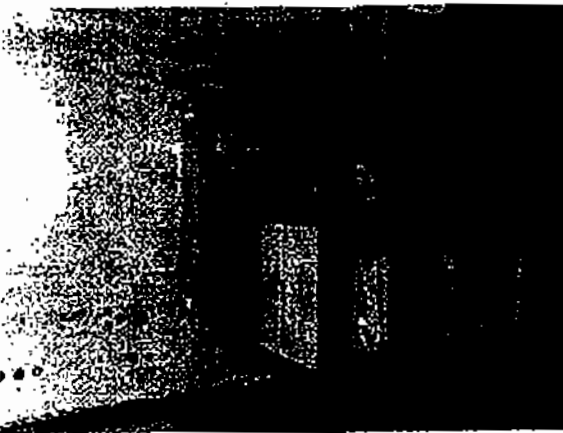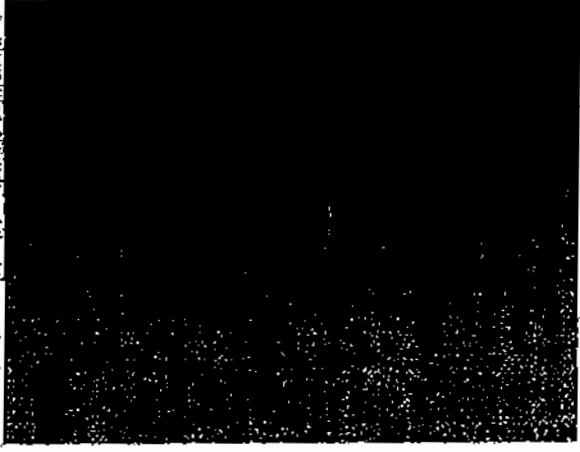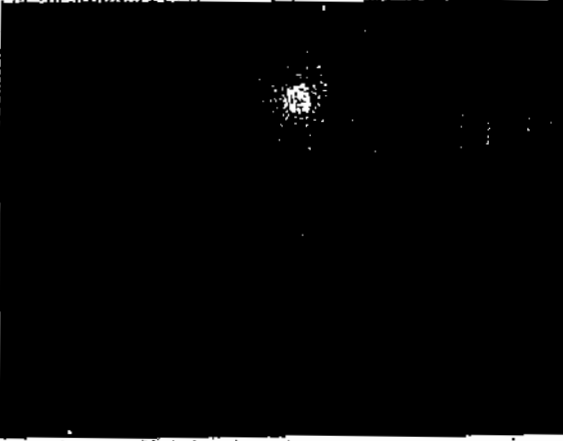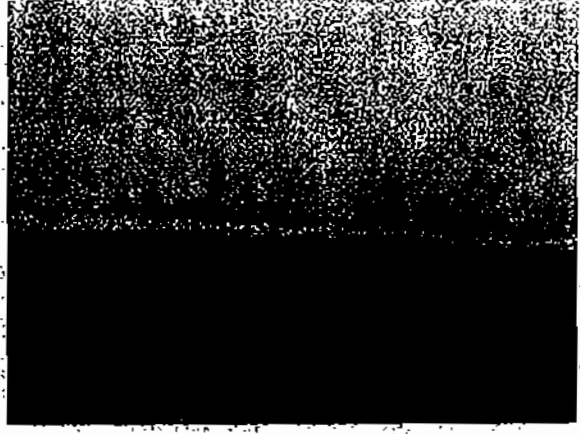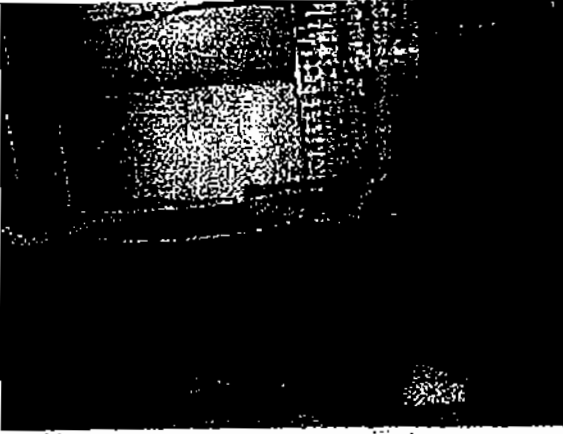

MONTAJ SONRASI RESİMLER-CİHAZLARIN MEVCUT DURUMU

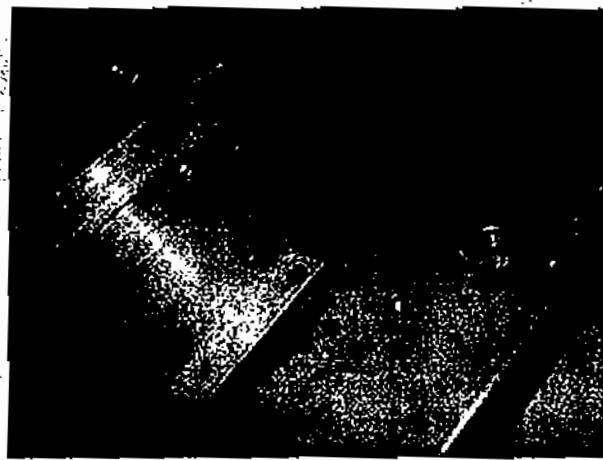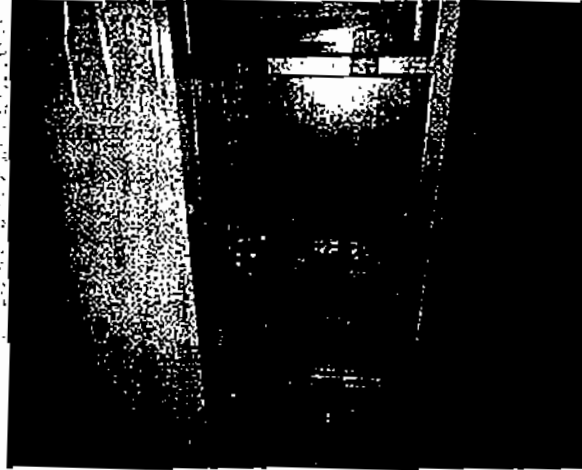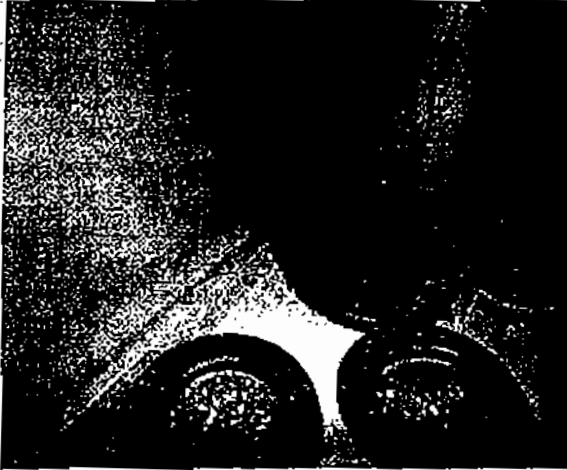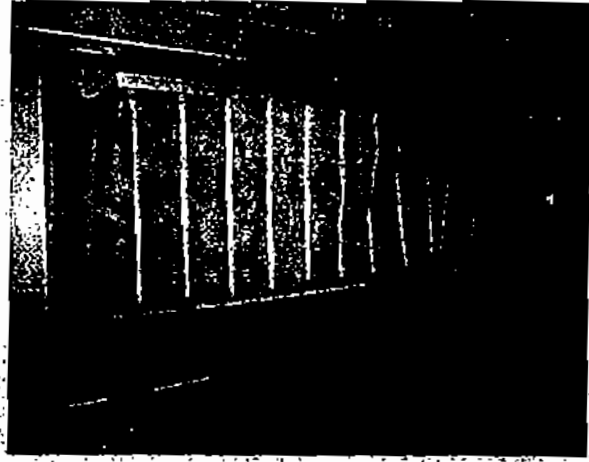

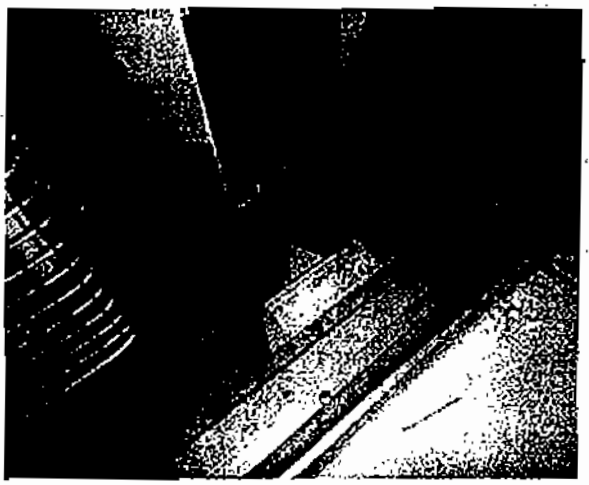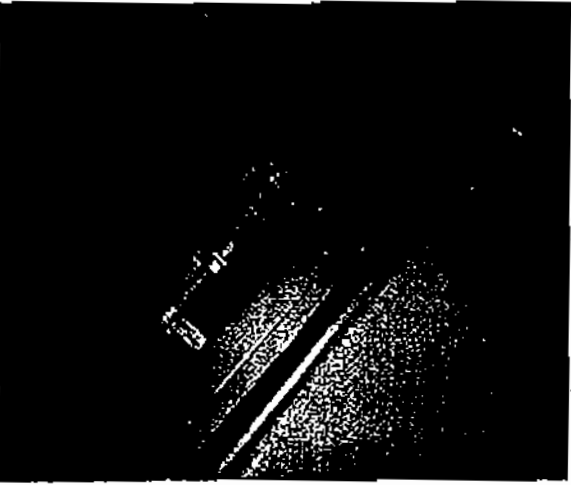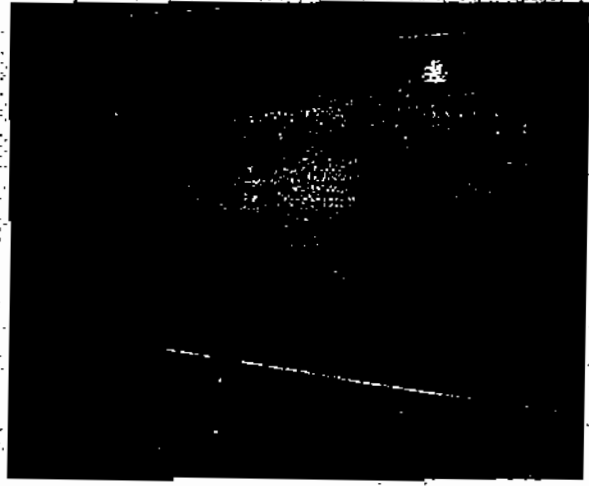


SOĞUTMA MUTFAK TURİZM
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Büklüm Sokak 47/2 06660 Kavaklıdere / ANKARA
 Tel : 90.312 467 07 26 - 27 • Fax : 90.312 426 91 51
 Kavaklıdere V.D. 7740003310

İNCEKARA TEKNİK CİHAZLAR ENDÜSTRİ
VE TİC. A. Ş.

Adres :25. Sokak No : 16 N.Akar Mahallesi
Balgat / ANKARA

FATURA

SERİ : A

SIRA 080380

Müşteri V.D. ve No. **BAŞKENT V.D. 477 001 29 37**

Tarih : 09/...09/ 2009

AÇIKLAMA	ADET	BİRİM FİYATI	TUTARI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ MRI ODA TEFRİŞAT VE YER HAZIRLIĞINA MAHSUBEN		84.745,76 TL	84.745,76 TL
		TUTAR	84.745,76 TL
		KDV % 18	15.254,24 TL
		TOPLAM	100.000,00 TL
Banka Hesap Numaraları : İşbankası Başkent Şubesi: 4299 503721			
YALNIZ Yüzbin Lira	DIR		

Özgen Çiğir

SURET 1

10



SOĞUTMA MUTFAK TURİZM
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Büklüm Sokak 47/2 05660 Kavaklıdere / ANKARA
Tel : 90.312 467 07 26 - 27 - Fax : 90.312 426 91 51
Kavaklıdere V.D. 7740003310

İNCEKARA TEKNİK CİHAZLAR ENDÜSTRİ
VE TİC. A. Ş.

Adres :25. Sokak No : 16 N.Akar Mahallesi
Bağat / ANKARA

FATURA

SERİ : A

SIRA 080387

Müşteri V.D. ve No. BAŞKENT V.D. 477 001 29 37

Tarih : 11/.....11./ 2002009

AÇIKLAMA	ADET	BİRİM FİYATI	TUTARI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ CİHAZLARI ODA TEFRİŞAT VE YER HAZIRLIĞINA MAHSUBEN		84.745,76 TL	84.745,76 TL
		TUTAR	84.745,76 TL
		KDV % 18	15.254,24 TL
		TOPLAM	100.000,00 TL
Banka Hesap Numaraları : İşbankası Başkent Şubesi: 4299 503721			
YALNIZ	Yüzbin Lira	-'DIR	
0293- 4771 41			

SURET 1



Hastaneler Genel Direktörlüğü'ne,

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi'ne Dış Proje kredisinden karşılanarak satın alınan 171 kalem Makine ve Teçhizatın 02.01.2011 tarihi itibariyle kurulumları yapılarak geçici kabulleri yapılmış olan ekli listede belirtilen cihazlara ait kesin teminatların ihale sözleşmesi eki idari şartnamenin kesin teminata ilişkin hükümler başlıklı bölümünün 18. maddesi hükmü uyarınca %50'sinin serbest bırakılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim.

Prof. Dr. Şuayib YALÇIN

Onkoloji Hastanesi Başhekimi

Ek :1

MK/mb



Sayı: B.30.2.HAC.0.73.03.00/ 01

09.02.2011


STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

Üniversitemiz 2001 mali yılı yatırım programına dahil Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat alımı projesi (Dış proje) kapsamında Marubeni Europe Plc. Firmasından satın alınan 171 kalem Makine, malzeme ve ekipman tanımlı piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemelerin gümrük işlemleri ile malzemelerin teslim alınmasına 2007 yılında başlanılarak 2009 yılında 2 kalem malzemenin alımından üniversite olarak vazgeçilerek 169 kalem malzemenin tamamı üniversitemiz tarafından teslim alınmıştır.

Söz konusu teslim alınan cihazlardan 171 kaleminin 2007 yılından 2009 yılı sonuna kadar kurulumları yapılarak geçici muayene kabulleri yapılmıştır.

Marubeni Europe Plc. Firmasının Akbank T.A.Ş. Kızılay şubesinden almış olduğu 09.08.2001 tarih ve DMM- 356/ 6961 sayılı EUR 960.000.- lık ve yine Akbank T.A.Ş. Kızılay şubesinden almış olduğu 09.08.2001 tarih ve DMM- 356/ 6962 sayılı USD 739.008.- lık kesin teminat mektupları 09.08.2001 tarih ve 428899 sayılı Ayniyat ve Esham Alındısı ile veznenize yatırılmıştır.

02.01.2011 tarihi itibarıyla kurulumları yapılarak işletmeye alınan ve geçici muayene kabulleri yapılan ilişik listede yazılı (Toplam 141 kalem) 70 kalem cihazın (EUR.6.251.262,00 X%6 = EUR.375.075,72 %50 = 187.537,86'EUR) ile 71 kalem cihazın (USD.9.527.699,00 X%6 = USD.571.661,94 %50 = 285.830,97'USD) cihazlara ait kesin teminatların İhale Sözleşmesi eki İdari şartnamenin Kesin teminata ilişkin hükümler başlıklı bölümünün 18. maddesi hükmü uyarınca geçici kabulleri yapılan cihazların %50' sinin serbest bırakılması gerektiğinden, EUR.960.000,00.- 'lık kesin teminatın EUR.187.537,86.- 'lık kısmı ile USD 739.008,00.- 'lık kesin teminatın USD 285.830,97'lık kısmının serbest bırakılmasını ve bakiye kalan kesin teminat makbuzunun Başkanlığımız Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesini arz ederim.


Ecz.M. Nejat ERTÜRK
İdari ve Mali İşl. Dai. Bşk.

Ekler

- Ek 1 2 Adet Malzeme Listesi
- Ek 2 66 Adet Geçici muayene kabul raporu
- Ek 3 1 Adet Ayniyat, Esham ve Tahvilat Alındısı Aslı


Ek-64

12/01/2012

Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı'na,

Anabilim Dalımızda yeni kurulan Varian marka GammaMedplusiX model brakiterapi cihazı montajı tamamlanmış olup cihazın tedavide kullanılabilmesi için İridyum-192 radyoaktif kaynağının cihaza yüklenip aktivite kontrol ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Her kaynak değişiminde yapılması gerekli aktive ölçümü için brakiterapi cihazı satın alındığında firma standart olarak cihaz ekipmanı ile birlikte kuyu tipi (well-type) iyon odasını da göndermektedir. Ancak cihazın Anabilim Dalımıza kuruluş sürecinde kuyu tipi iyon odasının eksik olduğu anlaşılmış olup temin edilerek tarafımıza teslimi halen yapılmamıştır.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.


Demet YILDIZ

Medikal Fizik Uzmanı



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Ek-65

11.01.08

Sayı : B.30.2.HAC.0.00.00.01
Konu :

.../.../.....

Steve Newton
General Manager
Marubeni Europe Plc
London

İlgi: 17 Mart 2008 tarihli mektubunuz.


Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Projesi'nin kısa bir süre içinde tamamlanmasını beklemekteyiz. İnşaatla ilgili yürütülen çalışmalar yakın zaman içinde tekrar hız kazanacaktır.

2008 yılı cihaz listesinin siparişi 1 Nisan 2008 tarihinde Marubeni Ankara Şubesi ofisine faks ile gönderilmiştir.

İlgi yazınız ekinde listede "eğitim ve montajı tamamlanmış fakat kabul protokolünün Hacettepe Üniversitesi'nin imzasını bekliyor" olarak belirtilen kalemlerin kabulleri yapıp temsilciniz Incekara firmasına verilmiştir.

Göstermiş olduğunuz işbirliği ve projenin tamamlanması için çabalarınız nedeniyle tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla,



Prof.Dr. Uğur ERDENER
(Rektör)



Ek-66

Sayı: B.30.2.HAC.0.73.00.00/919
Konu : Marubeni Europe Plc.

04/07/2012

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında, uluslar arası ihale ile tamamı dış kredili, anahtar teslimi olmak kaydıyla, 171 kalem makine, ekipman ve malzemenin temininin sağlanması için 02/08/2001 tarihinde Marubeni Europe plc. Düsseldorf Şubesi ile yapılan sözleşme gereği temin edilecek cihazlarla ilgili olarak firma tarafından edimlerin yerine getirilmediği ve sözleşmeye aykırı davranıldığı gerekçesi ile Ankara 11. Noterliği'nin 22/02/2012 tarih ve 002128 yevmiye no.lu ihtarnamesi gönderilmiş, firma tarafından Beşiktaş 11. Noterliği'nin 02/03/2012 tarih ve 10513 yevmiye no.lu cevabi ihtarnamesi ile taleplerimizin bir kısmının yerine getirilmesi reddedilmiş, bir kısmının ise yerine getirileceği bildirilmesine rağmen bu güne kadar firma tarafından yerine getirilmemiştir. Sözleşmeye konu bir kısım malzeme, sözleşme ve eklerine uygun nakledilerek, montajı yapıp, çalıştırılarak, teslim edilmediğinden geçici kabulleri yapılamamıştır. Firma tarafından diğer bir kısım malzemelerin kurulumunun yapılması çeşitli nedenlerle reddedilmiş, kurulumu ve geçici kabulü yapılan ve garanti süresi devam eden bazı kalemlerde ise garanti kapsamında bakım onarım yükümlülüğünün yerine getirilmesi firma tarafından reddedilmiştir.

Firmanın tüm bu sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle Ankara 11 Noterliği'nin 07/06/2012 tarih ve 005738 yevmiye no.lu ihtarnamesi ile ihtarnamenin tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşmeye konu cihazlardan teslim edilmeyen geçici kabulleri de yapılmayan cihazların teslim ve geçici kabullerini sağlanması, geçici kabulü yapıp, garanti ve bakım hizmeti verilmeyen cihazlar için, bu sürelerin sözleşme gereği garanti-bakım sürelerine ilavesinin sağlanması, bundan sonraki garanti-bakım yükümlülüğünün eksiksiz ve süresinde yerine getirilmesi, diğer sözleşmeye aykırılıkların, eksik ve ayıplı ifaların derhal giderilmesi talep edilmiş, aksi halde sözleşmenin feshi yoluna gidileceği ihtaren bildirilmiştir.

Söz konusu ihtarname 11/06/2012 tarihinde firmaya tebliğ edilmiş olup, sözleşme hükümleri gereği verilen 10 süre 21/06/2012 tarihi itibarı ile sona erdiği halde firma yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.


Hastaneler Genel Direktörlüğünün Hukuk Müşavirliğine 25/06/2012 tarih ve D-2001 sayılı yazıları ve yukarıdaki açıklamalara istinaden, firmanın sözleşmedeki edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Üniversitemiz ile firma Marubeni Europe plc. Düsseldorf Şubesi arasında imzalanan 02/08/2001 tarihli sözleşmenin feshi, kesin teminatın irat kaydedilmesi ve yasaklılık ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunu Olurlarınıza saygılarımla arz ederim.


Hülya KOSE
İdari ve Mali İş. Dai. Bşk.

Uygun görüş arz ederim.

04/07/2012


Prof. Dr. Mehmet TATAR
Genel Sekreter V.


Prof. Dr. A. Murat TUNCER
Rektör


ASLI GİBİDİR
Atanur AYDEMİR
Satınalma Müdürü



23 Temmuz 2012

Sayı: B.30.2.HAC.0.65.00.00/ 3776


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 11.07.2012 tarih ve B.30.2.HAC.0.73.04.00/953 sayılı yazınız.

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında Uluslararası ihale yolu ile tamamı dış kredili, anahtar teslimi olmak kaydıyla, 171 kalem makine, ekipman ve malzemenin temininin sağlanması için 02.08.2001 tarihinde Üniversitemiz ile Marubeni Europe Plc. Dusseldorf Şubesi arasında yapılan sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle 04.07.2012 tarih B.30.2.HAC.0.73.00.00/919 sayılı Rektörlük oluru ile sözleşme feshedilmiş olup kesin teminatın irat kaydedileceği belirtilmiştir.

Bahse konu firmaya ait kesin teminat mektuplarının nakde çevrilerek irat kaydedilebilmesi için Akbank T.A.Ş. Kızılay Şubesine ekli yazı ile talimat verilmiştir.

Bilgilerinizi arz ederim.


Nurgül AYHAN

Strateji Geliştirme Daire Başkan V.

EKLER _____ :

Ek-1 Yazı (1 Adet)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: 0 (312) 305 1059-2360 • Faks: 0 (312) 311 4390
E-posta: imidb@hacettepe.edu.tr
www.imidbhacettepe.edu.tr

Sayı: 8.30.2.HAC.0.73.04.00/


Konu : Sözleşmenin feshi

Bu mektup 2/07/2012 tarihinde iadeli taahhütlü olarak
Posta yoluyla gönderilmiştir.

Marubeni Europe Plc.
Reşit Galip Caddesi No:130/3.
G.O.P-06700 ANKARA

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslararası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere 02/08/2001 yılında yapılan sözleşmeyle firmanızdan USD.12.316.800. ve EUR.16.000.000. bedelle satın almasına karar verilen "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman" tanımlı malzemeler için alınan 04/07/2012 tarihli Rektörlük Makamı onayı gereğince sözleşme feshedilerek onay belgesinin bir sureti ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.


Prof. Dr. Mehtap TATAR
Rektör a.
Genel Sekreter V.

EK:

1 Adet Rektörlük Makam Onayı.

07 2012
07 2012
07 2012
07 2012

Y. Anıl
A. A. A. A.
A. A. A. A.
A. A. A. A.



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: 0 (312) 305 1059-2360 - Faks: 0 (312) 311 4390
E-posta: imidb@hacettepe.edu.tr
www.imidbhacettepe.edu.tr





Sayı: B.30.2.HAC.0.73.04.00/ ⁹⁵³
Konu : Marubeni Europe Plc.

11/07/2012

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslararası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere 02/08/2001 yılında USD.12.316.800. ve EUR.16.000.000. bedelle Marubeni Europe Plc. Düsseldorf firmasından satın almasına karar verilen "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman" tanımlı malzemelerle ilgili olarak Hukuk Müşavirliğinin 04/07/2012 tarih ve 2916 sayılı yazıları ve yazımız ekindeki Rektörlük Makamının 04/07/2012 tarihli onayına istinaden Akbank T.A.Ş. Kızılay Şubesindeki Marubeni Europa Plc firmasına ait EUR.717.255,63 ve USD.384.618,03 tutarlık kesin teminatların irat kaydedilerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na bilgi verilmesini rica ederim.


Prof. Dr. Mehtap TATAR
Genel Sekreter V.

10.7.2012 Memur 
10.7.2012 Şef 
10.7.2012 Şb.Md. 
10.7.2012 Bşk.Yrd. 
10.7.2012 Başkan 

EK:

- 1 Adet Rektörlük Makam Onay fotokopisi.
- 1 Adet Hukuk Müşavirliği yazı fotokopisi.
- 1 Adet Ayniyat Esham ve Tahvilat alındısı aslı.



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: 0 (312) 305 1009-1057 • Faks: 0 (312) 311 7906
E-posta: sgdb@hacettepe.edu.tr
www.sgdb.hacettepe.edu.tr

Sayı: B.30.2.HAC.0.65.00.00/ 3848


25 Temmuz 2012

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında Uluslararası ihale yolu ile tamamı dış kredili, anahtar teslimi olmak kaydıyla, 171 kalem makine, ekipman ve malzemenin temininin sağlanması için 02.08.2001 tarihinde Üniversitemiz ile Marubeni Europe Plc. Dusseldorf Şubesi arasında yapılan sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle 04.07.2012 tarih B.30.2.HAC.0.73.00.00/919 sayılı Rektörlük oluru ile sözleşme feshedilmiş olup kesin teminatın irat kaydedileceği belirtilmiştir.

Bahse konu firmaya ait kesin teminat mektupları Akbank T.A.Ş. Kızılay Şubesi tarafından EUR.717.255,63 karşılığı 1.536.648,46 TL ve USD.384.618,03 karşılığı 682.697,00 TL olmak üzere toplam 2.219.345,46 TL Başkanlığımız hesabına aktarılmıştır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Nurgül AYHAN
Strateji Geliştirme Daire Başkan V.

EKLER _____ :

- Ek-1 : Dekont Örneği (1 Adet)
Ek-2 : Muhasebe İşlem Fişi Örneği (1 Adet)

Muhasebe Birim Kodu	6754		
İşlem Tarihi	25/07/2012	İşlem Nosu	20120018903
Kabul Saati	14:00:10	Onay Saati	
Hakediş Kart No			
Muh. Bir. Adı	Hacettepe Üniversitesi		Bölge Yılı
Kurum Kodu	1	2	Birim
38	4	0	Yevmiyenin
Kurum Adı	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		Tarihi
Birim Adı			No.su
Adı	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		İlgilinin
Soyadı	Sİ STRATEJİ GELİ		T.C./Vergi Kimlik No
Banka Şube Adı			4540016259
Banka Hesap No			
Bağlı Old. Vergi Dairesi			

Hesap No	Kurumsal Kodu	Fonksiyonel Kodu	Fin. Kodu	Ekonomik Kodu	B.Ö. R. C. U. T. A. R. İ. L. A. C. A. K.	Hesap/Ayrıntı Adı
102				1 0 0 0	2.219.345,46	Muhasebe Birim Ba BANKA HESABI
600				5 9 1 3	2.219.345,46	İrat Kaydedilecek T GELİRLER HESABI
800				5 9 1 3	2.219.345,46	İrat Kaydedilecek T BÜTÇE GELİRLERİ H
805				0 0 0 0	2.219.345,46	GELİR YANSITMA GELİR YANSITMA HE

Toplam 438.690,92 TL 438.690,92 TL

MUHASEBE BİRİMİNİN			KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN		
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi	Vergilendirme Dönemi	Kodu	Adı	Yevmiye Tarihi	Yevmiye Numarası

TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE				
Kasa No.	Vezne Alındı No.	Menkul Kıymetler Alındısı No.	Çek Numarası	Gönderme Emri No.

İADE OLUNAN EMANETLERDE			ADRES, AÇIKLAMA ve EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ)	
Hesaba Alındığı Tar	Yevmiye Numarası	Kimin Adına Kayıtlı Olduğu	Marubenl Europe Plc Dus.Akbank Kızılay Şb kesin tem Euro 2,14240*717.255,63 Usd:1,77500*384.618,03	
ÖN ÖDEMELERDE				
Avans ve Kredi Veril. Tarihi	Yevmiye Numarası	İlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı		

..... Düzenleyen Adı, Soyadı	 Uygundur Harcama Yetkilisi Adı, Soyadı	 Ödeyiniz / Mahsup Ediniz Muhasebe Yetkilisi Adı, Soyadı	 Tahsil Edilmiştir / Ödenmiştir Veznedar Adı, Soyadı
Yalnız TL aldım.			

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Büyük Mükellefler V.D./92200320759570588

DEKONT

1 / 2

25/07/2012 ANKARA

1
DEKONT

SAYIN

12:03:31

SO

392996 TL
30401 TL

2.219.345.46

2,219,345.46



GONDEREN : AKBANK TAŞ KIZILAY ŞUBE - AKBANK EFT MERKEZİ
KIZILAY/ANKARA SORU NO : 7729332 TCNO/YN: 150015264 0
DMM356/6961(717255.63EURO) VE DMM/356/6962(384618. 03USD)
KONTRAGARANTİ TAZMİN

vb17198

Müşteri

MODEL NO: EBL5-6002-2011

Telefon Bankacılığı: 444 0 724

İnternet Bankacılığı: www.vakifbank.com.tr

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Büyük Mükellefler V.D./92200320759570588

DEKONT

1 / 2

25/07/2012 ANKARA

1
DEKONT

SAYIN

12:03:31

SO

392996 TL
30401 TL

2.219.345.46

2,219,345.46



GONDEREN : AKBANK TAŞ KIZILAY ŞUBE - AKBANK EFT MERKEZİ
KIZILAY/ANKARA SORU NO : 7729332 TCNO/YN: 150015264 0
DMM356/6961(717255.63EURO) VE DMM/356/6962(384618. 03USD)
KONTRAGARANTİ TAZMİN

vb17198

Müşteri

MODEL NO: EBL5-6002-2011

Telefon Bankacılığı: 444 0 724

İnternet Bankacılığı: www.vakifbank.com.tr



T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Ek-67

Sayı : B.30.0.HKM.622.01

Konu: İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı

İVEDİ-SÜRELİ



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi : 25.07.2012 tarih ve B.30.2.HAC.0.61.00.00/HA-3306 sayılı yazınız. *Ek-67*

İlgi yazınız ile Milli Eğitim Bakanlığına intikal eden, "Marubeni Europe Plc." hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi istenmiştir.

Söz konusu yasaklama kararı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından alınan 30.07.2012 tarihli yazı ve ekindeki Makam Olurunun bir örneği yazımız ekinde gönderilmekte olup, yasaklama kararının Kamu İhale Kurumunun www.kik.gov.tr sayfasında yer alan formun esas alınarak on beş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmasının Üniversitenizce sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ
Başkan Vekili

Ek:

Yazı ve ekinin örneği (3 sayfa)

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

ACELE VE GÜNLÜ

Sayı : B.08.0.OGM.0.06.00.00-010.01/ **19157**
Konu: İhalelere Katılmaktan Yasaklama
Kararı

30/07/2012

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

- İlgi: a) 26/07/2012 tarihli ve B.30.0.HKM.659.07-6975/31945 sayılı yazı,
b) 30/07/2012 tarihli ve B.08.0.OGM.0.06.00.00-010.01/19091 sayılı Makam Onayı.

Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılan Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında Uluslararası İhale ile tamamı dış kredili anahtar teslimi olmak kaydıyla 171 kalem makine, ekipman ve malzemenin temini montajı ve garanti ihalesini üstlenen, ancak taahhüdünü yerine getirmediği bildirilen "Marubeni Europe Plc." firmasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanması ilgi (a) teklif üzerine ilişkide gönderilen ilgi (b) Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Söz konusu yasaklama kararının Kamu İhale Kurumunun www.kik.gov.tr sayfasında yer alan Formun esas alınarak 15 gün içinde Resmî Gazete'de yayımlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Ercan TÜRK
Bakan a.
Genel Müdür

EK: İlgi (b) Makam Oluru (2-sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.OGM.0.06.00.00-010.01/ **19091**
Konu: İhalelere Katılmaktan Yasaklama
Kararı

30/07/2012

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) 25/07/2012 tarihli ve B.30.2.HAC.0.61.00.00/HA/3306 sayılı yazı,
b) 26/07/2012 tarihli ve B.30.0.HKM.659.07-6975/31945 sayılı yazı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi (b) yazısı ekinde alınan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün ilgi (a) yazısında, Üniversitenin Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında uluslararası ihale ile tamamı dış kredili anahtar teslimi olmak kaydıyla 171 kalem makine, ekipman ve malzemenin temini montajı ve garanti hizmeti için İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihaleyi üstlenen "Marubeni Europe Plc." Firmasının sözleşmeye konu cihazlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine Üniversitenin Ankara 11. Noterliğinin 22/02/2012 tarih ve 002128 nolu ihtarnamesi gönderilmiş, firmanın Beşiktaş 11. Noterliğinin 02/03/2012 tarih ve 10513 nolu cevabi ihtarnamesi ile üniversitenin taleplerinin bir kısmının yerine getirilmesinin reddedildiği, bir kısmının ise yerine getirileceğinin bildirilmesine rağmen bugüne kadar yerine getirilmediği, daha sonra Ankara 11. Noterliğinin 07/06/2012 tarih ve 005738 nolu ihtarnamesi ile ihtarnamenin tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde firmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edilmiş, ancak sözleşme hükümlerine göre verilen 10 gün süre 21/06/2012 tarihi itibarıyla sona erdiği halde firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin 04/07/2012 tarihli Rektörlük Oluru ile feshedildiği, kesin teminatın irat kaydedildiği belirtilerek, adı geçen firmanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması önerilmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesinde "üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir..." hükmü yer almaktadır.

Teklif, Genel Müdürlüğümüzce uygun mütalaa olunmaktadır.



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


Sayı : B.08.0.0GM.0.06.00.00-010.01/ 19091
Konu: İhalelere Katılmaktan Yasaklama
Kararı

30/07/2012

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılan Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında Uluslararası İhale ile tamamı dış kredili anahtar teslimi olmak kaydıyla 171 kalem makine, ekipman ve malzemenin temini montajı ve garanti ihalesini üstlenen, ancak taahhüdünü yerine getirmediği bildirilen "Marubeni Europe Plc." Firmasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanması hususunu olurlarınıza arz ederim.


Ercan TÜRK
Genel Müdür

OLUR
27/07/2012


Merdan TUFAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı



BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 1317109092
ADI VE SOYADI : Mehmet KAYA
BABA ADI : Süleyman
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 06.01.1953 AYAŞ
İKAMET ADRESİ : Kocatepe Cad. 199. Sk. 1/10 4. Etap
 Eryaman /ANKARA
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 282 10 34 – 297 64 11 – 0533 814 69 65
ÜNVANI : Daire Başkan Yardımcısı (Şb.Müdürü)
BİLGİNİN ALINDIĞI YER :
TARİH VE SAAT :
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Beytepe Daire Başkan Yrd.(Şube Müdürü)
ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Beytepe Daire Başkan Yrd.(Şube Müdürü)
KONU : **MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.**
VERİLEN BİLGİDE :

SORU : Bu ihale hakkında neler biliyorsunuz?

CEVAP: 2001 yılında yapılan ihaleydi. O tarihte dış alımlar müdürüydüm. 2003 yılında Beytepe'ye gönderildim. Bundan sonra herhangi bir bilgim yok.

SORU : Süreç nasıl işledi.?

CEVAP : Mali aşaması Sayıştay Aşaması Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış İlişkiler Müdürlüğüdür.

Mehmet ÖZEN Bey başkanımıdı.

SORU : İhaleye kaç firma girdi?

CEVAP : Birden fazla firma ihaleye girdi. En ucuz fiyatı Marubeni Firması verdi.

Krediyi ihaleye giren Firma sağlıyor. Hazine garantisi aldık.

SORU : Firma hemen kredi buldu mu?

CEVAP: Amerikan Exim Bank, Citibank'tan bulmuş.

SORU : Paking list olması gerekmez mi?

CEVAP: Olmak zorunda.

- Gümrük çekimi zor oluyor muş?
- Paket listesi naylon torba içinde kasalar üzerinde durur. Bu listeyi alırsınız. Gümrükten tek kalem olarak çıkar. Mal üniversiteye gelince liste dosyasına konulur.

Fahri Ersoy

Qu

- Paketler hastanede açılırken firma yetkilisi hastane yetkilisi olur. Liste kontrol edilir.

SORU : Marubeni ile ilgili bilginiz var mı?

CEVAP: Göreviniz Dış Alımlar Müdürünüzün 2003'de Beytepe'ye gönderildim.

Neden sorusunu Beytepe'yi toparla diye cevap verildi.

Dış kredi aşamaları uzundur. Mali amaç, Sayıştay araştırması vardır. 2003 sonunda akreditif aşamasına geçildi ve Beytepe'ye gönderildim.

SORU : Marubeni'ye niye karar verildi?

CEVAP: En ucuz verdiği için.

SORU : Marubeni niye krediyi geç buldu?

CEVAP: Hazine sıkıntıları vardı. 2003'ün sonunda akreditif buldu (Sadece hazine aşaması bitti) kredi alınabilir aşamasında onaylandı. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından onaylandı. Bu prosedürler normal işledi.


SORU : 2003'den sonrası ile bilginiz var mı?

CEVAP: Atilla KONAÇ Başkanlığında toplantı oldu ve ben bu toplantıya gitmedim. 2003'den beri Beytepe'de İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığındaydım (Başkan Yardımcılığı) ondan sonra da Dış Alımlar Müdürlüğünü kapattılar.

Bu tarz alımlarda packing list olacak. Ancak cihazların dışında bunlar yok. Naylon torba içinde paket listesi üzerindeki malları görürsünüz. Örneğin tomografi cihazı dersiniz içinde 500 tane parçası vardır. Tek kalem olarak gümrükten çekilir. Sonra listeyi alıp bakarız İslam Kalkınma Bankası kredisi ile alınanları anlatayım.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN



Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU




Bilgi Veren

Mehmet KAYA



Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR



BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO : 48331876246
 ADI VE SOYADI : Yaşar ANDİÇ
 BABA ADI : Elvan
 DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 1965 Kargın / DELİCE
 İKAMET ADRESİ : Akşemseddin Mah. Ferudun Sk. 8/2
 Sincan / ANKARA
 EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 0536 793 52 50
 ÜNVANI : Memur
 BİLGİNİN ALINDIĞI YER :
 TARİH VE SAAT :
 O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011) : Gümrük Görevlisi
 ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV : Gümrük Görevlisi
 KONU : MARUBENİ'den alınan 171 kalem malzeme hk.
 VERİLEN BİLGİDE :

SORU : Göreviniz?

CEVAP: Gümrük Görevlisiyim.

1993 yılında İbrahim BIÇAKÇIOĞLU yanında yardımcı olarak çalıştım. 1993'de işe başladığımda Mehmet KAYA bizim müdürümüz Mithat ACAR, Mustafa KARASEYFİOĞLU, Özlem TEZCAN AVCI, Halil AYDIN, İbrahim BIÇAKÇIOĞLU, Nursel İLİKLİ, Havva DİNÇER'le çalışıyorduk. 2003 yılında Kaya Bey Beytepe'ye gitti. Diğer arkadaşlar Bilimsel Araştırmalar Birimine gitti (Nursel İLİKLİ, Havva DİNÇER, Mithat ACAR, İbrahim BIÇAKÇIOĞLU. EK-1). Bizler Özlem TEZCAN AVCI, Sebiha KARAOSMAN, Halil AYDIN beraber kaldık.

1993 yılında evrak götür – getir ve yardım işlerini yapıyordum. 2003 yılında bu birim dağıldı. Arkadaşlar BAB birime gitti.

Muayene kabul protokollerin hepsini saklıyoruz.

SORU : Fakat 9 tanesi kayıp ? 9 malzemenin orijinal kaydı yok mu?

CEVAP: 9 tane evrakın orijinali yok, Meral Hanımın listesi ile benim listeyi karşılaştırdık. Meral Hanım firmadan muayene kabul belgelerinin fotokopisini aldı. 9 kalem ama 15'e tekabül ediyor. Kendi belgelerimi karıştırdım, bu 9 belgeyi bulamadım. Meral Hanım bende var firmadan aldım dedi, banada bu fotokopilerden verdi. Bu evrakları benim dışımda kişiler kabulünü yapmış (2010 yılı) olabilir.

SORU : Bu proje kimindir?

Filiz Erzan

CEVAP: Bilmiyorum.

SORU : Bu evraklar kaç yılında kayboldu?

CEVAP: 2011 veya 2010 yılında bu evraklar kayboldu.

SORU : Talimatları kimden aldınız?

CEVAP: 1993-2003 Kaya Bey sonra Mehmet ÖZEN amirim oldu, 1-2 yıl sonra Aslan YÜCEL Beyden talimat aldım. Bütün malları gümrükten ben çektim.

SORU : 9 kalemi gümrükten siz mi çektiniz?

CEVAP: Evet.

SORU : Gümrüğe gittiğinizde elinizde (packing) list var mıydı?

CEVAP: Yoktu.

SORU : Gelen malzemeler var mıydı?

CEVAP: Bazılarında vardı bazılarında yoktu.

SORU : Neden yoktu?

CEVAP: Gümrükten çekimi daha kolay oluyordu. İşin uzaması nedeni ile bu yöntem kullanılıyordu.

SORU : Bu alışılmış davranış mıdır?

CEVAP: Evet. Firma bana tarifeleri veriyordu. Bende gümrükten çekiyordum. Yanımda firma elemanı oluyordu. Onlar kamyonu yükleme işlemlerini yapıyorlardı. Malzeme inerken de firmacı vinç getiriyor ve indiriyordu.

İncekaralardan % 99 Özgür ÇİVİ genelde oluyordu Yılmaz İŞLEK arada bir oluyordu.

Ertuğrul KALE depodan Özgür Bey ile malzemeyi alıyordu. Ayrıca bölüm elemanı da oluyordu.

Gümrükten malzemeyi çekince benim yükümlülüğüm bitiyor.

Malzeme geldiği ülkeden dolayı sarı hatta yönleniyor. Belge kontrol bölümü bu bölüm. Onayı buradan alıp malımızı teslim alıp kamyonlara yüklüyorduk.

SORU : Gümrüğe git kim diyor?

CEVAP: Mehmet ÖZEN Bey beni arayıp gümrüğü çekmemi söylüyor. İrtibatı Ertuğrul Bey ile kuruyorduk. İhtiyaçlarımızı karşılıyordu.

SORU : Prof.Dr.Tezer KUTLUK sizi hiç aradı mı?


CEVAP: Hayır. Genelde aracı firma veriyordu. Araç istemek için birkez görüştüm.

SORU : Hep Ertuğrul KALE ile mi işi yürüttünüz?

CEVAP: Aslan Beyle daha çok konuşuyordum. Ara sırada Ertuğrul KALE ile de konuşuyordum.

SORU : Komisyon kuruluyor imzalanıyor ve size geliyordu değil mi?

Fulya Elcan



CEVAP: Evet.

SORU : Malzeme geliři ne zaman bitti?

CEVAP: 2009.

SORU : O zaman sorumlu kimdi?

CEVAP: Nejat Bey'di.

SORU : Evrakları kontrol etmediniz mi?

CEVAP: Meral Hanım göreve gelince 9 malzeme muayene kabul kaybolduğunu fark ettik.

Rektör Bey komisyonu onaylıyor, bana gönderiyor, ben hazırlık yapıp Onkolojiye yolluyorum. Onlarda imzalıyorlar.

SORU : Malzemeleri teslim al (gümrükten) diye kim söylüyordu?

CEVAP: Mehmet ÖZEN Bey.

SORU : Telefonla hiç bilgi soran oldu mu?

CEVAP: Hayır bu komisyondan kimse beni arayıp soru sormadı.

SORU : 9 kalemle ilgili belgeleri siz mi hazırladınız?

Bu belgeleri ben tanzim etmedim. 9 kalem için hazırlanan matbu form benim formlara benzemiyordu.

Meral KİRAZLI bu evrakları firmadan aldım, size de verebilirim dedi. Bu evrakları benim yazmadığımı Meral Hanım, Aslan Bey, Ertuğrul KALE'ye de söyledim.

Bu evrakları ben yazmadığıma göre başkası yazmış. Ben onlardan üst yazıyı istedim, bakayım dediler, ama bulamadılar.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Filiz Ercan

Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU

Canan Hekimoğlu

Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

Mutlu Aytemir

Bilgi Veren

Yaşar ANDİÇ

Yaşar Andic

08/11/2012

Sayı : B.30.2.HAC.0.00.00.00/410 – 6367

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Yaşar ANDİÇ,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 20.11.2012 günü saat 15:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.



Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Yaşar Andic'in
verdikleriEk - 69'a ilave
(Ek - 1)

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 002/153

Konu :

Onkoloji-USExim-USD

08/01/2007

T.C.

BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü' ne

- İlgi: a) 03.04.2006 tarih ve B.02.1.HM.0.DEİ.05.02 -.02.03/679 sayılı yazınız.
b) 21.04.2006 tarih ve B.30.2.HAC.0.70.73.03 /38 /5728 sayılı yazınız.

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi'nin (II.Kısım) finansmanı amacıyla 24.10.2005 tarihinde imzalanan ve ilgi (a) yazınızla etkin hale geldiği bildirilen kredi anlaşmaları ile Citibank N.A' dan sağlanan 2495 - 5118 - 38941 finansman no.lu USD.7.403.218,65 tutarlık ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanacak olan USD.3.233.452,70'lık tutarın bütçeleştirme işlemi 2005 yılında Bütçe Dairesi Başkanlığınca, 2006 yılına ait olan USD.3.496.222,55'lık tutarın bütçeleştirme işlemi ise 20/12/2006 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılmış olup, 2005 yılında 4.342.526,98 YTL, 2006 yılında 4.989.109,57 YTL toplam olarak 9.331.636,55 YTL bütçe emanetine alınmış ve henüz krediden kullanımlar başlanmamıştır.

Bilindiği gibi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile anılan Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5568 sayılı Kanun hükümleri gereğince 01.01.2006 tarihinden itibaren dış kredilerden yapılan kullanımların ilgili üniversiteye ikraz edilmesi yerine geçmişte olduğu gibi üniversitelere tahsis edilmesi amacıyla hazırlanan kanunun 26.12.2006 tarihinde T.B.M.M.de kabul edilerek, 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile söz konusu krediden kullanımın gerçekleştirilmesine Üniversitemizce başlanılacaktır.

Bu nedenle 5568 sayılı kanunun (3.maddesinin geçici 12 maddesi) yürürlüğe girmesi nedeniyle, 30.12.2005 tarih ve 173/21277 sayılı yazımız ile açılmasını talep etmiş olduğumuz USD.3.233.452,70'lık tutarlık Akreditifimize ilaveten ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanacak olan USD.3.496.222,55'lık tutarlık kısmının da akreditifinin açılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

T. C.	
BAŞBAKANLIK	
Hazine Müsteşarlığı	
No :	1494
Tarih :	
Şube Kayıt No :	

Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör

EKLER:

Ek: 1 Adet Fatura



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü


Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 343/006
Konu :

12/01/2007

MARUBENİ EUROPE PLC.

DUSSELDORF BRANCH
IMMERMANNSTRASSE 45, 40210
DUSSELDORF GERMANY

Üniversitemiz **Onkoloji Hastanesi Projesi** (II.kısım) kapsamında 02.04.2001 tarihinde firmanızdan satın alınmasına karar verilen “ **171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman** ” tanımlı malzeme ile ilgili düzenlenen **USD.12.316.800** ve **EUR.16.000.000** tutarlık sözleşme gereği 24.10.2005 tarihinde imzalanan kredi anlaşmaları kapsamında 2005 Mali Yılı ödenğinde yer alan tutardan karşılanacak toplam **USD.6.117.245,00** ve **EUR.4.198.062,00** ile 2006 Mali Yılı ödeneğinden karşılanacak **EUR, 10.323.846.00** **USD. 5.146.161.00**’lık olmak üzere toplam **EUR 14.521.908.00** **USD 11.263.406.00**’ akreditiflerin açılabilmesi için T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazılan yazımız uyarınca ekli liste kapsamındaki malzemelerin sözleşme gereği teslim edilmesini saygılarımla rica ederim.


Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör

EKLER:

Ek-1: 1 Adet Malzeme Listesi

Kemur	: 09/01/07	Ek
Ş o f	: --/--/--	
Şb. M. A.	: --/--/--	
Başkan M. A.	: 9/1/07	Ek
Başkan	: 9/1/07	Ek
Gen. Sek.	: --/--/--	



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 16/4796
Konu :

22.01.2007

T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI'NA

- İlgi: a) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın 22.01.2007 tarih ve B.02.1.DPT.0.09.02-8-27/ 230 sayılı yazınız.
b) 01.02.2007 tarih ve B.30.2.HAC.0.70.73.03/009/1455 sayılı yazımız.

Üniversitemiz 2007 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 1990 I 001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı" Projesi kapsamında 12.361.800 USD. ve 16.000.000 EUR. satın alınmasına karar verilen " 171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman " tanımlı malzemeler için 2005 ve 2006 yıllarında bütçeleştirme işlemi yapılarak bütçe emanetine alınan toplam 41.662.779,98 YTL ödeneğin 2007 yılına devri Müsteşarlığınız tarafından uygun mütalaa edilmiş ve ihtiyaç duyulan proje revizyonu 2006/11105 program kararnamesinin 7/h ve (i) maddelerine istinaden yazınız eki cetvel esasları dahilinde ikmal edilmiştir.

Öte yandan 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince 01.01.2006 tarihinden itibaren dış kredilerden yapılan kullanımların ilgili kurumlara ikraz edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Ancak bu hüküm Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun (Madde-3'le düzenlenen) Geçici 12.maddesinde "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun eki (II) sayılı Cetvelin (A) bölümünde bulunan kuruluşların yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı için 01.01.2006 tarihinden önce imzalanan dış kredi anlaşmaları çerçevesinde sağlanan krediler, anılan kuruluşlara tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilir. Bu maddeye istinaden kullanılacak krediler ile ilgili olarak krediyi tahsis eden kuruluş hakkında, 14. maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşlara uygulanmaz." hükmünün 30.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmesi ile akreditiflerin açılması için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına gerekli bilgiler verilmiştir.

/.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yazmış olduğu 18 Ocak 2007 tarih ve 2215 sayılı yazılarında, Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan Onkoloji Hastanesi 171 kalem Makine ve Teçhizat Alımı Projesinin kısmi finansmanı amacıyla 24 Ekim 2005 tarihli anlaşma ile Citibank International Plc'den sağlanan ve anlaşmada yer alan 3.066.061,35 ABD doları ve 8.665.415,10 Euro tutarında Hermes Garantili İhracat Kredisine sağlanan kredi anlaşması çerçevesinde krediden kullanımların yapılabilmesi için şubeleri nezdinde (2005 ve 2006 yıllarında bütçeleştirilmesi yapılarak bütçe emanetine alınan tutarlar karşılığında) toplam tutarı 2.844.219,85 ABD doları ve 7.799.338,20 Euro olmak üzere akreditif açılması için kredi anlaşmasının Ek- 5'i uyarınca Akreditif formu ile diğer belgeleri göndermiştir. Ayrıca Citibank N.A' dan sağlanan 2495-5118-38941 finansman no.lu EUR.4.934.584,90 ve 2495-5118-38944 no.lu USD.7.403.218,65'lık ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanacak tutarların Akreditifleri ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından anlaşma gereğince yurtdışında açılacaktır.

"4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un" 14.maddesinin 5.ve 6. paragraflarında 'Proje kredilerinden kullanılacak tutarlar için ilgili yıl bütçesinde kullanıcı kuruluşun talebine bağlı olarak kredi anlaşmalarında öngörülen kullanım dönemleri ve tutarlar göz önünde bulundurularak yeterli ödenek tahsis edilir. Ancak, dış proje kredisi ve hibe kullanımlarından kaynaklanan, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi karşılığı iç kaynağın bulunamaması durumunda bu vergileri ve kur farklarından doğan maliyet artışlarını karşılamak amacıyla yılı yatırım programında yapılacak revizeler üzerine genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinin mevcut yada yeni açılacak tertiplerine belirtilen vergiler ile maliyet artışlarını geçmemek üzere ödenek eklemeye ve bütçeleştirmeye, yıl içinde hakedişlerden doğan ihtilaflar sonucu tahakkuk işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle harcanamayan miktarı ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye, devren ödenek kaydedilen miktarlardan projenin tamamlanması nedeniyle kullanılma imkanı kalmayan tutarları iptal etmeye, Maliye Bakanı Yetkilidir. İkraz ve tahsis edilen krediler ve sağlanan Hazine garantileri kapsamında konsolide bütçeye tabi kullanıcı kuruluşlarca yapılacak her türlü yatırım harcaması, yılı bütçesinin ilgili tertipleri ile ilişkilendirilir. Bu kapsamda, genel ve katma bütçeli kuruluşlar tarafından proje kredisi olarak kullanılacak her türlü imkanın, kullanımdan önce bütçeleştirilmesi esastır. Ayrıca, konsolide bütçe dışındaki kuruluşlar tarafından proje kredisi olarak kullanılacak her türlü imkanın kullanımdan önce kuruluşların kendi bütçeleri ve muhasebe sistemleri içinde ödenek ve gider kaydedilmesi esastır.

Söz konusu Hermes Garantili İhracat Kredisine ve ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanarak Hazine Müsteşarlığı ve Üniversitemiz tarafından Akreditifleri açılmış olan tutarların karşılığı olarak ödenek devri yapılan 41.662.779,98 YTL'lık tutar kapsamında 2007 yılı içinde yurt dışından gelecek malzemelerin gümrük işlemleri esnasında ödenmesi gereken, Üniversitemiz kaynaklarından karşılanamayan %18 KDV tutarı 7.492.100,40 YTL'nin Maliye Bakanlığı'nın Yedek Ödenek tertibinden, gümrük masrafı ile banka masrafları tutarı 2.697.366,80 YTL'nin ise Müsteşarlığımızın Yatırımları Hızlandırma Ödeneği'nden karşılanmak üzere toplam 10.189.467,20 YTL, ödeneğe acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan Onkoloji Hastanesi 171 kalem Makine ve Teçhizat Alımı Projesinin kısmi finansmanı amacıyla 24 Ekim 2005 tarihli anlaşma ile Citibank International Plc'den sağlanan ve anlaşmada yer alan 3.066.061,35 ABD doları ve 8.665.415,10 Euro tutarında Hermes Garantili İhracat Kredisine sağlanan kredi anlaşması çerçevesinde henüz bütçeleştirilmesi yapılamayan kısım USD.221.841,50 ve EUR.866.076,90 ile Citibank N.A' dan sağlanan 2495-5118-38941 finansman no.lu EUR.4.934.584,90 ve 2495-5118-38944 no.lu USD.7.403.218,65'lık ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanarak Akreditifleri açılan EUR.4.544.283,60 ve USD.6.729.675,25'lık kısımlardan kalan bakiyeler EUR.309.301,30 ve USD.673.543,40 ile gelecek olan malzemelerin bedellerinden %15'leri peşin ödemesi yapılacak olan EUR.302.713,80 ve USD.158.009,10 ile birlikte toplam kalan bakiye EUR.1.478.092,00 ve USD.1.053.394,00 kısımların Akreditiflerinin açılması için gerekli olan Ana para ve Gümrük ve KDV masraflarının toplamı ABD doları 1.50 YTL, EUR 2.00 YTL olarak hesaplandığı takdirde 4.449.510,99 YTL ana para bu paranın karşılığında gelen olan malzemelerin gümrük işlemleri esnasında ödenecek %18 KDV tutarı 800.911,97 YTL Gümrük Masrafları ile banka masrafları tutarı 347.083,78 YTL toplam 5.597.506,74 YTL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle, 1990 I 001900 no.lu Onkoloji Hastanesi 171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman Alımı Projesi kapsamında, Akreditifleri açılmış bulunan Hermes Garantili İhracat Kredisinin sözleşmesinin 24 Ekim 2007'de tarihinde, ABD Exim Garantili İhracat Kredisinin sözleşmesinin ise 25 Ocak 2008 tarihinde sona erecek olması da göz önüne alındığında sözkonusu projenin 2007 yılında kapatılması için dış kaynaktan karşılanamayan %18 KDV tutarı 8.293.012,37 YTL'nin Maliye Bakanlığı'nın Yedek Ödenek tertibinden gümrük vergileri ile banka masrafları tutarı 3.044.450,58 YTL ile henüz bütçeleştirilme işlemi yapılmayan malzeme bedeli karşılığı 4.449.510,99 YTL'nin ise Müsteşarlığınızın Yatırımları Hızlandırma Ödeneği'nden karşılanmak üzere toplam 15.786.973,94 YTL ödenegün sağlanmasını ve proje ile ilişkilendirilerek revize edilmesini saygılarımla arz ederim.



Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör

DAĞITIM :

Gereği :

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığına

Bilgi :

Maliye Bakanlığı
(Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne)

Memur	: 20/3/07	
Şef	: 20/3/2007	
Şb. Md.	: —/—/—	
Dağkan Yrd.	: 20.03.07	
Başkan	: 20.03.07	
Gen. Sek.	: —/—/—	

41

Corp. Sec. : 5/1/01
 2001 : 5/1/01
 Co. 1000 : 05/1/01
 : 04/01/01
 : 04/01/2001 H.D.

PROJE BİLGİLERİ

PROJENİN ADI :Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 2.Etap Projesi

UYGULAYICI KURULUŞ :Hacettepe Üniversitesi, ANKARA

TOPLAM PROJE MALİYETİ :39 Milyon USD.

FİNANSMAN İHTİYACI :

- A) İç :
B) Dış : 28 Milyon USD.

YATIRIM PROGRAMI BİLGİLERİ :

A) 2001 Yılı Yatırım Programında
Yer Alıp Almadığı : Evet

B) Yer Alıyor ise 2001 Yıllık Yatırım
Programundaki Yeri :
• Proje Numarası :
• Resmi Gazete'de yer aldığı
Sayfa Numarası

PROJENİN AMACI :Türkiye'ye tam donanımlı bir Kansere Merkezi kazan-
dırarak , yurt dışına gidişleri azaltmak ve bu konuda
uzman açığını kapatmak.

FİZİBİLİTE RAPOR BİLGİLERİ :

A) Fizibilite raporu hazırlanıp hazırlanmadığı :Hazırlandı, DPT ve Başbakanlık Hazi-
Ne Müsteşarlığı'na verildi.(21.07.1999)

B) Hazırlanıyor ise hangi aşamada olduğu :

PROJE GERÇEKLEŞTİRME SÜRESİ :2001 yılı sonu veya 2002 yılı başları

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER :Makine-Teçhizatla ilgili ihale 21.02.2001 tarihinde yapı-
lacaktır.

PROJE İÇİN AYRILAN ÖDENEK :

SON DURUM VE GÖRÜŞLER :
(DPT Görüşü dahil)

**UYGULAYICI KURULUŞUN
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NDAN TALEBİ :**

PROJE İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ YÜRÜTEN BİRİM :
(İsim, Telefon, Faks) 1-Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

2-Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Başhekimliği
Prof.Dr.M.Tezer KUTLUK Onkoloji Hastanesi Başhekimisi
Fax : 309 29 12 Tel : 305 29 10-305 29 31



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
ANKARA

Dış Alımlar Şube Müdürlüğü
SAYI : B.30.2.HAC.0.70.73.02/
KONU:

..../..../....

SATINALMA KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi : **Karar No**
02.04.2001 05

Satınalma Komisyonu Süreyya ÖZER Başkanlığı'nda bugün saat 14.00'de toplandı.

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesinin Uluslararası ihale yoluyla tamamı dış kredili olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51.Maddesi (p) fıkrası uyarınca yurt dışından ithal etmek istediğimiz 179 kalem tıbbi cihaz, ekipman, makine ve teçhizatın anahtar teslimi olarak satın alınması ile ilgili 02.04.2001 tarih ve saat 14.00'de Üniversitemiz Kültür Merkezi (R) Salonunda; 26.03.2001 tarihinde alınan Ara Karar'a istinaden İdari Şartnamemizin 4.Maddesi uyarınca paketin bütünlüğünü bozmayan ve dolayısıyla Hastane faaliyete geçtiğinde temel işlevlerini aksatmayacak şekilde alınacak olan cihazların, verimli çalışmasını engellemeyen bazı kalemlerin alımından vazgeçilmesi, bazı kalemlerinin de sayısının azaltılarak ihalenin gerçekleştirilmesi için Onkoloji Hastanesi Başhekimliği'nce çıkarılması ve eksilmesi önerilen ve Rektörlük'ce uygun görülen malzeme listesi görülerek 4 firmaya yazılan davet mektubunda belirtildiği üzere Komisyon çalışmalarına başladı.

Firmaların 26.03.2001 tarihindeki pazarlıkta beyan ettikleri seçenekler için önerdikleri son tekliflerinden başlamak şartıyla pazarlığa geçildi.

Simed International B.V. firmasının, 02.04.2001 tarihli yazılarıyla söz konusu pazarlığa katılamayacağını beyan ettikleri,

Nissho Iwai Corporation firmasının 1.turda 29.990.000 US\$ teklif ettiği , 2.turda 02.04.2001 tarihli yazılarını ibraz ederek ve sözlü olarak da pazarlıktan çekildiklerini beyan ederek pazarlık tutanağını imzaladıkları,

Marubeni Corporation (Türkiye Temsilcisi : İncekara A.Ş.) firmasının ekli listede beyan ettiği seçenekler için 27.turda 29.420.000 US\$, son yazılı tekliflerinde ise 16.000.000 EURO ve 12.316.800 US\$ teklif ve taahhüt ettiği,


FRITZ Werner (Türkiye Temsilcisi : Meteksan Sistemler Teknoloji A.Ş.) firmasının ekli listede beyan ettiği seçenekler için 27.turda 27.998.000 US\$, son yazılı teklifinde 27.797.000 US\$ teklif ve taahhüt ettiği görüldü.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 01.05.1998 tarih ve 23739 sayılı yazısı ile Onkoloji Hastanesi II.Etap Projesi kapsamında gerçekleştirilecek makine ve teçhizat alımının Uluslararası standartlara uygun dış kredili olarak sağlanması için yapılan pazarlık sonucunda ilişik listede gösterilen malzemenin en ucuz fiyatı veren **Marubeni Corporation** (Türkiye Temsilcisi : İncekara A.Ş.) firmasından **16.000.000 EURO ve 12.316.800 US\$** bedelle satın alınmasına ve Kararımızın Rektörlük Makamı'nın Onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

KOMİSYON BAŞKANI


Süreyya ÖZER
Genel Sekreter Yrd.


ÜYE


Hasan BEYTAŞ
Bütçe Dairesi Başkan Yrd.

ÜYE


Mehmet ÖZEN
İdari ve Mali İşl.Dai.Bşk.

ÜYE


Mak.Müh.M.Sabri ÜSTÜN
Yapı İşl.Teknik Dai.Başk.Yrd.

TEKNİK ÜYE


Prof.Dr.M.Tezer KUTLUK
Onkoloji Hastanesi Başhekim V.

TEKNİK ÜYE


Prof.Dr.Mustafa N.ÖZMEN
Erişkin Hastanesi Başhekim Yrd.

TEKNİK ÜYE


Prof.Dr.Şevket RUACAN
Onkoloji Enstitüsü Müdürü


TEKNİK ÜYE


Prof.Dr.Lale ATAHAN
Radyasyon Onkolojisi A.B.D.Başkanı

UYGUNDUR

16.1.4/2001

Prof.Dr.Tunçalp ÖZGEN
REKTÖR



Yaşar Andıç'ın
verdiği belgeler
Ek-1

YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMLARI

2000 YILINDAKİ PERSONEL

Mehmet KAYA (Müd.) Mustafa KARASEYFİOĞLU (Şef) Nursel İLİKLİ, Havva DİNÇER, Mitat ACAR, Halil AYDIN, İbrahim BIÇAKÇIOĞLU, Yaşar ANDIÇ

2002 YILINDA PERSONEL

Mustafa KARASEYFİOĞLU (Şef) Emekli oldu Mehmet KAYA (Dai.Bşk.Yrd.) Özlem Tezcan Avcı Bankadan nakil geldi (Şef) Nursel İLİKLİ, Havva DİNÇER, Mitat ACAR (Şef) Halil AYDIN, İbrahim BIÇAKÇIOĞLU, Yaşar ANDIÇ

2003 YILI PERSONEL

Mehmet KAYA (Dai.Bşk.Yrd) Beytepeye nakil gönderildi. Nursel İLİKLİ, Havva DİNÇER, Mitat ACAR (Şef) Halil AYDIN, İbrahim BIÇAKÇIOĞLU, Bilimsel Arş.Birimine nakil gönderildi.

2004 YILI PERSONEL

Özlem Tezcan AVCI (Şef) Sebiha KARAOSMAN, Halil AYDIN, Yaşar ANDIÇ Daire Başkanı Mehmet ÖZEN beye bağlı olarak göreve devam edildi.

2005 YILI PERSONEL

Halil AYDIN emekli oldu Özlem Tezcan AVCI (Şef) Sebiha KARAOSMAN, Yaşar ANDIÇ Daire Bşk Yrd. Arslan YÜCEL beye bağlı olarak göreve devam edildi.

2006 YILI PERSONEL

Özlem Tezcan AVCI (Şef) 10/10/2006 yılında Maliye Bakanlığına nakil, Sebiha KARAOSMAN beytepeye nakil olarak gitmişler ve Yaşar ANDIÇ, Dai.Bşk.Yrd. Arslan YÜCEL beyle birlikte göreve devam etmişlerdir.

2007 YILINDA

Mehmet ÖZEN Dai.Bşk. başka birime nakil gönderilerek, giderek yerine Nejat ERTÜRK görevlendirilmiş Arslan YÜCEL (Dai.Bşk.Yrd.) yürütücülüğünde Yaşar ANDIÇ (Memur) gümrük işlemleri ve 171 kalem Onkoloji Hastanesi Projesinin Akreditif ve diğer işlemlere 2012 yılı başına kadar devam edilmiştir.

2012 YILINDA


Nejat ERTÜRK emekli olmasıyla yerine Hülya KÖSE İdr.Mali İşl.Dai.Bşk. olarak göreve atandı ve Arslan YÜCEL bey diğer işlere görevlendirildi Atanur AYDEMİR (Müdür) sorumluluğunda Sebiha KARAOSMAN ve Yaşar ANDIÇ 171 kalem Onkoloji Hastanesi işlemlerine ve gümrük işlemlerine devam edilmektedir.

73

18 04 2000

**Sağlık Hizmetleri
Ayniyat Saymanlık Müdürlüğü'ne
(Sadık KOÇ Bey'in dikkatine)**

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Modernizasyonu için İslam Kalkınma Bankası'ndan temin edilen krediden karşılanmak üzere yurt dışından ithal etmiş bulunduğumuz makine-teçhizatlarla ilgili 18 takım dosya yazımız ekinde sunulmaktadır. Söz konusu makine-teçhizatların ayniyat girişlerinin kesilerek tarafımıza gönderilmesi hususunda gereğinin yapılmasını rica ederim.


Mehmet KAYA
Dış Alınlar Şube Müdürü

Ek-1 : 18 Takım Suret Dosya.



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
ANKARA

Dış Alımlar Şube Müdürlüğü
Sayı :B.30.2.HAC.0.70.73.02/ 540

Tarih :2/.. /2002

Bütçe Dairesi Başkanlığı'na

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Farmasotik Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Ünsal ÇALIŞ'a ait (AF-2003-32) 02 G 020 no.lu projede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve ihalesi yapılan, CIF.EURO.20.790 bedel ile Güleç Chemicals (T.T.: Kimetsan Kim.Mad.Met.End.İç ve dış Tic.Ltd.Şti.) firmasından satın alınmasına karar verilen 3 kalem Kimyasal Malzeme tanımlı malzemeye ilgili EURO.550 'lik Geçici Teminat Mektubu yazımız ekinde sunulmaktadır.

Söz konusu teminat mektubunun saklıya alınarak, alındı makbuzunun tarafımıza gönderilmesini arz ederim.

Mehmet KAYA

İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Yrd.


310

22.05.2000

Erişkin Hastanesi Başhekim Yardımcılığı'na

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi için bedeli İslam Kalkınma Bankasından karşılanmak üzere yurt dışından ithal etmiş bulunduğumuz malzemelerle ilgili %10'luk kısımların ödenebilmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına havale masrafı olarak 13.500.000.-TL nin ödenebilmesi hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Mustafa KARASEYİOĞLU
Dış Alımlar Şube Müdürlüğü
Satınalma Şefi





HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
ANKARA

Dış Alımlar Şube Müdürlüğü
SAYI : B.30.2.HAC.0.70.73.02/ 634
KONU:

23.07.2003

Bütçe Dairesi Başkanlığı'na

Üniversitemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Hüsnü ÇAKIRLAR'a ait (AF-2003-34) 02 02 601 005 no.lu projede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve ihalesi yapılan 1 Kalem Taşınabilir Fluoresans Monitör Sistemi işine ait ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Redoks Kim.ve Elekt.Cih.Dış Tic.Koll.Şirk.'e ait 250 GBP'lik Geçici Teminat Mektubu yazımız ekinde sunulmaktadır.

Söz konusu teminat mektubunun saklıya alınarak, alındı makbuzunun tarafımıza gönderilmesini arz ederim.

Mitad ACAR

Dış Alımlar Şube Müd.V.



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
ANKARA

Dış Alımlar Şube Müdürlüğü

SAYI : B.30.2.HAC.0.70.73.02/ **1190**
KONU :

3.1.10/2003

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'ne

Konu: Bedelsiz İthalat Hakkında

Tıp Dekanlığı Mikrobiyoloji Bölümü adına Amerikadan gönderilen 2 kap 15 kg. ağırlığındaki malzeme 235 8864 7510 nolu konşimento ile USD. 400.- bedelle Bedelsiz olarak gümrüğünüze gelmiş bulunmaktadır.

Bedelsiz ithaline Müdürlüğünüzce müsaade edilmesini saygılarımla arz ederim.

İbrahim BİÇAKCIOĞLU
H. Tepe Güm. Görevlisi



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 68
Konu :

11.09/2006

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA

Başkanlığımız Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğünde görevli C-5814 sicil no'lu Özlem TEZCAN AVCI, 04/09/2006 tarihinde izne ayrılmış olup 11/09/2006 tarihinde senelik izinden dönmüştür.

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim.


Arslan YÜCEL
İdari ve Mali İşler Dai.Bşk. V.

Memur	: --/--/--	
Şef	: 11/09/06	
Şl. Md.	: --/--/--	
Başkan Yrd.	: 11/09/06	
Başkan	: --/--/--	
Gen. Sek.	: --/--/--	



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

SAYI : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 154/45314
KONU :

DB-2005-05

41/11/2005

PALME DAĞITIM PAZ. İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
Adnan Saygun Cad. No:10/A

Sıhhiye / ANKARA

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Beytepe Kampusu Merkez Kütüphanesi'nin ihtiyacı olan " 1194 Kalem Kitap Alımı " firmanızda kalmış olup derhal malzemenin İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ayniyat Saymanlığı Genel Malzeme Deposu'na faturası ile birlikte teslim edilmesini, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 583 Sıra No'lu tebliği uyarınca ödemenin yapılabilmesi için "Banka Hesap Numarası"nın yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İDA.VE MALİ İŞL.BŞK.Y.


Arslan YÜCEL
İda.ve Mali İşl.Dai.Bşk.Yrd.

EKLER :
Ek :1 liste



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
ANKARA

Dış Alımlar Şube Müdürlüğü


SAYI : B.30.2.HAC.0.70.73.02/ 04

KONU :

26/01.12005

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA

Başkanlığımız Dış Alımlar Satınalma Şefliğinde görevli E-4140 sicil numaralı Halil AYDIN'a ait emeklilik dilekçesi ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.


Arslan TUCEL

İdari ve Mali İşler Dai. Bşk.V.

EKLER:

EK-1: 1 Ad. Emeklilik dilekçesi

26.01.05
26.01.05



İHALE ONAY BELGESİ

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BELGE TARİH VE SAYISI	30.10.2007-011
HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ'NE	
İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER	
İŞİN TANIMI	Katma Değer Vergisi
İŞİN NİTELİĞİ	USD.12.316.800 ve EUR.16.000.000 "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman "
İŞİN MİKTARI	171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman
Yaklaşık Maliyet	----
Kullanılabilir Ödenek Tutarı	10.189.50 bin YTL
Yatırım Proje Numarası (varsa)	1990 I 001900
Bütçe Tertibi (varsa)	38 04 38 32 07 32 00 06 1 2 03
Avans Verilecekse Şartları	-----
İhale Usulü	-----
İlanın Şekli ve Adedi	-----
Ön Yeterlik / İhale Dokümanı Satış Bedeli	-----
Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı	-----
Bakanlar Kurulu Kararı	-----
İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR	
Üniversitemiz 2007 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 1990 I 001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı" (II.kısım) Projesi kapsamında Marubeni Europe Plc. Firmasından satın alınmasına karar verilen "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman " tanımlı malzemeler için Citibank International Plc'den sağlanan 3.066.061,35 ABD doları ve 8.665.415,10 Euro tutarında Hermes Garantili İhracaat Kredisine ve Citibank N.A dan sağlanan 2495-5118-38941 finansman no.lu EUR. 4.934.584,90 ve 2495-5118-38944 no.lu USD.7.403.218,65'lik ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanarak Gümrük Müdürlüğü'nden ithalat işlemlerine başlanan 30.10.2007 tarih ve 07060200IM042224 Gümrük Giriş Beyanname Muhteviyatı malzemelerin % 18 Katma Değer Vergisi bedeli olan 18.791,28 YTL'nin Esenboğa Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası Hasköy-Ankara Şubesinde bulunan 308 1000-5115 no.lu hesabına 2007 Mali Yılı Bütçemizin 38 04 38 32 07 32 00 06 1 2 03 harcama tertibinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca ödenmesini;	
ONAY	
onaylarınıza arz ederim 30/10/2007 Arslan YÜCEL İda.Mali.İşl.Dai.Bşk.V.	Uygundur 30/10/2007 Prof. Dr. Uğur ERDENER Hast.Gen.Direk.

ÖDEME EMRİ BELGESİ

[illegible]

Yukarıda yazılı #ONSEKİZBİN YEDİYÜZDOKSANBİR YTL YIRMİSEKİZ YKR# Bütçe Gideri tahakkuk ettirilmiştir. Ödenmesi / Mahsubu gerekir.

Ödeme Emri Belgesi No.	Bütçe Gideri Tahakkuk Toplamı		Özel Gider İndirimi Toplamı		Kasıntı Toplamı		Ödenmesi Gereken		Çek / Gönderme Emri No.
	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr	
	18.791	28	0	00	0	00	18.791	28	
TETKİK EDEN									
Memur	Şef		Muhasebe Yetkilisi Yrd.						
Onay									
AÇIKLAMA VE EKLER									
ÖDEMEYE ESAS BELGENİN									
Türü	Tarih	No.su	Tutarı						
			YTL	YKr					
			0	00					
..... / / 20			Uygun 30.10.2007 Harcama Yetkilisi				Ödeyiniz / Mahsup Ediniz / / 20 Muhasebe Yetkilisi		
			Prof.Dr.Nazım ERDENER Harc.Gen.Direkt.						

Yalnız : #ONSEKİZBİN YEDİYÜZDOKSANBİR YTL YİRMİSEKİZ YKR# aldım.

(*) Gerçekleştirme görevleri arasından harcama yetkilisine görevlendirilen kişi tarafından imzalanacaktır.

e-bülgə - Bülğə və Mail Kontrol Genel Müdürlüğü

~~Sencik UNCEL~~
~~Tahsinuk Sefi~~

6

d) İhracat / İthalat No

RUBENI EUROPE PLC

IMMERMANSTR. 45
DUSELDORF 40210 004

ESENBOĞA GÜMRÜK MOD

BUZ 4 1 0 1

07060200IM042224

3 Formülasyon

4 Yönl. Etkisi

30/10/2007

5 Kalem izni

6 Kap adedi

7 Referans numarası

1

2

9 Mali Müşavir/Serbest Muhasebeci

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞT.DAİRE.

SAMANPAZARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NO 1/

ANKARA/ALTINDAĞ 000000 052

10 Gideceği /sevk

052

11 Ticaret yapları

004

12 Kime bildirilmiştir

13 T.R.

14 Beyan sahibi / Temsilci

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞT.DAİRE.

SAMANPAZARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NO 1/

ANKARA/ALTINDAĞ 000000 052

15 Çıkış/Varış Ülkesi

ALMANYA

16 Menşe Ülkesi

TÜRKİYE

17 Çıkış/Varış Tarihi

18 Çıkış/Varış Tarihi

19 Kt.

20 Teslim şekli

CIF ANKARA

21 Sonin geçen/gözetim hareketli teslim aracının kimliği ve kaydı olduğu Ülk.

KAMYKAMYON

22 Döviz ve toplam fatura bedeli

EUR 60,564.67

23 Döviz

1.70720

24 Finansal ve bankacılık verileri

T.C. MERKEZ BANKASI ANKARA SUBESİ

25 Sınırsız taşıma

30

26 Döviz taşıma

27 Yükleme boşaltma yer

ESENBOĞA

28 Finansal ve bankacılık verileri

T.C. MERKEZ BANKASI ANKARA SUBESİ

29 Gümrük idaresi

AKPIKULE TIR GÜMRÜK MÜSÜPİ

30 Eşyanın bulunduğu yer

AKREDİTİF

31 Eşya kodu

73110091

32 Kalem

90 00

33 Menşe Ülkesi

004

34 Brüt ağırlık (kg)

6,180.00

35 Tercih kanıtı

AT

36 Net ağırlık (kg)

6,000.00

37 Kala

07 REJİM

40

41

42 Kalem

60,564.67

43 HY Kodu

44

45 Ayarlar

46 İstisna

87,019.02

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

Sn Aslan Bey,

KDV konusuyla ilgili olarak bu günkü görüşmemize istinaden teslimati 2008 yılına sarkması muhtemel cihaz listesi ekdedir.

Liste toplamı : USD 8,0005,753 + Euro 5,605,477 dir.

Listeye aşağıda belirtilen kalemler de dahil edilmistir.

EXIM

1. Beds from Hill Rom - (Teslimati henüz kesinleşmemistir)
2. MRI scanner from GE - Yer hazır olmaması ihtimaline karşı)

HERMES (EU)


3. Bu kapsamdaki cihazların tamamının bu yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanmaktadır. Fakat olası gecikmeler dikkate alınarak bu kalemler de dahil edilmistir. Zira Aralık ayı ortalarından itibaren Noel ve Kurban Bayramı tatilleri dolayısıyla Nakliye firmalarının büyük bir kısmının çalışmaması muhtemeldir.

Saygılarımızla
İbrahim E. Kiliç

MARUBENİ

List	Item List No.	Item Code	TOTAL CIF ANK	Currency	Supplier	Despatch from
2005	1	SER1	455.520,00	USD	Hill Rom Beds	EXIM
2005	5	SER5	15.725,00	USD	Hill Rom Beds	EXIM
2005	11	SER11	90.090,00	USD		EXIM
2005	15	SER15	3.760,00	USD		EXIM
2005	31	CER15	1.502,00	USD		EXIM
2005	35	YOB1	59.350,00	USD	Hill Rom Beds	EXIM
2005	39	YOB5	10.204,00	USD		EXIM
2005	40	YOB6	72.072,00	USD		EXIM
2005	44	RUY1	55.000,00	USD	Hill Rom Beds	EXIM
2005	50	KPT5	6.031,00	USD		EXIM
2005	53	KPT8	6.988,00	USD		EU
2005	54	KPT9	2.470,00	EUR		EU
2005	58	KPT13	4.320,00	EUR		EU
2005	60	KPT15	3.383,00	EUR		EU
2005	62	KPT17	1.210,00	EUR		EU
2005	63	KPT18	7.800,00	EUR		EU
2005	64	KPT19	43.746,00	USD		EU
2005	66	KPT21	2.767,00	EUR		EU
2005	68	KPT23	17.128,00	USD		EU
2005	72	KAB4	6.988,00	USD		EU
2005	92	ECZ3	2.470,00	EUR		EU
2005	109	ONK3	4.246,00	USD		EXIM
2005	112	ONK6	3.142,00	USD		EXIM
2005	113	ONK7	15.306,00	USD		EXIM
2005	114	ONK8	1.933,00	EUR		EU
2005	115	ONK9	732,00	EUR		EU
2005	116	ONK10	2.160,00	EUR		EU
2005	118	ONK12	6.643,00	EUR		EXIM
2005	121	ONK15	1.270,00	EUR		EU
2005	123	ONK17	3.383,00	EUR		EU
2005	126	ONK20	2.420,00	EUR		EU
2005	133	ONK27	2.767,00	EUR		EU
2005	135	ONK29/e	0,00	EUR		EU
2005	136	KIU1	43.240,00	USD	Hill Rom Beds	EXIM
2005	143	KIU8	36.036,00	USD		EXIM
2005	146	KIU11	13.638,00	USD		EU
2005	147	KIU12	5.304,00	USD		EXIM
2005	148	KIU13	68.572,00	USD	Baxter	EXIM
2005	149	KIU14	7.270,00	USD		EXIM
2005	150	TRP1	2.551.020,00	USD		EXIM
2005	151	TRP2	468.214,00	EUR		EXIM
2005	153	TRP4	397.959,00	USD		EXIM
2005	155	TRP6	306.122,00	USD		EXIM

2006	162	RAD1	218.500,00	EUR	MRI Scanner	EXIM	
2006	163	RAD2	686.714,00	EUR		EXIM	
2006	164	RAD3	1.248.571,00	EUR		EXIM	
2006	168	RAD7	280.929,00	EUR		EXIM	
2006	169	RAD8	811.572,00	EUR		EXIM	
2006	170	RAD9	291.429,00	USD		EXIM	
2006	171	RAD10	64.359,00	EUR		EXIM	
2006	172	RAD11	49.759,63	EUR		EU	Part
2006	173	GAS1	3.418.355,00	USD		EXIM	
2005	178	NUK2	1.560.714,00	EUR		EXIM	
2006	179	NUK3	170.416,86	EUR		EU	Part



**HACETTEPE ÜNİVER
ONKOLOJİ HASTANESİ BA**

Tezer Bayle
İlgili yazı
fotokopileri

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.10.14/174

Dr. Salih Yılmaz
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Ankara

İlgi: 7.9.1999 tarih, 2500 sayılı yazınız

Onkoloji Hastanesi projesi için İslam Kalkınma Bankası (IKB)'dan temin edilen krediden karşılanmak üzere yurtdışından ithal edilecek ekipmanlara ilişkin 42080, 4276, 42119, 41993, 42079 sayılı akreditiflerin sürelerinin, IKB tarafından teyit edilmemesi nedeniyle 15.11.1999 tarihine kadar uzatılması 31.8.1999 tarih ve 270 sayılı yazımızla daha önce talep edilmişti. İlgili yazınızla 2.12.1990 tarihli anlaşma ile sağlanan IKB kredisinin bugüne kadar kullanılmama nedenleri sorulmaktadır.

Hastanemizin ayaktan tedavi hizmeti veren bölümü 1993 yılında hizmete açılmış olup, ülkemizde konusunda büyük bir açığı kapatmaktadır. 180 hastaya hizmet verecek olan yataklı kısmı ise henüz tamamlanmamıştır. IKB'dan temin edilen kredinin büyük kısmı hastanemizin açıldığı 1993 yılından beri kullanılmış olup, adı geçen akreditiflerle ilgili gecikme büyük ölçüde kurumlar arası yazışmaların uzun sürmesine bağlı olmaktadır. Yataklı kısmın inşaatının tamamlanmaması da indirek olarak bu gecikmede etkili olabilmektedir. Bugünkü noktada, adı geçen akreditiflerin teyit edilmesi ile ilgili cihazların teminindeki gecikmelerde önlenebilecek ve kredinin kullanımı tamamlanacaktır. Bu konuda teyit işlemlerinin tamamlanabilmesi için IKB ile temasa geçilerek durumun bildirilmesi hastanemizle ilgili ihtiyaçların karşılanması açısından büyük yarar sağlayacaktır.

Ayrıca, IKB'dan alınan 28 Haziran 1999 tarih ve 41/TU387 sayılı yazı ile Loan komponentinden 1.391.682/260 ID. Lease komponentinden ise 1.948.059/571 ID miktarın harcanmadığı belirtilmekte başka bir istek olup olmadığı buna göre projenin tamamlama raporunun hazırlanması konusu gündeme getirilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak geriye kalan bakiyenin harcanması konusunda, hastanemizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik liste hazırlanarak, Hazine Müsteşarlığına görüş sorulmuş ve uygun görüldüğü takdirde bu miktarların kullanılması istenmiştir. Bu konu ile ilgili yazışmalarda ilişikte tekrar verilmiştir. Bu konuda Hazine Müsteşarlığı'ndan cevap beklenmektedir.

Gereğini arz ederim.

Prof. Dr. M. Tezer Kutluk
Başhekim
Hacettepe Onkoloji Hastanesi

Ek: 1. İslam Bankasından alınan faks mesajı
2. TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilen faks mektubunun kopyesi ve ekli listeleri



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ONKOLOJİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.10.14.

T.C. Hazine Müsteşarlığı
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne

13.7.199

İlgi: İslam Bankasının 28 Haziran 1999 tarih ve 41/TU/3087 sayılı faks mesajı

Hacettepe Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında kullanılan İslam Bankası "Loan" ve "Lease" kredileri ile ilgili olarak ilişikteki İslam Bankasından alınan 28 Haziran 1999, 41/TU/3087 sayılı faks mesajından "Loan" kredisinden 1,391.682/260 ID ve "lease" kredisinden 1,948.059/751 ID bakiye mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakiyelerle ilgili ilişik 1 no'lu liste loan kredisinden 2 no'lu liste ise lease kredisinden temin edilmek üzere hazırlanmıştır. Bu cihazların temini hastanemizin hizmetlerine tartışmasız katkıda bulunacaktır.

Gereğini arz ederim.

Prof. Dr. M. Tezer Kutluk,
Başhekim
Hacettepe Onkoloji Hastanesi
06100 Ankara

Tel: 312-305 2931
312-305 2932
312 305 2910
Fax: 312-310 7018

Ek: İslam Bankasından alınan faks mesajı
Liste 1 (Loan kredisine için)
Liste 2 (Lease kredisine için)

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT

Operations and Projects Department 1



معاً نبني مستقبلاً أفضل
TOGETHER WE BUILD A BETTER FUTURE
ENSEMBLE NOUS CONSTRUISONS UN Avenir Mieux

البنك الإسلامي للتنمية

إدارة العمليات و المشاريع ١

FAX
Urgent (2 pages)

١٤ ١٤٢٠
28 JUN 1999

Ref: 41/TU 3087

Professor Suleyman Saglam
Rector, Hacettepe University

cc: Dr. Salih Yilmaz
Deputy Director General
Undersecretariat of Treasury
Ankara, Turkey
Fax: (90-312) 2128737

cc:
Professor Dincer Firat
Director General, Oncology (Cancer) Hospital
Hacettepe University
06100 Ankara Turkey
Fax : (90-312) 311-0994

Dear Professors,

**Subject: Closing of Undisbursed Amounts of the IDB Loan and Lease
Financing Facilities for the Hacettepe (Oncology) Hospital, Turkey.**

We wish to refer to IDB Fax No. 41/TU/629 dated 14 February, 1999 (copy attached for your reference) As you are kindly aware the loan component approved in June '91 has presumably been completed and since you have not submitted plans for further utilization, we should like to cancel the undisbursed balance of ID 1,391,682/260 after which the IDB would prepare a loan repayment schedule.

2. Under the lease component there is an undisbursed balance of ID 1,948,059/51. Since we have not received any more new requests for procurement, the IDB will also cancel this balance and prepare a repayment schedule.

3. We once again draw your attention to insure the IDB lease assets as per the requirements of the lease agreement.

We would appreciate your comments at the earliest.

With best regards,

Yours sincerely,

Farook uz Zaman
27/6/99

Farook uz Zaman
Acting Director, O&P Department-1

Cc: Br Kunrat

File

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
P.O. Box 5925, JEDDAH - 21402

ISLAMIC BANK JEDDAH - TELEX: 601107 ISOB SJ
TELEPHONE: 636 - 1400 - FAX: 6368271

المملكة العربية السعودية

ص. ب. ٥٩٢٥ جدة ٢١٤٠٢

رقن: ٦٠١١٠٧ إسوب س ج - ٦٠١٤٠٠ - ٦٣٦٨٢٧١
هاتف: ٦٣٦٨٢٧١ - ٦٣٦١٤٠٠ - ٦٣٦١٠٧٠

ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
B.P. 5925, JEDDAH - 21402
ADRESSE TELEGRAPHIQUE: BANK ISLAM - JEDDAH
TELEX: 601 107 ISOB SJ
TELEPHONE: 6361400 - FACSIMILE: 6368271

LIST 1 (LOAN CREDIT)

#	Equipment	Quantity	Unit price (USD)	Total price (USD)
1	Flow cytometry system	1	210000	210000
2	Flow cytometry sorting device	1	300000	300000
3	DNA analyses system	1	100000	100000
4	Dosimeter system	1	80000	80000
5	Minispin	4	1000	4000
6	Vacuum pump (Cryo Vac)	1	5000	5000
7	UV lamp	2	500	1000
8	Automated immunohistochemistry device	1	50000	50000
9	Programmable DNA thermal cycler	2	12500	25000
10	Sub Gell GT/Power PAC (3000 volt) power supply	1	5300	5300
11	Electrophoresis system for southern blotting	3	3000	9000
13	Hot plate with magnetic stirrer	6	600	3600
14	Waterbath with shaking features	3	3000	9000
15	Waterbath with digital heat control	3	1000	3000
16	Vortex	6	250	1500
17	Laminar flow "hood"	3	6000	18000
18	Deep freezer (-85 C°)	4	15000	60000
19	Dry block heater with digital display	3	1500	4500
20	Hybridization oven	2	5000	10000
21	Orbital shaker	3	3000	9000
22	Desktop centrifuge	4	5000	20000
23	Scale with analytical balance	3	2500	7500
24	pH meter	3	1000	3000
25	Microtome	2	13000	26000
26	Cytocentrifuge	2	12000	24000
27	Pipettor set (3)	6	750	4500
28	Gel dryer system	2	6000	12000
29	Microcentrifuge	3	10000	30000
30	Ultrasonic homogenizer	2	5000	10000
31	Homogenizers	2	3000	6000
32	Vertical electrophoresis systems with power supply	3	1800	5400
33	Incubator with CO2	4	9000	36000
34	Multithreaded microscope	3	20000	60000
35	Inverted microscope	1	13000	13000
36	Micromacro 12TPN compounder	5	15000	75000
37	Microfuse extended rate syringe infuser	24	1000	24000
38	Triple monitoring device pulseoxymeter-blood pressure	10	5000	50000
39	Hepafilter system	15	15000	225000
40	Lifecare patient controlled anaesthesia system	4	4000	16000
41	Omniiflow 4000 plus - four line infusion system	20	2500	50000
42	Life care 5000-single line infusion system	20	2000	40000
				1645300

LIST 2 (2012-2013)

#	Equipment	Quantity	Unit price (USD)	Total price (USD)
1	Linear accelerator	1	1350000	1350000
2	CT simulator	1	600000	600000
3	3-D radiotherapy planning system	1	500000	500000
4	Endoscopy system for brachytherapy	1	100000	100000
				2550000

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 73/12076
Konu :

18/7/2006

T.C.
BASBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı
(Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne)

İlgi : 4 Temmuz 2006 tarih ve 1599 sayılı yazınız hk.

Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı Projesi ile ilgili Müsteşarlığınız tarafından 20 Temmuz 2006 günü saat 14.30'da yapılacak olan toplantıya Üniversitemiz adına aşağıda isim ve ünvanı belirtilen yetkili katılacaktır.
Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Prof.Dr.Erol BELGİN
Rektör Vekili

Adı Soyadı :
Prof.Dr.Tezer KUTLUK

Ünvanı :
Onkoloji Hastanesi Başhekimi

T.C.
BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı

14 TEMMUZ 2006

İVEDİ-SÜRELİ

Sayı : B.02.1.HM.0.DEİ.05.02.-.02.03/1599
Konu : Kredi anlaşmaları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

17.07.06* 38135

Üniversiteniz tarafından yürütülmekte olan, Onkoloji Hastanesi Makina ve Teçhizat Alımı Projesinin finansmanı amacıyla 24.10.2005 tarihli anlaşma ve ek mektup ile Citibank N.A.'dan 7.403.218,65 ABD Doları tutarında ABD Exim garantili ihracat kredisi, 24.10.2005 tarihli anlaşma ve ek mektup ile Citibank N.A.'dan 4.934.584,90 Avro tutarında ABD Exim garantili ihracat kredisi, 24.10.2005 tarihli anlaşma ve ek mektup ile Citibank International Plc'den 3.066.061,35 ABD Doları ve 8.665.415,10 Avro tutarında Hermes Garantili İhracat Kredisi ile 24.10.2005 tarihli anlaşma ile Citibank N.A. Bahreyn Şubesi'nden 1.847.520 ABD Doları ve 2.400.000 Avro tutarında ticari kredi sağlanmış olup, krediden kullanımlar henüz başlamamıştır.

Bilindiği gibi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile anılan Kanunda değişiklik yapılmasına dair 5436 sayılı Kanun hükümleri gereğince, anılan Kanunun II-(A) sayılı cetvelinde yer alan ve Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler olarak tanımlanan devlet üniversitelerinin, Müsteşarlığımızın Türkiye Cumhuriyeti adına borçlu olarak imzaladığı dış krediler ile finanse edilen projeleri kapsamında, 01.01.2006 tarihinden itibaren yapılan tüm kullanımlarının, ilgili üniversiteye ikraz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, 01.01.2006 tarihinden önce sağlanmış ve 01.01.2006 tarihinden sonra sağlanması planlanan tüm dış krediler tahtında, diğer bir ifadeyle kredi anlaşması imza tarihinden bağımsız olmak üzere, 01.01.2006 tarihinden sonra ilgili krediden gerçekleştirilmesi planlanan tüm kullanımların, bahse konu üniversiteye ikraz edilerek yapılması ve yapılan kullanım bazında doğan tüm masraflar ile birlikte, anılan üniversitenin Müsteşarlığımıza borçlandırılması gerekmektedir.

Öte yandan, üniversite projelerinin finansmanı amacıyla 01.01.2006'dan önce imzalanmış dış kredi anlaşmalarından yapılan kullanımların, ikraz edilmesi yerine geçmişte olduğu gibi, üniversitelere tahsis edilerek kullanırılmasına devam edilebilmesi amacıyla gerekli kanun değişikliği çalışmaları halihazırda sürmektedir.

Bu bilgiler ışığında, 01.01.2006 tarihinden itibaren yapılmış olan ve yapılması planlanan kullanımlar çerçevesinde, 20 Temmuz 2006 Perşembe günü saat 14:30'da Müsteşarlığımız 15. Katında bir toplantı düzenlenecek olup, bahse konu toplantıya kurumunuzdan üst düzey yetkililerin katılımının sağlanması ve katılacak yetkililerin isim ve ünvanlarının 18 Temmuz 2006 Salı günü mesai saati bitimine kadar Müsteşarlığımıza bildirilmesi (Faks: 212 85 50) hususunda gereğini rica ederim.

Memduh Aslan AKÇAY
Müsteşar
Genel Müdür

ONKOLOJİ HASTANESİ PROJESİ
179 KALEM TIBBİ CİHAZ, EĞİTİM, MAN, MAKİNE VE TEÇHİZAT ANAHTAR TESLİMİ İHALE TUTANAĞI

Sıra No.	Firma Adı	Geçici Tem. Tutarı	Teklif Mektubu Tutarı	Tic.ve San. Odası Bel.	İmza Sirküleri	Konsolosluk Tasdiki	Tebliğat Adresi	Yetki Belgesi	İmzalı Şartname	Kanuni İkametgah	Teknik Doküman	İHALE GEÇERLİ BELGESİ
1	Marubeni-İncekara A.Ş. (YILMAZ İŞLER)	1 080.000 US \$ 630.000 EURO	20.365.984 US \$ 27 756 387 EURO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Simed Int.(Nassetti) LEVENT İYİĞÜN	729.000 US \$ 660.000 EURO	25.140.004 US \$ 19.251.661 EURO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	FRITZ Werner (Meteksan) CENK TEZCAN	1.245.000 US \$	41.484.352 US \$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Nissso Iwai Corp. İHSAN SÖYÜTEMİZ	1.500.000 US \$	49.448.657 US \$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Komisyon Başkanı

Süreyya ÖZER
Genel Sekreter Yard.

Teknik Üye

Prof.Dr.M.Tezer KUTLUK
Onkoloji Hastanesi Başhekim

Üye

Hasan BEYTAŞ
Bütçe Dairesi Başk.Yrd.

Teknik Üye

Prof.Dr.Mustafa N.ÖZMEN
Erişkin Hast.Başhek.Yrd.

Üye

Mehmet ÖZEN
İd.ve Mali İşl.Dai.Başk.

Teknik Üye

Prof.Dr.Şevket RUACAN
Onkoloji Enstitü Müdürü

Üye

Mak.Müh.M.Sabri ÜSTÜN
Yapı İşl.ve Tek.Dai.Bşk.Yrd.

Teknik Üye

Prof.Dr.Lale ATAHAHAN
Radyasyon Onk.A.B.D.Başkanı



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SERMAYE GİDERLERİ
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: 0 (312) 305 1034-2333 - Faks: 0 (312) 311 4390
E-posta: imidb@hacettepe.edu.tr
www.imidbhacettepe.edu.tr

Sayı: B.30.2.HAC.0.73.03.00/ 33

01.12.2009

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

Üniversitemiz 171 kalem 1990 I 001900 no.lu **Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı** (II.kısım) Projesi işine ait Dış Proje Kredisinin Mahsup işleminin Muhasebeleştirme işleminin yapıldığı tarihteki kur üzerinden hesaplanması, taşınır işlemlerin ise iktisap tarihindeki (Fatura tarihi) kurun dikkate alınarak Muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle taşınır kayıtlarına ilişkin işlemler ödeme emri belgesinin üzerinde gösterilmeyerek ayrıca gönderilecektir.

Gereği hususunda bilgilerinizi arz ederim.

Prof.Dr. M.Tezer KUTLUK
Hastaneler Genel Direktörü

ASLI GİBİDİR
ACIĞI YÜCEL
İda. ve Mali İşl. Dai. Bşk. Yrd.

GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİSİ KULLANIM İZİN BİLDİRİM FORMU*

KULLANICI KURULUŞ

KURULUŞ ADI	H.Ü. REKTÖRLÜĞÜ	İLGİLİ MERKEZ SAYMANLIĞI KODU:	6754
KULLANICI BİRİM	ONKOLOJİ HASTANESİ	KUL.KUR.BÜTÇE KODU:	38 04
DIŞ FİNANSMAN KODU	2495-5118-38941		
DIŞ FİNANSMAN NUMARASI	38941		

EK BİLGİLER

PROJE DPT YT.PRĞ.ADI	ONKOLOJİ HAST.MAK.VE TEÇH. ALIMI	PROJE DPT YT. PRĞ. KODU	1990 I 00 1900
İŞİN/PROJE ADI	H.Ü. ONKOLOJİ HASTANESİ PROJESİ (II.KISIM) - (171 KALEM MAKİNA,MALZEME VE EKİPMAN ALIMI)		
KREDİTÖRÜN ADI	CİTİBANK N.A.		
ANLAŞMA TUTARI VE DÖVİZİ	EUR 4.934.584,90	ANLAŞMA TARİHİ	24.10.2005
EK ANLAŞMA TUTARI		İPTAL TUTARI	
CARİ ANLAŞMA TUTARI		KULLANIM SAYISI	0
TOPLAM KULLANIM TUTARI	0	KULLANILABİLECEK TUTARI	EUR 4.934.584,90

KULLANIM EMRİ VERİLECEK KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

S. ALINAN MAL VE HİZMET BEDELİ (Bütçe Gideri Kaydına Esas Alınacak) VEYA	
S. ALINACAK MAL VE HİZMET BEDELİ (Avans verilmesi,Akreditif açılması)	EUR 390.301,30
AKREDITİF AÇILACAK İSE TOPLAM TUTAR	EUR 390.301,30
AKREDITİFİN KAÇ YILDA KULLANILACAĞI	8
CARİ YILDA KULLANILACAK BÜTÇELEŞTİRMEYE ESAS ALINACAK TUTAR	4.580.000,00 YTL
KULLANIM EMRİ VERİLECEK TUTARI	EUR 390.301,30
T.C.M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU	20560
KULLANIM EMRİ VERİLECEK TUTARI (YTL)	802.771,72

YÜKLENİCİ VEYA MAL VE HİZMET SAĞLAYANA AİT BİLGİLER

YÜKLENİCİ ADI/ÖN VANI	MARUBENİ AMERICA CORPORATION	YÜKLENİCİ ÖLKESİ	ABD
FİİLİ İTHALTARİHİ		VERGİ SİCİL NO	13375951/0075
HAKEDİŞ VE FATURA NO	122422005FE22420504		

YUKARIDA YER ALAN BİLGİLERİN UYGUNLUĞU TASDİK OLUNUR

14/04/2008 Prof.Dr.Temim DİNCER İşletme Müdürü	14/04/2008 Prof.Dr.M.Tezer KUTLUK Hastaneler Genel Direktörü	14/04/2008 Prof.Dr.Uğur ERDENER Rektör

ÖDENEĞİ MEVCUTTUR.

14/04/2008 Murat KARAAGAC Strateji Geliştirme Daire Başkanı	14/04/2008 Prof.Dr.M.Tezer KUTLUK Hastaneler Genel Direktörü
KULLANICI KURULUŞ MERKEZ SAYMANLIĞI	BÜTÇELEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLUP, DIŞ FİNANSMAN KAYNAĞINA KULLANIM EMRİ VERİLEBİLİR.
Mİ SEBE KAYDI YEVMİYE NO	2008/3607
YEVMİYE TARİHİ	14.04.2008
TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU	20560
BORÇ KAYDEDİLEN HESAP ADI	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları
	Avans ve Akreditifler Hesabı
TUTARI	802.771,72 YTL.

DEVLET BORÇLARI SAYMANLIĞI

	YEVMİYE KAYDI YAPILMIŞTIR.	
YEVMİYE KAYIT NO	SAYMAN	
	İMZA	
YEVMİYE TARİHİ	TARİH	
	AD SOYAD	

(*) Her Bir Kullanım İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır.

A

106

22.4.99

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü' ne

İlgi : 01.05.1998 tarih ve 23739 sayılı yazınız.

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Projesinin 180 yataklı hastane, kemik iliği nakli ünitesi, radyoizotop tedavisi ve kanser tarama merkezini içine alan ikinci kısmının inşaatına, 1. Kısım olan "Gündüz Hastanesi'nin" açılışından hemen sonra 1994 yılında başlanılmış ve Üniversitemiz bütçe olanakları içerisinde bugüne kadar projenin yüzde ellisini oluşturan kaba inşaat, çatı, iç bölmeler, pencereler ve bazı iç tesisat tamamlanmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, projenin yukarıda bahsedilen 2. Kısım için 05.03.1998 tarih ve 123 sayılı yazımızla talep etmiş olduğumuz 28 milyon USD' lik kredi, firma kredisi olarak Hazine Müsteşarlığımız Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü' nün ilgide kayıtlı yazısı ile uygun görülmüş ve bu iznin 30.04.1999 tarihine kadar geçerli olacağı bildirilmiştir.

Onkoloji Hastanesi ikinci kısım inşaatının 1999 yılında, bütçe kaynakları ile bitirilmesi öngörülmüş olmakla beraber, 1998 ve 1999 yıllarında inşaat için yapılan tahsislerle inşaat projesinin ancak yüzde ellisi bitirilebilmiş, geri kalan bölümünün tamamlanabilmesi için yaklaşık 8 milyon USD bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.

Onkoloji Hastanesi yataklı bölümü ve özel ünitelerine duyulan büyük ihtiyaç ve şimdiye kadar yapılan yatırımların biran önce hizmete sokulabilmesi için, projenin 2. Kısımına ait alet ve donanım listesi tekrar gözden geçirilerek tahsis edilen 28 milyon USD' den tasarruf imkanları araştırılmış, 8 milyon USD' lik donanımın öncelik bakımından daha sonraya bırakılabileceği düşünülmüştür.

Onkoloji Hastanesi 2. Kısım projesi için tahsis edilen ve izin süresi 30.04.1999 tarihinde dolacak olan 28 milyon USD' lik, firma kredisi kullanım süresinin bir yıl daha, 8 milyon USD' lik bölümünün alet ve teçhizatla ilgili inşaatın tamamlanması ve 20 milyon USD' lik bölümünün ise alet ve teçhizat alımında kullanılmak üzere yeniden uzatılması için gereğini saygılarımla rica ederim.


Prof. Dr. Süleyman SAGLAM
REKTÖR

Eki : 1 - 01.05.1998 tarih ve 23739 sayılı yazınız

2- Proje Bilgileri

Genel Sek.	20/4/99	
Başkan	20/4/99	
Şb. Md.	20/4/99	
Sei	20/4/99	
Memur	20/4/99	

PROJE BİLGİLERİ

PROJENİN ADI: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 2ci Etap Projesi

UYGULAYICI KURULUS: Hacettepe Üniversitesi, Ankara

TOPLAM PROJE

MALİYETİ: 39 Milyon USD

FINANSMAN İHTİYACI:

A) İç : 1999 yılında inşaatın bitirilmesi için yeterli kaynak bütçe çerçevesinde istenecektir. (Yaklaşık 500-750 Milyar TL)

B) Dış : 28 Milyon USD

YATIRIM PROGRAMI BİLGİLERİ:

A) 1993 Yılı Yatırım Programında

Yer Alıp Almadığı: Evet

B) Yer Alıyor ise 1993 Yıllık Yatırım

Programındaki Yeri: Hacettepe Üniversitesi 1993 yılı bütçesi, yatırım Progra

- Proje Numarası: 841000040

- Resmi Gazete'de yer aldığı

Sayfa Numarası -

PROJENİN AMACI: Türkiye'ye Tam Donanımlı bir Kanser Merkezi kazandırarak, yurt dışına gidişleri azaltmak ve bu konuda uzman ağığını kaputmak.

FİZİBİLİTE RAPORU BİLGİLERİ:

A) Fizibilite raporu hazırlanıp hazırlanmadığı: Hazırlandı, DPT ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na verildi. (21.7.1997)

B) Hazırlanıyor ise hangi aşamada olduğu:

PROJE GERÇEKLEŞTİRME SÜRESİ: 1999 sonu veya 2000 yılı başı

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER: İnşaat Teksis Firmasına ihale edilmiştir. Kaba inşaat ve bir kısım tesisat 1998 yılında tamamlanacaktır.

PROJE İÇİN AYRILAN ÖDENEK: 1993 yılı için 213 Milyar TL.

SON DURUM VE GÖRÜŞLER: 2-5-97 DPT tarafından 2-7-1996 tarih ve 2534 sayılı ile (DPT görüşü dahil) onaylanmış ve Hazine Müsteşarlığına 7-11-1997 ve 25349 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

UYGULAYICI KURULUSUN

HAZINE MÜSTEŞARLIĞINDAN TALEBİ: Donanım ve Cihazlar için 28 Milyon USD dış kredi.

PROJE İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ YÜRÜTEN BİRLİK:

(İsim, Telefon, Faks) 1- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

TEL: 3119442 - 3110065, FAX: 3105552

2- Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Başhekimliği

TEL: 3092512, FAX: 3242009

1 Eger maliyet rakamı TL cinsinden veriliyor ise, bu tutarın belirlediği tarih ve var ise döviz kuru

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

11 Mayıs, 1998
B.30.2.HAC.0.A3.00.00- 93

Hacettepe Üniversitesi
Genel Sekreterliğine,

İlgi: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün
01.05.1998 tarih ve B.30.1.HM.0.DEL.05.01/SAĞ sayılı yazısı ekindeki belge.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün
periyodik olarak istemiş olduğu Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 2. Etap Projesi ile
ilgili Proje bilgileri ilişikte sunulmuştur. İlgili kuruluşa iletilmek üzere gereğine müsaadelerinizi
rica ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Dinçer FERAT
Enstitü Müdürü

Ek: 1

13/5

PROJE BİLGİLERİ

PROJENİN ADI: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 2ci Etap Projesi

UYGULAYICI KURULUŞ: Hacettepe Üniversitesi, Ankara

TOPLAM PROJE

MALİYETİ¹: 39 Milyon USD

FİNANSMAN İHTİYACI:

A) İç : 1999 yılında inşaatın bitirilmesi için yeterli kaynak bütçe çerçevesinde istenecektir. (Yaklaşık 500-750 Milyar TL)

B) Dış : 28 Milyon USD

YATIRIM PROGRAMI BİLGİLERİ:

A) 1998 Yılı Yatırım Programında

Yer Alıp Almadığı: Evet

B) Yer Alıyor ise 1998 Yıllık Yatırım

Programındaki Yeri: Hacettepe Üniversitesi 1998 yılı bütçesi, yatırım Progra

- Proje Numarası 841000040

- Resmi Gazete'de yer aldığı

Sayfa Numarası -

PROJENİN AMACI: Türkiye'ye Tam Donanımlı bir Kanser Merkezi kazandırarak, yurt dışına gidişleri azaltmak ve bu konuda uzman açığını kapatmak.

FİZİBİLİTE RAPORU BİLGİLERİ:

A) Fizibilite raporu hazırlanıp hazırlanmadığı: Hazırlandı, DPT ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na verildi. (21.7.1997)

B) Hazırlanıyor ise hangi aşamada olduğu:

PROJE GERÇEKLEŞTİRME SÜRESİ: 1999 sonu veya 2000 yılı başı

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER: İnşaat Teksis Firmasına ihale edilmiştir. Kaba inşaat ve bir kısım tesisat 1998 yılında tamamlanacaktır.

PROJE İÇİN AYRILAN ÖDENEK: 1998 yılı için 213 Milyar TL.

SON DURUM VE GÖRÜŞLER: Proje DPT tarafından 2.7.1996 tarih ve 2534 sayı ile (DPT görüşü dahil) onaylanmış ve Hazine Müsteşarlığına 7.11.1997 ve 52510 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

UYGULAYICI KURULUŞUN

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINDAN TALEBİ: Donanım ve Cihazlar için 28 MilyonUSD dış kredi.

PROJE İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ YÜRÜTEN BİRİM:

(İsim, Telefon, Faks) 1- Hacettepe Üniversitesi Röktörlüğü

TEL: 3119442 - 3110065, FAX: 3105552

2- Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Başhekimliği

TEL: 3092912, FAX: 3242009

¹ Eğer maliyet rakamı TL cinsinden veriliyor ise, bu tutarın belirlendiği tarih ve var ise döviz kuru belirtilmelidir.

ÖNE BİLGİLERİ

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

TOPLAM PR. NO:

Sayı : B.02.1.HM.0.DEİ.05.01/SAĞ

Ankara,

11.05.98- 23739

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi: 05.03.1998 tarih ve 123 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız konusu Rektörlüğünüz tarafından yürütülmekte olan Onkoloji Hastanesi II. Etap Projesi kapsamında gerçekleştirilecek Makina ve Teçhizat Alımı'nın uluslararası standartlara uygun ihale yoluyla kredili olarak gerçekleştirilmesi hususu uygun görülmekte olup, sözkonusu izin 30.04.1999 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecektir.

Projeye ilgili gelişmelerin öğrenilmesi amacıyla ilişik Proje Bilgi Formu'nun doldurularak altışar aylık dönemler halinde ve uluslararası ihale ilanı metninin bir örneğinin yayınlandıktan sonraki bir hafta içinde Müsteşarlığımıza gönderilmesi, Rektörlüğünüzce hazırlanacak ihale şartnamesinde ihaleyi kazanan firma(lar) ile imzalanacak ticari sözleşmenin ancak kredi koşullarının Müsteşarlığımız tarafından uygun bulunarak kredi anlaşmalarının imzalanmasından sonra yürürlüğe gireceği yönündeki bir hükme yer verilmesi, proje için Yıllık Yatırım Programında öngörülen dış ödenek sınırının aşılmaması veya ilgili kredi anlaşması öncesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca revize edilmesi ve bahsi geçen projenin sözkonusu projeye ilişkin ihalenin tamamlandığı ilgili yıla ait Yıllık Yatırım Programı içerisinde yer alması ve proje kapsamında vergi ve benzeri harcamaların kuruluşunuzun bütçesinden karşılanmasını teminen gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgileri ve ihale sonucunda kazanan firmaca uluslararası piyasada tanınmış birinci sınıf bir bankadan resmi ihracat kredisi veya standart eurocan şeklinde getirilecek, varsa kuruluşunuzun özkaynaklarından karşılanacak giderler dışındaki tüm finansman ihtiyaçlarını karşılayacak miktardaki ve "kesin olarak taahhüt edilmiş" (fully underwritten) kredi teklifinin ticari sözleşme imzalandıktan sonra Müsteşarlığımıza iletilmesi hususlarında gereği rica olunur.

(İstisna: Tezferik: Enis)

- Onkoloji Hastanesi Müdürü

Ek: Proje Bilgi Formu

- Sn. Süreyya Özer

- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

PROJE BİLGİLERİ

PROJENİN ADI :

UYGULAYICI KURULUŞ :

TOPLAM PROJE
MALİYETİ¹ :

FINANSMAN İHTİYACI :

A) İç :

B) Dış :

YATIRIM PROGRAMI BİLGİLERİ:

A) 199.. Yılı Yatırım Programında
Yer Alıp Almadığı:

B) Yer Alıyor ise 199.. Yıllık Yatırım
Programındaki Yeri:
- Proje Numarası
- Resmi Gazete'de yer aldığı
Sayfa Numarası

PROJENİN AMACI :

FİZİBİLİTE RAPORU BİLGİLERİ:

A) Fizibilite raporu hazırlanıp hazırlanmadığı:

B) Hazırlanıyor ise hangi aşamada olduğu:

PROJE GERÇEKLEŞTİRME SÜRESİ :

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER :

PROJE İÇİN AYRILAN ÖDENEK :

SON DURUM VE GÖRÜSLER :
(DPT görüşü dahil)

UYGULAYICI KURULUŞUN
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINDAN TALEBİ:

PROJE İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ YÜRÜTEN BİRİM:
(İsim, Telefon, Faks)

¹ Eğer maliyet rakamı TL cinsinden veriliyor ise, bu tutarın belirlendiği tarih ve var ise döviz kuru belirtilmelidir.

Proje Adı : Onkoloji Hastanesi Projesi

Proje Numarası : 90 I 00 1900

Kredinin Yayınlandığı
Resmî Gazete'nin Sayı ve
Tarihi

(Kredi Anlaşma Metni) : Onkoloji Hastanesi II. Etap Proje kapsamında gerçekleştirilecek makine ve teçhizat alımları Uluslararası standartlara uygun kredili olarak gerçekleştirilmesi Hazine Müsteşarlığı'nın 01.05.1998-23739 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Hazine Müsteşarlığı'nın yazı fotokopisi ekte sunulmaktadır

Krediyi Veren Ülke/Kuruluş : Makine Teçhizat alımı Uluslararası standartlara uygun kredili olarak gerçekleştirilecektir.

Kredinin Miktarı ve Türü : US\$. 28.000.000.-

Kredinin Vadesi, Faiz Oranı : İhalede sonra Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek.

Kredinin yıllara göre Döviz

Cinsinden Kullanım durumu :	1998	1999	2000	: 2001	(Bin)
	US\$.5.000.-	US\$.10.000.-	US\$.10.000.-	US\$.3.000.-	

Sn Tezer Hocam,

Ekde ABD'den sevk edilecek GE cihazlarının sevkiyat programı yer almaktadır.

Hava yolu ile sev edilecek olan MRI cihazı için (Ekli çizelgede kırmızı renkle gösterilmiştir) sevkiyat ile Ankara'ya varış tarihi arasında max 14 gün olacak ve bu süre içinde montajının yapılması gerekmektedir.

Cihazların Ankara'ya geliş tarihlerine göre yer hazırlıklarının tamam olacağı hususunu teyid etmenizi rica ederiz.

Ayrıca özellikle deniz yolu ile gelecek cihazların Ankara gümrüğüne geleceği tarih Ocak ayına sarktığı için bu cihazlarla ilgili KDV ve Gümrük vergilerinin 2008 yılına aktarılması için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla
MARUBENİ
İbrahim E. Kilic

2008 Yılı
you

List	Item List No.	Item Code	TOTAL CIF/ANK	Currency	Supplier	Despatch from
2005	1	SER1	455.520,00	USD		EXIM
2005	5	SER5	15.725,00	USD	Hill Rom Beds	EXIM
2005	11	SER11	90.090,00	USD	Hill Rom Beds	EXIM
2005	15	SER15	3.760,00	USD		EXIM
2005	31	CER15	1.502,00	USD		EXIM
2005	35	YOB1	59.360,00	USD	Hill Rom Beds	EXIM
2005	39	YOB5	10.204,00	USD		EXIM
2005	40	YOB6	72.072,00	USD		EXIM
2005	44	RUYY1	55.000,00	USD	Hill Rom Beds	EXIM
2006	50	KPT5	6.031,00	USD		EXIM
2006	53	KPT8	6.988,00	USD		EU
2006	54	KPT9	2.470,00	EUR		EU
2006	58	KPT13	4.320,00	EUR		EU
2006	60	KPT15	3.383,00	EUR		EU
2006	62	KPT17	1.210,00	EUR		EU
2006	63	KPT18	7.800,00	EUR		EU
2006	64	KPT19	43.746,00	USD		EU
2006	66	KPT21	2.767,00	EUR		EU
2006	68	KPT23	17.128,00	USD		EU
2006	72	KAB4	6.988,00	USD		EU
2005	92	ECZ3	2.470,00	EUR		EU
2006	109	ONK3	4.246,00	USD		EXIM
2006	112	ONK6	3.142,00	USD		EXIM
2006	113	ONK7	15.306,00	USD		EXIM
2006	114	ONK8	1.933,00	EUR		EU
2006	115	ONK9	732,00	EUR		EU
2006	116	ONK10	2.160,00	EUR		EU
2006	118	ONK12	6.643,00	EUR		EXIM
2006	121	ONK15	1.270,00	EUR		EU
2006	123	ONK17	3.383,00	EUR		EU
2006	126	ONK20	2.420,00	EUR		EU
2006	133	ONK27	2.767,00	EUR		EU
2006	135	ONK29/a	0,00	EUR		EU
2005	136	KIU1	43.240,00	USD	Hill Rom Beds	EXIM
2005	143	KIU8	36.036,00	USD		EXIM
2005	146	KIU11	13.638,00	USD		EU
2005	147	KIU12	5.304,00	USD		EXIM
2006	148	KIU13	68.572,00	USD	Baxler	EXIM
2005	149	KIU14	7.270,00	USD		EXIM
2005	150	TRP1	2.551.020,00	USD		EXIM
2005	151	TRP2	468.214,00	EUR		EXIM
2005	153	TRP4	397.959,00	USD		EXIM
2006	155	TRP6	306.122,00	USD		EXIM
2006	162	RAD1	218.500,00	EUR		EXIM
2006	163	RAD2	686.714,00	EUR		EXIM
2006	164	RAD3	1.248.571,00	EUR	MRi Scanner	EXIM
2006	168	RAD7	260.929,00	EUR		EXIM
2006	169	RAD8	811.572,00	EUR		EXIM
2006	170	RAD9	291.429,00	USD		EXIM
2006	171	RAD10	64.359,00	EUR		EXIM
2006	172	RAD11	49.759,63	EUR		EU
2006	173	GAS1	3.418.355,00	USD		EXIM
2006	178	NUK2	1.560.714,00	EUR		EXIM
2006	179	NUK3	170.416,86	EUR		EU

Part

Part



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ **14/3826**
Konu : **Önkoloji-Hermes Akreditif Talebi**

14/3/2007

T.C.

MERKEZ BANKASI
Ankara Kambiyo Şubesi'ne
(Dış Ticaret Servisi)

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi'nin finansmanı amacıyla temin edilen USD.3.066.061,35 ve EUR.8.665.415,10 tutarlık Hermes Garantili İhracat Kredisinden karşılanarak Marubeni Europe Plc. firmasından ithal edilecek " 171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman " tanımlı malzeme ile ilgili evraklar yazımız ekinde sunulmaktadır.

Buna istinaden , malzeme bedelinin %85'ini teşkil eden USD.3.066.061,35 ve EUR.8.665.415,10' lık tutarlara bilahare tamamlanacak olan USD.2.844.219,85 ve EUR.7.99.338.20 tutarında akreditifimizin söz konusu kredi anlaşmasının ekinde yer alan " Form of Letter of Credit " formuna uygun olarak aşağıda bilgileri kayıtlı bankaya açılması hususunda gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
REKTÖR

BANKA ADI : Citibank International PLC (ie not 'Citi Frankfurt ')
ADRES : Riverdale House , 68 Molesworth Street, Lewisham,
London SE13 7EU, UK
SWIFT KODU : CITIGB2L
CONTACTS : Tel: +44(0) 207 500 6558 Fax: +44 (0) 207 500 8063

EKLER:

- EK-1 : 1 Adet Akreditif Açtırma
Talimatı (İngilizce)
EK-2 : 2 Adet Fatura
EK-3 : Anlaşma Eki "Schedule 5 " Formu

2007 yılında
Hermes Kredisin
açılan Akreditif
yazı fotokopisi
Merkez Bankası
(171 kalem Onkoloji)



B.30.2.HAC.0.70.10.01/06-D- 577

06.04.2009

Onkoloji Hastanesi Başhekimliği'ne,

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü'nden alınan 26.03.2009 tarih ve 20 sayılı yazı ilgisi nedeni ile ekte sunulmuştur.

Gereği için bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Prof.Dr. M.Tezer KUTLUK
Hastaneler Genel Direktörü

Ek: 1 sayfa yazı ve ekleri,

2009 yılında
'Hhala + işlemleri
tamanlanan
walzemelerin ilk
tasının işlem
belge foto.

MTK/be

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

FİŞ SIRA NO:154

TARİH: 08/10/2009

İL VE İLÇENİN (1)	ADI	Hacettepe-Merkez	KODU	06.00
HARCAMA BİRİMİNİN (2)	ADI	Onkoloji Hastanesi	KODU	38.04.38.32-772
AMBARIN	ADI	Onkoloji Hastanesi	KODU	01
MUHASEBE BİRİMİNİN (3)	ADI	H.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KODU	06754

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞININ (4)	TARİHİ	05.10.2009	SAYISI	154
DAYANAĞI BELGENİN (5)	TARİHİ	18/12/2007	SAYISI	18122007
İŞLEM ÇEŞİDİ (6)	NEREDEN GELDİĞİ (7)	KİME VERİLDİĞİ (8)	NEREYE VERİLDİĞİ (9)	
SATIN ALMA	MARUBENİ EUROPE PLC			

BİRİMLER VE AMBARLAR ARASI TAŞINIR HAREKETLERİNDE				
GÖNDERİLEN HARCAMA BİRİMİ (10)	ADI		KODU	
GÖNDERİLEN TAŞINIR AMBARI (11)	ADI		KODU	
MUHASEBE BİRİMİ (12)	ADI		KODU	

T A Ş I N I R I N							
SIRA NO	KODU (13)	SICIL NUMARASI(14)	ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (KDV DAHİL)	TOPLAM TUTAR (KDV DAHİL)

1	253.03.05.18.00.00	253.03.05.18.00.00-09-000015 - 15	Radyasyon Onkolojisi Teşhis ve Tedavi Cihaz ve Aletleri (DİJİTAL TORAKS CİHAZI (RAD7))	Adet	1	478.281,62	478.281,62
						Genel Toplam	478.281,62

Yukarıda gösterilen 1 kalem, toplam 1 taşınırın GİRİŞ KAYDI YAPILMIŞTIR 09/10/2009 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Adı Soyadı: Tayfun TURAN Unvanı : Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi İmzası:	Yukarıda gösterilen kalem, toplam taşınırın ÇIKIŞ KAYDI YAPILMIŞTIR .../.../..... Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Adı Soyadı:..... Unvanı:..... İmzası:.....
TESLİM EDİLMİŞTİR 09/10/2009 TESLİM EDEN (15) Adı Soyadı: MARUBENİ EUROPE PLC Unvanı:..... İmzası:.....	TESLİM ALINMIŞTIR .../.../..... TESLİM ALAN (16) Adı Soyadı:..... Unvanı:..... İmzası:.....

TAŞINIR İCMAL CETVELİ

FİŞ SIRA NO:154

TARİH: 08/10/2009

İL VE İLÇENİN (1)	ADI	Hacettepe-Merkez	KODU	06.00
HARCAMA BİRİMİNİN (2)	ADI	Onkoloji Hastanesi	KODU	38.04.38.32-772
AMBARIN	ADI	Onkoloji Hastanesi	KODU	01
MUHASEBE BİRİMİNİN (3)	ADI	H.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KODU	06754

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞININ (4)	TARİHİ	05.10.2009	SAYISI	154
DAYANAĞI BELGENİN (5)	TARİHİ	18/12/2007	SAYISI	18122007
İŞLEM ÇEŞİDİ (6)	NEREDEN GELDİĞİ (7)	KİME VERİLDİĞİ (8)	NEREYE VERİLDİĞİ (9)	
SATIN ALMA	MARUBENİ EUROPE PLC			

BİRİMLER VE AMBARLAR ARASI TAŞINIR HAREKETLERİNDE				
GÖNDERİLEN HARCAMA BİRİMİ (10)	ADI		KODU	
GÖNDERİLEN TAŞINIR AMBARI (11)	ADI		KODU	
MUHASEBE BİRİMİ (12)	ADI		KODU	

T A Ş İ N İ R İ N			
SIRA NO	KODU (2. DÜZEY)	ADI	TOPLAM TUTAR (KDV DAHİL)

1	253.03.05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	478.281,62
		Toplam:	478.281,62

T.C.
Hacettepe Üniversitesi
Onkoloji Hastanesi

Sayı : 154


Tarih : 05.10.2009

MUAYENE KOMİSYON RAPORU

12.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine dair yönetmelik uyarınca 03.04.2009 tarih ve 20 sayılı siparişle MARUBENİ EUROPE PLC firmasından gelen EXIM18122007B no'lu faturada cins ve miktar yazılı 1 kalem malzeme komisyonumuzca muayene edilmiş olup, şartname ve sipariş niteliklerine uygundur.


KOMİSYON BAŞKANI
Prof. Dr. Şuayip YALÇIN
ONKOLOJİ HAST. BAŞHEKİMİ


ÜYE
Ertuğrul KALE
ONKOLOJİ HAST. MD.


ÜYE
Meral KIRAZLI
ONKOLOJİ HAST. MD. YRD.

Marubeni
America Corporation

For Account And Risk Of:
HACETTEPE UNIVERSITY RECTORATE
ANKARA - TURKEY

End Destination:
HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU
ANKARA - TURKEY

Invoice No.: EXIM18122007B

Date / Datum: 18th December 2007

Our Reference: HU-DEC-18-EXIM

LC Number: 49700574

EXIM BANK GUARANTEE NO. APO81558XX - TURKEY

Shipped from: NORFOLK VIRGINIA,
USA

Mode of Transport:
OCEAN CONTAINER

Contract No:

Contract Date: 02.08.2001

In respect of the above-referenced Contract signed on 02.08.2001
We hereby request you to pay the following sum to us

CORRESPONDING TO PARTIAL SHIPMENT OUT OF
SUPPLY CONTRACT DATED AUGUST 2, 2001 FOR 171 ITEMS OF MACHINERY,
MATERIAL AND EQUIPMENT (THE "CONTRACT")

Item List No.	Item Code	Description (English)	Qty	Model	Euro (€)
168	RAD7	Digital thorax equipment	1	DEFINIUM-6000	280,929.00
Total CIF ANKARA					280,929.00

EURO TOTAL

280,929.00 Euro

AMOUNT PAYABLE (UNDER LC No. 49700574)


238,789.65 Euro

[= 85% x 280,929.00 Euro]

CASH PAYMENT OF 15% HAS BEEN RECEIVED AND DEDUCTED FROM THE
GROSS INVOICE VALUE

Invoiced item(s) appear on the acquisition list approved by EXIM Bank

For and on behalf of
Marubeni America Corporation



Telecom & Information Department
Transportation, Industrial Machinery & Information Business Unit



Sayı: B.30.2.HAC.0.73.03.00/

2011 yılında
ilk kesin kabul
yapılan malzeme
belgelerin fot.

KESİN KABUL PROTOKOLÜ

Üniversitemiz 1990/001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslararası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere Marubeni Europe Plc. firmasından **USD.12.316.800. ve EUR.16.000.000.** bedelle satın alınan **"171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman"** tanımlı malzemenin garanti süreleri dolmuştur.


İta Amirliği'nin 24/08/2011 tarih ve 08 sayılı onayı ile oluşturulan Komisyonumuz 05/09/2011 günü saat 10.30'da toplanarak söz konusu ilgili sözleşme, şartname ve eklerinde gösterilen nitelik ve miktarlardaki malzemelerin garanti süresi sona ermiş olduğundan Kesin Kabulünün yapılmasına karar vermiştir.

Bedeli : EUR.565.688,00

Firması : Marubeni Europe Plc. Dusseldorf Branch


Malzeme Adı : 1 Adet Daylight banyo cihazı (S.No.160) 1 Adet Daylight banyo cihazı (S.No.167)


Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Şuayib YALÇIN
Onkoloji Hastanesi Başhekim


Uzman Üye
Prof. Dr. Macit ARIYÜREK
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı


Uzman Üye
Prof. Dr. Meltem CAĞLAR TUNCALI
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı


Üye
Meral KIRAZLI
Onkoloji Hastanesi Müdürü


Üye
Yücel DENİZ
Onkoloji Hastanesi Müdür Yrd



Hacettepe

HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ

Erişkin Hastanesi
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
Onkoloji Hastanesi



Sayı: B.30. 2. HAC.0. H3.00.00- 1244

22.08.2011

Hacettepe Üniversitesi

Hastaneler Genel Direktörlüğü'ne,

Onkoloji Hastanesi'ne dış kredili alımla temin edilen 171 kalem malzemeden ekte listesi verilen geçici kabulleri yapılmış malzemelerin aşağıda isimleri verilen komisyonca 30.08.2011 tarihi itibarıyla kesin kabullerinin yapılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Şuayib YALÇIN

Onkoloji Hastanesi Başhekimisi

Adı Soyadı

Prof. Dr. Şuayib YALÇIN

Prof. Dr. Macit ARİYÜREK

Prof. Dr. Meltem ÇAĞLAR TUNCALI

Meral KİRAZLI

Yücel DENİZ

Görevi

Onkoloji Hastanesi Başhekimisi

Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Onkoloji Hastanesi Müdürü

Onkoloji Hastanesi Müdür Yardımcısı

Ek : 1

MK/mb

LİSTE NO	KOD	CİHAZ ADI
160	TRP11	Daylight banyo cihazı
167	RAD6	Daylight banyo Cihazı



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SERMAYE GİDERLERİ
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: 0 (312) 305 1034-2333 • Faks: 0 (312) 311 4390
E-posta: imidb@hacettepe.edu.tr
www.imidbhacettepe.edu.tr

Sayı: B.30.2.HAC.0.73.03.00/

REKTÖRLÜK MAKAMI'NA

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslararası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere Marubeni Europe Plc. firmasından **USD.12.316.800. ve EUR.16.000.000.** bedelle satın alınan **"171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman"** tanımlı malzemelerden ekli listede sıra numaraları, adedi ve tutarı verilen cihazların garanti süreleri dolmuştur.

Söz konusu cihazların Kesin kabul işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda adı soyadı ve görev ünvanı yazılı kişilerin görevlendirilmeleri hususunda olurlarınızı saygılarımla arz ederim.

Mehmet KAYA
İdari ve Mali İşl.Dai.Bşk.V.

UYGUNDUR
24/08/2011

Prof.Dr. Uğur ERDENER
REKTÖR

Prof. Dr. Şuayib YALÇIN
Onkoloji Hastanesi Başhekimisi
Prof.Dr.Macit ARIYÜREK
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Meltem ÇAĞLAR TUNCALI
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Meral KİRAZLI
Onkoloji Hastanesi Müdürü
Yücel DENİZ
Onkoloji Hastanesi Müdür Yrd.



B.30.2.HAC.0.HD.00.00/D- 1688


08.07.2011

**İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü'ne,**

İlgi: 04.07.2011 tarih ve 80 sayılı yazınız.

İlgi yazınız Onkoloji Hastanesi Başhekimliği tarafından incelenerek cevap yazıları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.


Prof.Dr. M.Tezer KUTLUK
Hastaneler Genel Direktörü

Ek: 1 sayfa yazı,

Kesin kabulü
yapılan malzeme
teminat iadesi
için yazılan yazı
ve cevabını
gösteren belgeler

MTK/be



Sayı: B.30.2.HAC.0.73.03.00/ 80

04/07/2011

HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ'NE

İlgi : Marubeni Europe plc firmasının 30.06.2011 tarih ve AIBU-2011/039 sayılı yazısı

Üniversitemiz **Onkoloji Hastanesi Projesi** (II.kısım) kapsamında 02.04.2001 tarihinde Marubeni Europe plc firmasından **USD.12.316.800** ve **EUR.16.000.000** bedelle satın alınmasına karar verilen "**171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman**" tanımlı malzemelerin ithalat işlemleri 24/12/2009 tarihinde tamamlanmıştır.

İthalatı tamamlanan malzemelerle ilgili olarak, Marubeni Europe plc firması'ndan alınan ilgi yazı ile Geçici kabulleri yapılmış olan cihazların garanti sürelerinin sözleşmede belirtilen iki yıllık süreyi doldurduğu ve bu süresi dolan cihazlar ile ilgili kesin kabul işlemlerinin yapılarak bakiye kalan %50 kesin teminatlarının serbest bırakılmasını istemektedir.

Marubeni Europe Plc firması'na verilecek cevaba ve kesin kabul işlemlerinin başlatılabilmesi için görüşlerinizin yapılacak işleme esas olmak üzere Başkanlığımıza bildirilmesi hususunu saygılarımla arz ederim.


Ecz. M. Nejat ERTÜRK
İdari ve Mali İşl. Dai. Bşk.

Eki : Marubeni Europe plc firma yazı fotokopisi

Memor	04741	04
Ş o f		
Şb. Md.		
Başkan Yrd.		
Başkan		
Gen. Sek.		



MARUBENI CORPORATION JAPAN
130 OFFICES AND SUBSIDIARY COMPANIES
THROUGHOUT THE WORLD

A SUBSIDIARY OF MARUBENI CORPORATION

DDI TEL: (020) 7826 8600
FAX: (020) 7826 9611

TOKYO HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 571 TOKYO

OSAKA HEAD OFFICE
P.O. BOX CENTRAL 1006 OSAKA

RIVER PLATE HOUSE
7-11 FINSBURY CIRCUS
LONDON EC2M7AF

30. Haziran.2011 / AIBU - 2011 / 039

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER İŞLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK - ANKARA

Konu : Kesin teminat mektubu iade talebi.
İlgil:

İdarenizin 21.02.2001 tarihinde ihalesini yaptığı "171 Kalem Makine, Malzeme ve Gerekli Ekipman" ihalesi için firmamız ile kurumunuz arasında 02.08.2001 tarihinde sözleşme imzalanmış ve kurumunuza bir tanesi 960.000,00 € (Y.Dokuzyüzaltmışbin Avro) luk ve diğeri 739.008,00 USD (Y.Yediyüzotuzdokuzbinsekiz AmerikanDoları) lik olmak üzere iki adet kesin teminat mektubu verilmiştir.

İdareniz ile firmamız arasında imzalanan sözleşmenin katı teminat ile hükümlerin belirtildiği 6. maddesinde, aynı sözleşmenin 12. maddesinde belirtilen hükümlere göre kabul işlemleri tamamlanan ürünler için kesin teminatın iade edileceği belirtilmektedir.

Yine, adı geçen ihaleye ait idari şartnamenin kesin teminatın iadesi ile ilgili 18. maddesinde, kesin teminat tutarının % 50 sinin geçici kabul sonrasında, % 50 sinin ise kesin kabul sonrasında teslim edileceği belirtilmektedir.

Sözleşmenin 12. maddesi hükümlerine göre idarenizden Geçici Kabul Belgeleri alınmış olan 2.285.300,00 USD (Y.İkimilyonikiyüzseksenbeşbinüçyüz AmerikanDoları) ve 1.840.217,00 € (Y.Birmilyonsekizyüzkırkbinikiyüzonyedi Avro) luk 89 kalemlik liste yazımız ekinde dir.

Bu durumda adı geçen 89 kalemlik liste tutarına isabet eden 68.559,00 USD (Y.Altmışsekizbinbeşyüzellidokuz AmerikanDoları) lik ve 55.206,51 € (Y.Elibeşbinikiyüzaltı Avro Ellibir Sent) lik bakiye % 50 tutarların ilgili Kesin Teminat Mektubu tutarlarından tenzil edilmesi için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,


MARUBENI Europe Plc. adına
I. E. KILIÇ

EK: Garanti süreleri dolan kalemlere ait liste.



Hacettepe

HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ

Erişkin Hastanesi
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
Onkoloji Hastanesi



Sayı: B.30.2.HAC.0.H3.00.00- 953

05.07.2011

Hacettepe Üniversitesi
Hastaneler Genel Direktörlüğü'ne,

İlgi : 05.07.2011 tarih ve B.30.2.HAC.0.HD.00.00/D-1639 sayılı yazınız

Onkoloji Hastanesi "171 Kalem Makine,Malzeme ve Gerekli Ekipman" ihalesi kapsamında alımı yapılan ekte listesi sunulan geçici kabulleri yapılmış 89 kalem makine,malzeme ve ekipmanın kesin kabullerinin yapılarak bakiye kalan % 30 kesim teminatlarının serbest bırakılması hususunda bilgilerinizi ve gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Gül KARAKAYA
Onkoloji Hastanesi Başhekim V.

YD/zg

B.30.2.HAC.0.HD.00.00/D- 2008

22.08.2011

**İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü'ne,**

Onkoloji Hastanesi Başhekimliği'nden alınan 22.08.2011 tarih ve 1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246 sayılı yazılar ilgisi nedeni ile ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.



Prof.Dr. Mustafa N.ÖZMEN
Hastaneler Genel Direktör V.

Ek: 20 sayfa yazı,

MNÖ/be



**HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ**

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.10.15-D-1

2007 yılında
ilk Geçici
Kabulü yapılan
malzemenin
belge fotokopisi

• Erişkin Hastanesi
acı Çocuk Hastanesi
Onkoloji Hastanesi

27.11.2007

**Hacettepe Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı**

Onkoloji Hastanesi'ne dış kredili alımla temin edilen 171 kalem malzemedan aşağıda kodu, adı ve adedi bildirilen malzemeler teslim edilmiş ve yine aşağıda belirtilen tarihlerde kurulumları yapılmıştır.

Bilgilerinizi ve malzemelerin geçici kabullerinin yapılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Ertuğrul KALE ,
Onk.Hast.Müdür Yrd.

<u>Kodu</u>	<u>Malzemenin Adı</u>	<u>Adet</u>	<u>Kurulum Tarihi</u>
KPTT ONK 14	Derin Dondurucu(-86)	3	03.10.2007
ONK 13	Laminar Hood	4	11.10.2007
KIU 9	Diyaliz Makinesi	1	21.11.2007

MK/mb



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/
Konu :

... / ... /

REKTÖRLÜK MAKAMI'NA

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslar arası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere Marubeni Europe Plc. firmasından **USD.12.316.800.- ve EUR.16.000.000.** bedelle satın almasına karar verilen “ **171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman** “ tanımlı malzemelerden **EUR.175.356.00** tutarında ithalat işlemleri tamamlanan 119 sırada **4 Adet Laminar Hood, 144 sırada 1 Adet Dialysis equipment, 120 sıradaki 3 Adet Deep freezer,-86C** tanımlı sözleşme eki malzemelerin sıra numaraları ve adetleri verilen malzemelerin montaj ve deneme işlemleri tamamlanmış olup, Muayene ve kabule hazır hale getirilmiştir

Söz konusu malzeme ve ekipmanların Muayene ve kabul işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda adı soyadı ve görev ünvanı yazılı elemanların görevlendirilmeleri hususunda olurlarınızı saygılarımla arz ederim.

Ecz.M.Nejat ERTÜRK
İda.Mali.İşl.Dai.Bşk.

UYGUNDUR
02/10/2007
Prof.Dr.Tunçalp ÖZGEN
REKTÖR

Prof.M.Tezer KUTLUK
Onkoloji Hastanesi Başhekimi
Prof.Dr.Şuayib YALCIN
Onkoloji Hastanesi Başhekim Yrd.
Prof.Dr.Faruk ZORLU
Radyasyon Onk.ABD.Başkanı
Mak.Müh.M.Sabri ÜSTÜN
Yapı İşl. Tek.Dai.Bşk.Yrd.
Ertuğrul KALE
Onkoloji Hast.Müd.Yrd.



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

**İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü**

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/
Konu :

... / ... /

MUAYENE VE KABUL PROTOKOLÜ

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslar arası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere Marubeni Europe Plc. firmasından **USD.12.316.800.- ve EUR.16.000.000.** bedelle satın almasına karar verilen **"171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman"** tanımlı malzemelerden ithalatı tamamlanan **EUR.90.000.00** tutarındaki **"Deep freezer,-86C"** tanımlı malzemenin montaj ve deneme işlemleri tamamlanmış olup, Muayene ve kabule hazır hale getirilmiştir.

İta Amirliği'nin 02.10.2007 tarih ve 03 sayılı onayları ile oluşturulan Komisyonumuz 03.10.2007 günü, saat 14.00'de toplanarak söz konusu malzemelerin ilgili sözleşme, şartname ve eklerinde gösterilen nitelik ve miktarlarda eksiksiz ve kusursuz olarak hazır olduklarını, montajlarının yapılarak tüm fonksiyonları ile çalışır durumda teslim edildiğinden Muayene ve Kabulünün yapılmasına karar vermiştir.

Bedeli : EUR.90.000.00

Firması : Marubeni Europe Plc. Dusseldorf Branch

Malzeme Adı : Deep freezer,-86C 3 Adet (Malzeme sıra nosu 120)

**Komisyon Başkanı
Prof.M.Tezer KUTLUK
Onkoloji Hastanesi Başhekim**

**Uzman Üye
Prof.Dr.Şuayib YALCIN
Onkoloji Hastanesi Başhekim Yrd.**

**Uzman Üye
Prof.Dr.Faruk ZORLU
Radyasyon Onk.ABD.Başkanı**

**Üye
Mak.Müh.M.Sabri ÜSTÜN
Yapı İşl. Tek.Dai.Bşk.Yrd.**

**Üye
Ertuğrul KALE
Onkoloji Hast.Müd.Yrd.**



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/

Konu :

.../.../.....

MUAYENE VE KABUL PROTOKOLÜ

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslar arası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere Marubeni Europe Plc. firmasından **USD.12.316.800.- ve EUR.16.000.000.** bedelle satın almasına karar verilen “ **171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman** ” tanımlı malzemelerden ithalatı tamamlanan **EUR.29.800.00** tutarındaki “**Dialysis equipment**” tanımlı malzemenin montaj ve deneme işlemleri tamamlanmış olup, Muayene ve kabule hazır hale getirilmiştir.

İta Amirliği'nin 02.10.2007 tarih ve 03 sayılı onayları ile oluşturulan Komisyonumuz 21.11.2007 günü, saat 14.00'de toplanarak söz konusu malzemelerin ilgili sözleşme, şartname ve eklerinde gösterilen nitelik ve miktarlarda eksiksiz ve kusursuz olarak hazır olduklarını, montajlarının yapılarak tüm fonksiyonları ile çalışır durumda teslim edildiğinden Muayene ve Kabulünün yapılmasına karar vermiştir.

Bedeli : EUR.29.800.00
Firması : Marubeni Europe Plc. Dusseldorf Branch
Malzeme Adı : Dialysis equipment 1 Adet (Malzeme sıra nosu 144)

Komisyon Başkanı
Prof.M.Tezer KUTLUK
Onkoloji Hastanesi Başhekim

Uzman Üye
Prof.Dr.Şuayib YALCIN
Onkoloji Hastanesi Başhekim Yrd.

Uzman Üye
Prof.Dr.Faruk ZORLU
Radyasyon Onk.ABD.Başkanı

Üye
Mak.Müh.M.Sabri ÜSTÜN
Yapı İşl. Tek.Dai.Bşk.Yrd.

Üye
Ertuğrul KALE
Onkoloji Hast.Müd.Yrd.



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

**İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü**

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/
Konu :

... / ... /

MUAYENE VE KABUL PROTOKOLÜ

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslar arası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere Marubeni Europe Plc. firmasından USD.12.316.800.- ve EUR.16.000.000. bedelle satın almasına karar verilen “ 171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman “ tanımlı malzemelerden ithalatı tamamlanan EUR.55.556.00 tutarındaki “Laminar Hood” tanımlı malzemenin montaj ve deneme işlemleri tamamlanmış olup, Muayene ve kabule hazır hale getirilmiştir.

İta Amirliği'nin 02.10.2007 tarih ve 03 sayılı onayları ile oluşturulan Komisyonumuz 11.10.2007 günü, saat 14.00'de toplanarak söz konusu malzemelerin ilgili sözleşme, şartname ve eklerinde gösterilen nitelik ve miktarlarda eksiksiz ve kusursuz olarak hazır olduklarını, montajlarının yapılarak tüm fonksiyonları ile çalışır durumda teslim edildiğinden Muayene ve Kabulünün yapılmasına karar vermiştir.

Bedeli : EUR.55.556.00
Firması : Marubeni Europe Plc. Dusseldorf Branch
Malzeme Adı : Laminar Hood 4 Adet (Malzeme sıra nosu 119)

Komisyon Başkanı
Prof.M.Tezer KUTLUK
Onkoloji Hastanesi Başhekimi

Uzman Üye
Prof.Dr.Şuayib YALCIN
Onkoloji Hastanesi Başhekim Yrd.

Uzman Üye
Prof.Dr.Faruk ZORLU
Radyasyon Onk.ABD.Başkanı

Üye
Mak.Müh.M.Sabri ÜSTÜN
Yapı İşl. Tek.Dai.Bşk.Yrd.

Üye
Ertuğrul KALE
Onkoloji Hast.Müd.Yrd



T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ (DEVAM FORMU)

Seri : VA

A GRIS ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ

0701109

2 Gönderen (Ticarati)

İla

MARUBENİ AMERICA CORPORATION
375 LEXINGTON
NEW YORK 10017-5644 400

1 BEYAN

D

KDR

ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.
09060200IM004725

3 Formlar

2 2

3 8

31 Yapanın ve eşyanın tanımı

Kıtların ve konteynerlerin marka numara ve onları

32 Kalem no

2 2

33 TGTC pozisyon no

90272000

00

80

3 kap 2 adet (unit)

Markası: adı-Numarası: 15/01/2009

Tarife tanımı: fiziksel ve kimyasal analizler için alet ve cihazlar alımlarını gösteren belgeler
 gıdaları, yiyecek ve içecekler, tıbbi ve veteriner ilaçları, kimyasal maddeler, tekstil ve deri ürünleri, diğer malzeme ve ekipmanlar

Ticari tanımı: kronometre ve elektroforez cihazları

44 Ek bilgi, belge ve diğer

Orjinal Fatura V
 Banka Yazısı Y

34 Menşe Ülk. kodu

a) 400 b) 0

35 Brüt ağırlık (kg)

232.00

36 Terahertz

37 REJİM

40 00

38 Net ağırlık (kg)

225.00

39 Kats

40 Manifesto Özel beyan

41 Ölçü birimi

2 ADET(UNIT)

42 Kalem fiyatı

18,448.00

43 Kats

E.B. Kodu

45 Ayrıntı

46 İstatistik kayıtları

18,448.00

31 Kiplerin ve eşyanın tanımı

Kıtların ve konteynerlerin marka numara ve onları

32 Kalem no

3 1

33 TGTC pozisyon no

84184080

00

00

3 kap 1 adet (unit)

Markası: adı-Numarası: 15/01/2009

Tarife tanımı: dikey tip dondurucular hacmi 900 litreyi geçmeyen hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler

Ticari tanımı: hastane için dondurucular

44 Ek bilgi, belge ve diğer

Orjinal Fatura V 09/12/2008-EXIM09122008C
 Banka Yazısı V 11/02/2009
 San. Ve Tic. Bakanlığı adına TSE Uygunluk Yazısı V 13/03/2009-94347

34 Menşe Ülk. kodu

a) 400 b) 1

35 Brüt ağırlık (kg)

76.00

36 Terahertz

37 REJİM

40 00

38 Net ağırlık (kg)

70.00

39 Kats

40 Manifesto Özel beyan

41 Ölçü birimi

1 ADET(UNIT)

42 Kalem fiyatı

6,031.00

43 Kats

E.B. Kodu

45 Ayrıntı

46 İstatistik kayıtları

6,031.00

31 Kiplerin ve eşyanın tanımı

Kıtların ve konteynerlerin marka numara ve onları

32 Kalem no

3 1

33 TGTC pozisyon no

84184080

00

00

3 kap 1 adet (unit)

Markası: adı-Numarası: 15/01/2009

Tarife tanımı: dikey tip dondurucular hacmi 900 litreyi geçmeyen hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler

Ticari tanımı: hastane için dondurucular

44 Ek bilgi, belge ve diğer

Orjinal Fatura V 09/12/2008-EXIM09122008C
 Banka Yazısı V 11/02/2009
 San. Ve Tic. Bakanlığı adına TSE Uygunluk Yazısı V 13/03/2009-94347

34 Menşe Ülk. kodu

a) 400 b) 1

35 Brüt ağırlık (kg)

76.00

36 Terahertz

37 REJİM

40 00

38 Net ağırlık (kg)

70.00

39 Kats

40 Manifesto Özel beyan

41 Ölçü birimi

1 ADET(UNIT)

42 Kalem fiyatı

6,031.00

43 Kats

E.B. Kodu


45 Ayrıntı

46 İstatistik kayıtları

6,031.00

47 Vergilerin hesaplanması

Türü	Vergi matrahı	Oranı	Tutarı	ÖS	Türü	Vergi matrahı	Oranı	Tutarı	ÖS
10		% 0.00	0.00	P	10		% 2.20	214.77	P
40		% 18.00	5,721.92	P	40		% 18.00	2,037.18	P
					52		% 6.70	710.67	F
Bazı kalemler için toplam			5,721.92		Kısmi kalemler için toplam			2,962.62	
Türü	Vergi matrahı	Oranı	Tutarı	ÖS	Türü	Tutarı	ÖS	Özet	
					10	331.61		3	
					40	9,103.19		8	
					52	710.67		8	
					89	33.90		8	
Üçüncü kalemler için toplam					Genel T			10,179.37	



Marubeni
America Corporation

For Account And Risk Of: HACETTEPE UNIVERSITY RECTORATE ANKARA -TURKEY End Destination: HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU ANKARA-TURKEY		Invoice No.: EXIM09122008C Date / Datum: 9 th December 2008 Our Reference: HU-DEC-08-EXIM LC Number: 49700575 EXIM BANK GUARANTEE NO. APO81558XX - TURKEY	
Shipped from: NORFOLK VIRGINIA, USA	Mode of Transport: OCEAN CONTAINER	Contract No:	Contract Date: 02.08.2001

In respect of the above-referenced Contract signed on 02.08.2001
We hereby request you to pay the following sum to us

CORRESPONDING TO PARTIAL SHIPMENT OUT OF
SUPPLY CONTRACT DATED AUGUST 2, 2001 FOR 171 ITEMS OF MACHINERY,
MATERIAL AND EQUIPMENT. (THE "CONTRACT")

Acquisition List No	Item List No	Item Code	Desc (English)	Qty	Model	No. Pcs	USD
12	50	KPT5	Deep Freezer,	1	ULT-1340-9V	1	6,031.00
14	109	ONK3	Integrated gel vacuum drying system	1	SG210D-230 +A1	2	4,246.00
14	112	ONK6	Sub-gel electrophoresis system	1	P62 + EC1000XL2		3,142.00
14	113	ONK7	DNA electrophoresis system and power supply	1	S3S + EC3000XL2		15,306.00
Total: OIP Ankara							28,725.00

USD TOTAL

USD28,725.00

AMOUNT PAYABLE (UNDER LC No. 49700575)

USD 24,416.25

[= 85% x 28,725.00USD]

CASH PAYMENT OF 15% HAS BEEN RECEIVED AND DEDUCTED FROM THE GROSS INVOICE VALUE

Invoiced item(s) appear on the acquisition list approved by EXIM Bank

For and on behalf of
Marubeni America Corporation

[Authorized Signature]

RESMİ KULLANIMA MAHSUS

		Eşya No	Eşya No	Eşya No
		G.T.P.	841939900000	
A. Kıymetli Hesabın Temel Unsuru	11. (a) Deviz cinsine göre tutulmuş yer alan net SATIŞ FİYATI (gümrük kıymetinin tespiti anında gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat) (b) Dolaylı Ödemeler (Bkz. 8 (b)) (Deviz Kuru : 1.618/28.725)			
B. İLAVELER Yukarıda (A) ya ilave edilmiş TL cinsinden maliyet unsurları(*)	12. TOPLAM (A) (TL Olarak) 46.498			
Bu konuda Gümrük İdari Hukuk Önceden Verilmiş Bir Karar Var mı? Belirli	13. Alıcı tarafından üslenilen giderler (a) Satınalma komisyonları dışındaki komisyonlar (b) Telaliye (c) Kap ve Ambalaj Bedeli			
	14. İthal eşyasının üretiminde ve ihrac amacıya satışta kullanılmak üzere alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatı dahil edilmemiş olan aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin kıymetlerinden yeriyecek uygun miktardaki pay. (a) İthal eşyasına kolliyan matizeme, oksam, polya ve benzerleri (b) İthal eşyasının üretim sürecinde kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler (c) İthal eşyasının üretim sürecinde tüketilen maddeler (d) İthal eşyasının üretim için gereken ve İthal ülke dışında üretilen mühendislik, geliştirme, sanayi ve çizim çözümleri, plan ve testler hazırlama hizmetleri (e) Royalti ve lisans ücretleri (Bkz. 9 (a))			
	15. İthal eşyasının tek bir satış ve diğer herhangi bir şekilde elden çıkarılması kapsamında sağlanan hasatının bir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak satışa ilişkin maliyetleri (Bkz. 9 (b))			
	16. (a) İthal eşyasının giriş liman veya mahalline kadar yapılan (i) Nakliye (ii) Boşaltma ve eleştirme giderleri (b) Sigorta giderleri			
	17. TOPLAM (B)			
	18. TOPLAM (B)			
	19. Varsa İthal eşyası için giriş mahallinden sonra yapılan nakliye giderleri			
	20. Varsa İthal eşyası için İthalattan sonra yapılan İnşaat, kurma, montaj, bakım ve teknik yordama ilişkin giderleri			
	21. Varsa diğer ödemeler (3.000.000 YTL) (Nitelikli belgelendirme)			
	22. Eşyanın, İthalat veya satış nedeniyle Türkiye'de ödenecek gümrük vergileri, ile diğer vergi, harç ve fonlar			
	23. TOPLAM (C)			
	24. BEYAN EDİLECEK KİYMET (A+B-C) 50.574			

(*) Söz konusu maliyet unsurları deviz cinsinden belirtilmiş veya ödenecek ise, 11 maddede belirtilen kur üzerinden, her bir eşya için TL'ye çevirmek suretiyle beyan ediniz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION



INSTITUT TURC DE NORMALISATION

ANKARA GÖZETİM VE MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: B.14.2.TSE.0.15.01.00-94847

13/03/2009

Konu: Uygunluk Yazısı

ANK/GY/00085

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAMAN PAZARI ANILARA

İlgi: 19.02.2009 tarihli ve 51941 kayıt no'lu başvurunuz.

İthalat yapılmak üzere tarafımızca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, "4703 sayılı Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" hükümleri saklı kalmak kaydıyla örneklemeye usulü ile yapılan uygunluk değerlendirilmesine istinaden 2009/9 sayılı DTS Tebliği çerçevesinde ithalatı uygundur.

Bilindiği üzere, 4703 sayılı Kanun gereğince piyasaya arz edilecek ürünlerin güvenli olması zorunlu olup, bundan ithalatçı sorumludur. Üretici Kanununda, "Bir ürünü üreten, imal eden, işlah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi, üretimin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlanmaktadır. Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince ürünün teknik piyasada denetimine tabi tutulabileceği, mevzuatına uygun olmaması halinde ilgili mevzuat gereğince yaptırımlar uygulanabileceğinin hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Arşiv Numarası 339

Ankara Gözetim-Muayene Müdürü

<u>Belge Cinsi</u>	<u>Belge Tarihi</u>	<u>Belge No</u>	<u>Fatura Tarihi</u>	<u>Fatura No</u>	<u>Gümrük</u>
Özel Beyan	15.01.2009	100	09.12.2008	EXM08122008C	ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
<u>Model Numarası</u>	<u>Miktar</u>	<u>G.T.P.</u>			
ULT1343-9-V	1 Adet	8418.40 80.00.99			



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

Tarih : 17.03.2009
Sayı : B.30.2.HAC.0.17.19.00 /100 /190
Konu :

ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ANKARA

İlgi: 16.03.2009 tarih ve 13 sayılı yazınız.

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi (II. kısım) kapsamında Marubeni Europe Plc. firmasından satın alınmasına karar verilen “171 kalem makine, malzeme ve ekipman” tanımlı malzemelerden , Deep Freezer (Derin Dondurucu) , tanımlı malzemenin Esenboğa Gümrük Müdürlüğüne geldiği öğrenilmiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının İlgi yazısının ekinde bulunan cihazların katoloğunun incelenmesi sonucunda “DIN 1946 Bölüm 4” normlarına uygun olarak imal edildiği anlaşılmış ve üretilen bu cihazlarda ozon tabakasını inceltici gazlardan atmosfere salınması sakıncalı olan Flora Kloro Karbon gazlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Tülay DURUSOY
Bölüm Başkanı
Kimya Mühendisliği Bölümü

2 2

2 84193990 00 00

3 kap 1 adet(unit)

Markası: -Numarası: TPA081202911

Tarife tanımı: ısı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, demitme, reküfiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondense etme veya soğutma gib
i) maddelerin işlenmesi için makineler ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtma elekt

Ticari tanımı: laboratuvar cihazları(kurutucular)

Orijinal Fatura V

1 ADET(UNIT)

400

53.50

TR IM

53.50

4,246.00

4,246.00

3 90272000 00 00

3 kap 2 adet(unit)

Markası: -Numarası: TPA081202911

Tarife tanımı: fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahvil cihazları) akışkanlığın gözetekliliği, genleşmeyi, yüzey geni
limini veya berraklığını ölçmeye veya mneyemeye mahsus alet ve cihazlar ısı, ışık ve ses

Ticari tanımı: kromatografiler ve elektroforez cihazları

Orijinal Fatura V

2 ADET(UNIT)

18,448.00

400

232.47

TR IM

232.47

18,448.00

10
40

% 1.70
% 18.00

113.66
1,223.89

C 10
C 40

% 0.00
% 18.00

0.00
5,228.68

C
C

1,337.55

5,228.68

10
40
52
89

322.58
8,323.09
652.53
33.90

9,332.10

2. Beyan Sahibi Tescil No:		3. Beyan Türü		2. GÜMRÜK İDARESİ			
09860200RL000100		TETKİM		a) Tescil No. : 09860200RL000100			
4. Ek Belge		3. Formlar		b) Tescil Tarihi : 15/01/2009			
		2.		c) Referans :			
5. Taahhüt Adı/Cinsi				060200 ESENBOĞA GÜMRÜK MÜD.			
6. Taahhüt Kayıt Olduğu Ülke				U52			
7. Taahhüt Firması				ARKAS ULASTIRMA A.Ş.			
8. Taahhüt Plakası/Sefer No.				34GR4641			
9. Çıkış Yeri				10. Varış Yeri			
11. Çıkış Tarihi				12. Gelis Tarihi			
				15/01/2009			
Sıra No.	13. Taahhüt Senedi	14. Kapağın Tanımı		15. Eşyanın Tanımı		16. a) Gönderen b) Gönderilen	17. TCGB Tescil No.
		Adedi	Cins	Marite ve No'su	Cins	Brüt Ağ.	
	09860200RL000100	3	RI ADP		LARAKATLAR CHAZ	36192	MARITIME
	30				LARI		HACETTEPE UNIVERSITE
		3				36192	3

B. GÜMRÜK İDARESİ KAYITLARI

10. Boyan Gahibinin veya Vekilinin
Adı, Soyadı ve imzası

KEMAL KARATAS

Vertrag Vergis:
Vertrag:

00/5

Shipper:

MARUBENI AMERICA CORPORATION
375 LEXINGTON AVENUE NEW YORK,
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA
TEL: 212-450-0454 /
FAX: 212-450-0796



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

B/L-No.:

Page:

15134751

HLCTPA081202911

2 / 6

Export References:

01NYOI08602465 EXIM09122008C

C. H. B. NO: 1255

Forwarding Agent:

F. M. C. NO: 3778

MARUBENI TRANSPORT SERVICE CORP.
375 LEXINGTON AVE
NEW YORK, NY 10017

Consignee's Reference:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

TO ORDER OF
HACETTEPE UNIVERSITY RECTORATE

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

1. MARUBENI CORPORATION, ANKARA
ATTN: IBRAHIM KILIC,
FAX#: 90 312 468 2180

Place of Receipt:

ASHEVILLE, NC

Vessel(s):

Voyage-No.:

CHARLESTON EXPRESS

60E48

Place of Delivery:

ANKARA, TURKEY

Port of Loading:

NORFOLK, VA

Port of Discharge:

ANTWERP

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

AES-ITN: X20081205007755

ALSO NOTIFY:

2. INCEKARA A.S.
ATTN: AYLIN KIZIDAG,
FAX#: 90 312 295 2500

CONTAINER#/SEAL#

1 CONT. 20' X8' 6" GENERAL PURPOSE CONT. SLAC*

TCKU2781310/7519106

3 PACKAGES OF MEDICAL EQUIPMENT

798 LBS

SUPPLY CONTRACT DATED AUGUST 2,
2001 FOR 171 ITEMS OF MACHINERY,
MATERIAL AND EQUIPMENT
(THE "CONTRACT")

*SLAC = SHIPPER'S LOAD, STOW, WEIGHT AND COUNT

SHIPPED ON BOARD, DATE: DEC/09/2008

PORT OF LOADING: NORFOLK, VA

VESSEL NAME CHARLESTON EXPRESS

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

Currency:

FCL/FCL

USD

Charge

Rate

Basis

W/V

Val

P/C

Amount

Ecz. M. Nejat ERTURK
Idari ve Mali İşler Dai. Bşk.

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility
or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

ORIGINAL

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt to the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of Issue:

TAMPA, FL

DEC/16/2008

Freight payable at:

Number of original B/L:

2/3

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

6379.16

6379.16

AS CARRIER HAPAG-LLOYD USA, LLC

Shipper:



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: B/L-No.:

Page:

HLCITPA081202911 3 / 6

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

Place of Delivery:

Port of Loading:

Port of Discharge:

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

FREIGHT PREPAID

THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE WERE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED. NLR EXPORT LICENSE #: NLR

TURKEY CLAUSE

DEMURRAGE CLAUSE

- GENERALS -

FIRST 10 DAYS (SSHINC) *

FREE

NEXT 10 DAYS (SSHINC) *

USD 8,00/TEU/DAY

NEXT 20 DAYS (SSHINC) *

USD 16,00/TEU/DAY

THEREAFTER

USD 24,00/TEU/DAY

SPECIALS (NOT REEFER) TO ADD 100 PCT ON GENERALS

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

Currency:

Charge Rate

Basis

W/Vol/Val

P/C

Amount

Ecz. M. Nejat ERTÜRK
İdari ve Mali İşler Bşk.

(Signature)

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF, the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of Issue:

Freight payable at:

Number of original Bs/L:

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

(Signature)

Shipper:



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: B/L-No.:

Page:

HLCUTPA081202911 4 / 6

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

Place of Delivery:

Port of Loading:

Port of Discharge:

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

- REEFERS -
FREE
FIRST 3 DAYS (SSHINC) *
NEXT 10 DAYS (SSHINC) * USD 35,00/TEU/DAY
THEREAFTER USD 70,00/TEU/DAY

*) SSHINC = SATURDAYS, SUNDAYS RESP. WEEKEND RESTDAYS AND OFFICIAL
HOLIDAYS INCLUDED.

THE DEMURRAGE PERIOD TO COUNT FROM THE DAY OF DISCHARGE UNTIL
THE DAY ON WHICH THE CONTAINER(S)
BEING RETURNED TO THE CARRIER'S TERMINAL EMPTY

PORT STORAGE TO BE SETTLED BY RECEIVER DIRECTLY WITH LOCAL AUTHORITIES
AS PER COUNTRY REGULATIONS.

REEFER PLUG-IN, MONITORING AND ELECTRICITY COSTS TO BE SETTLED BY
RECEIVER DIRECTLY WITH LOCAL AUTHORITIES AS PER COUNTRY
REGULATIONS.

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

Currency:

Charge Rate Basis W/Vol/Vol P/C Amount

Ez. M. Nejat ERTÜRK
İdari ve Mali İşler Dai Bşk.

M. Nejat Ertürk

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility
or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted
herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite
entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and
conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port
of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable.
One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in
exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts
and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated,
notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has
been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of Issue:

Freight payable at:

Number of original B/Ls:

Nejat Ertürk

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Carrier: Hapag-Lloyd USA, LLC, Tampa

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Shipper:



Carrier's Reference: B/L-No.:

Page:

HLCTTPA081202911

5 / 6

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

Place of Delivery:

Port of Loading:

Port of Discharge:

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

CITIBANK LC NUMBER: 49700575

EXIM BANK GUARANTEE NO. APO81558XX - TURKEY

FREIGHT COST: FREIGHT PREPAID

CHARLESTON EXPRESS IS OF U. S. REGISTRY

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

Currency:

Charge

Rate

Basis

Wt/Vol/Val

P/C

Amount

Ecz. M. Nejat ERTÜRK

İdari ve Mali İşler Dair. Bşk.

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

Freight payable at:

Number of original B/L:

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Shipper:



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: B/L-No.:

Page:

HLCUTPA081202911

6 / 6

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

Place of Delivery:

Port of Loading:

Port of Discharge:

Container Nos., Seal Nos.; Marks and Nos.

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
ORIGIN LANDFREIGHT	1656.00	CTR	1	USD	1656.00	
FUEL SURCH OLF	92.00	CTR	1	USD	92.00	
TMNL SECURITY ORIG	5.75	CTR	1	USD	5.75	
CHASSIS USAGE ORIG	40.00	CTR	1	USD	40.00	
CARR. SECURITY FEE	7.00	CTR	1	USD	7.00	
BUNKER CHARGE	285.00	CTR	1	USD	285.00	
CAF	13.70	PCT	1200.00	USD	164.40	
CAF INLAND DEST.	3.00	PCT	2067.00	USD	62.01	
THC DESTINATION	155.00	CTR	1	USD	155.00	
DEST DELIVERY CHGE	85.00	CTR	1	USD	85.00	
CONGEST. SURCH. DEST	60.00	CTR	1	USD	60.00	
DESTIN LANDFREIGHT	2067.00	CTR	1	USD	2067.00	
LUMP SUM				USD	1700.00	

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

Currency:

Charge	Rate	Basis	W/Vol/Val	P/C	Amount
ECZ M Nejat ERTÜRK İdari ve Mali İşler Dal. Bşk. 					

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

Freight payable at:

Number of original Bs/L:

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

CERTIFICATE OF ORIGIN for general use and for the following countries:

ARGENTINA, AUSTRIA, BRAZIL, COLOMBIA, CYPRUS, ECUADOR, ERITREA, GERMANY, GREECE, INDIA, IRAN, ITALY,
KUWAIT, LIBYA, NETHERLANDS, PAKISTAN, SAUDI ARABIA, SWITZERLAND AND VIETNAM

Z- 7041

The undersigned MARSHALL TRANSPORT SERVICE CORP.

for MARSHALL AMERICA CORP. 375 LEXINGTON AVE. NEW YORK, NY 10017

that the following mentioned goods shipped on S/S CHARLESTON EXPRESS V. 60674

on the date of 12/09/68 consigned to FACULTY UNIVERSITY RECTORY

ANKARA, TURKEY

are the product of the United States of America

MARKS AND NUMBERS	NO. OF PKGS. BOXES OR CASES	WEIGHT IN KILOS		DESCRIPTION
		GROSS	NET	
	1	500		DEEP FREEZER
	2	108		LABORATORY
				ELECTROPHORESIS
				POWER SUPPLY
				EQUIPMENT
				SUPPLY CONTRACT DATED AUGUST 27, 1968
				FOR 171 ITEMS OF MACHINERY, MATERIALS
				AND EQUIPMENT (THE CONTRACT NO. 171)
				L/C NO. 49700575
				EXPIRY DATE 12/31/68 - TURKEY
				100% MADE IN U.S.A.

Sworn to before me this 9th day of DECEMBER, 2068 Dated at NEW YORK on the 9th day of DECEMBER, 2068

MARSHALL TRANSPORT SERVICE CORP. (Signature of Owner or Agent)

The JAMAICA CHAMBER OF COMMERCE a recognized Chamber of Commerce under the laws of the State of NEW YORK

has examined the manufacturer's invoice or shipper's affidavit concerning the origin of the merchandise and according to the best of its knowledge and belief finds that the products named originated in the United States of America

Secretary

GÜMRÜK SUNDURMA LİSTESİ

UÇAĞIN İSMİ	TIR - ARKAS	MANİFESTO NO	R1000100
SEFER NO	3U ER-4641	GELDİĞİ YER	ABD.
BAYRAĞI	T-C	SUNDURMA GİRİŞ TARİHİ	15 01 2009

SIRA NO	KONŞİMENTO NO	KABİN			ALICI
		ADEDİ	CİNSİ	DARALI AĞIRLIĞI	
1	09340960	3	Laboratuvar	361.92	Hacettepe Üniversitesi
2	TR000389		cihazları.		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Yukarıda yazılı 3 kap eşya 15.01.2009 tarihinde gösterildiği gibi sundurmaya alınmıştır.

Adı-Soyadı:	ARKAS	GÜMRÜK BEKLEME MEMURU	
İmza:	Kemal	Adı-Soyadı:	
		İmza:	

MAIYE VE CUMHUR BAKANLIGI
Etilim

Est. 60m 5m mud
6V, 10V, 0.1V, DV

Sett. A. I. 1000
Sima No. 1000
Ozcel No. 1000
040254

[illegible]

Place Hope in S.G.W.

Il chardai

INDUSTRIAL CATHISKATIVITY

Receivables

D. J. A. O. Basilio M. Messerseri - 1991

ESPENCOA GUMRICK LTD.
070602001M038090

42 Kals

42 Kızlar, toplam 3,901,184 00

42 Kalam Ayat	430,790 01

Genet

Marubeni Europe plc Düsseldorf Branch



IMMERMANNSTR. 45
DEUTSCH-JAPANISCHES
CENTER
40210 DÜSSELDORF

Postfach 10 36 64
40027 DÜSSELDORF
TEL-NR. (0211) 3571-0
TELEFAX (0211) 3571-325
Internet: www.europe.marubeni.com

MARUBENI EUROPE PLC • Postfach 10 36 64 • 40027 DÜSSELDORF

For Account And Risk Of: HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU ANKARA-TURKEY End Destination: HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU ANKARA-TURKEY		Invoice No. / Rechnung Nr.: FE210807 Date / Datum: 22.08.2007 Our Reference: HU-AUG-08-HERMES-II LC Number: 01156AKR44749	
Shipped from/Verschiffung von: Moenchenladbach, Germany	Mode of Transport: Truck	Contract No./Vertrags Nr.:	Contract Date / Vertrags Datum: 02.08.2001

In respect of the above-referenced Contract signed on 02.08.2001
WE HEREBY request you to pay the following sum to us

CORRESPONDING TO PARTIAL SHIPMENT OUT OF
74 ITEMS OF MACHINERY, MATERIAL AND EQUIPMENT. CIP ANKARA TURKEY

Item List No	Item Code	Description (English)	Qty	Model	Euro (€)	US\$	Euro Counter-value (for Customs purposes only)
13 X	SER13	Patient Follow-up System	10	INTELLIVUE		319,690.00	233,623.21
29 X	CER13	Patient Follow-up System	2	INTELLIVUE		84,906.00	62,047.65
42 X	YOB8	Patient Follow-up System, 8 beds	1	INTELLIVUE		343,064.00	250,704.47
142 X	KIU7	Patient follow- up system	1	INTELLIVUE		461,028.00	336,910.2
34 X	CER18	Central Gas System	1	MIM	114,796.00		114,796.00
160 X	TRP11	Daylight film developer	1	KODAK XOMAT MULTILOADER 7000		282,844.00	206,696.87
167 X	RAD6	Daylight film developer	1	KODAK XOMAT MULTILOADER 7000		282,844.00	206,696.87
177 X	NUK1	X-Ray film developer	1	X-OMAT 2000RA		35,450.00	25,906.17

London (Headquarters)
Marubeni Europe plc
120 Moenchstr.
London
EC2M 6SS
UK

Hamburg Branch
Marubeni Europe plc
Bismarckstrasse 7
Hamburg
Germany

Berlin Office
Marubeni Europe plc
Bismarckstrasse 7
10439 Berlin
Germany

Bankverbindungen:

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.
IBAN: DE64 3001 0700 0000 0150 81
SWIFT Code: BOTK DEDX
Konto-Nr.: 511-015 081 (BLZ 300 107 00)

Deutsche Bank AG
IBAN: DE94 3007 0010 0319 4701 00
SWIFT Code: DEUT 3333
Konto-Nr.: 3 194 701 (BLZ 300 700 10)

Registergericht Düsseldorf, HRB 37614
Geschäftsführer: Mr. Hiroshi Sakamoto

UST-ID-Nr.: DE 811 357 225

Paris Branch
Marubeni Europe plc
5, Boulevard de la Madeleine
75001 Paris
France

Milan Branch
Marubeni Europe plc
Viale Della Liberazione 18
20124 Milan
Italy

Stockholm Branch
Marubeni Europe plc
Kungälvägen 10
SE-141 56 Stockholm
Sweden

İSMAIL HAKKI ARIKAN

RADYASYON SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ
MARUBENİ EUROPE PLC
KUNGSÄLVÄGEN 10
SE-141 56 Stockholm
Sweden

[Signature]

690 Sayılı TAEK Kararı
Radyasyon Güvenliği Kurulunun
Hükümlerine Göre Gümrükler Tarafından
Orjinal Fatura ile Karşılaştırılması Maksadına
Kasılmıştır.

Marubeni Europe plc Düsseldorf Branch



IMMERMANNSTR. 45
DEUTSCH-JAPANISCHES
CENTER
40210 DÜSSELDORF

Postfach 10 35 64
40027 DÜSSELDORF
TEL-NR. (0211) 3571-0
TELEFAX (0211) 3571-325
Internet: www.europe.marubeni.com

MARUBENI EUROPE PLC • Postfach 10 35 64 • 40027 DÜSSELDORF

For Account And Risk Of:
HACETTEPE UNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ
ANKARA-TURKEY.

End Destination:
HACETTEPE UNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ
ANKARA-TURKEY

Invoice No. / Rechnung Nr.: FE220807

Date / Datum: 22.08.2007

Our Reference: HU-AUG-08-HERMES-I

LC Number: 01156AKR44749

Shipped from/Verschiffung von:
Moenchengladbach, Germany

Mode of Transport:
Truck

Contract No./Vertrags Nr.:

Contract Date / Vertrags Datum:
02.08.2001

In respect of the above-referenced Contract signed on 02.08.2001
WE HEREBY request you to pay the following sum to us

CORRESPONDING TO PARTIAL SHIPMENT OUT OF
74 ITEMS OF MACHINERY, MATERIAL AND EQUIPMENT, CIP ANKARA TURKEY

Item List No.	Item Code	Description (English)	Qty	Model	Euro (€)	US\$	Euro Counter-value (for Customs purposes only)
161	TRP12	Surgical stereotactic radiation system	1 (Part 1 of 2)	NOVALIS	3,457,991.54		3,457,991.54
Total					3,457,991.54		3,457,991.54

EURO TOTAL

3,457,991.54 Euro

AMOUNT PAYABLE (UNDER LC No. 01156AKR44749)

[= 85% x 3,457,991.54 Euro]

2,939,292.81 Euro

For and on behalf of
Marubeni Europe plc

[Authorized Signature]

2690 Sayılı TAEK Kanunu,
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
Hükümlerine Göre Gümrükler Tarafından
Orjinal Fatura ile Karşılaştırılması Maksa-
dıyla Kaçaklanmıştır.

ISMAİL HAKKI ARIKAN
RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DAİRESİ BAŞKANI

London (Headquarters)
Marubeni Europe plc
120 Moorgate
London
EC2M 6SS
UK

Hamburg Branch
Marubeni Europe plc
Stadthausbrücke 7
20355 Hamburg
Germany

Berlin Office
Marubeni Europe plc
Bomholmer Strasse 7
10439 Berlin
Germany

Bankverbindungen:

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.
IBAN: DE64 3001 0700 0000 0150 81
SWIFT Code: BOTK DEDX
Konto-Nr.: 511-015 081 (BLZ 300 107 00)

Deutsche Bank AG
IBAN: DE94 3007 0010 0319 4701 00
SWIFT Code: DEUT DEDD
Konto-Nr.: 3 194 701 (BLZ 300 700 10)

Registergericht Düsseldorf, HRB 37614
Geschäftsführer: Mr. Hiroshi Sakamoto

UST-ID-Nr.: DE 811 357 225

Paris Branch
Marubeni Europe plc
5, Boulevard de la Madeleine
75001 Paris
France

Milan Branch
Marubeni Europe plc
Viale Della Liberazione 18
20124 Milan
Italy

Stockholm Branch
Marubeni Europe plc
Kungsgatan 33, (8th floor)
SE-111 56 Stockholm
Sweden

Marubeni Europe Plc Düsseldorf Branch

NUMERMANNSTR. 45
DEUTSCH-JAPANISCHES
CENTER
40210 DÜSSELDORF

P.O. BOX 10 35 64
D-40027 DÜSSELDORF
Phone (+49-211) 3571-0
Fax (+49-211) 161579

161	TRP12	Surgical stereotactic radiation system	1 (Part 2 of 2)	NOVALIS	446,192.46	446,192.46
Total					560,988.46	1,809,826.00
						1,883,573.96

EURO TOTAL

560,988.46 Euro

US\$ TOTAL

1,809,826.00 US\$

TOTAL (EURO COUNTER-VALUE) for Customs purposes only

1,883,573.96 Euro

[Applied rate = 1.3684]


AMOUNT PAYABLE (UNDER LC No. 01156AKR44749)

476,840.19 Euro + 1,538,352.10 US\$

[= 85% x 560,988.46 Euro]

[= 85% x 1,809,826.00 US\$]

For and on behalf of
Marubeni Europe plc


[Authorized Signature]

İSMAIL HAKKI AKTIKAN
RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DAİRESİ BAŞKANI

2690 Sayılı TAEK Kanunu,
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
Hükümlerine Göre Gümrükler Tarafından
Orjinal Fatura ile Karşılaştırılması Maksa-
diyle Kaşelenmiştir.



Bankers:

The Bank of
Tokyo-Mitsubishi Ltd., Düsseldorf 511-015 081 (BGN 300 107 00)
SMBC, Düsseldorf 12 13 002 (BGN 301 304 00)
The Tokai Bank Ltd., Düsseldorf 23 119 (BGN 300 206 00)
Deutsche Bank AG, Düsseldorf 3 194 701 (BGN 300 700 10)
Dresdner Bank AG, Düsseldorf 2 103 035 (BGN 300 800 00)

Registration Court Düsseldorf, HRB 37614
Managing Director and CEO: Mr. Hirohiko Kubo

Vat-IDNr.: DE 811 357 225



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu



Sayı : B.02.1.TAE.0.11.00.02-10600- KRT0007.01.022
Konu : İthal izni

23337

16097

20 EYL 2007

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ONKOLOJİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

İlgi: 19/09/2007 tarihli müracaatınız.

İlgi yazı ile Kuruluşunuz bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilmek istenen Marubeni Europe Plc./ALMANYA firmasından temin edilen, 22/08/2007 tarihli ve FE 210807-FEb 220807 numaralı fatura muhteviyatı, 9022.14.00.00.19 G.T.İ.P'lu Novalis marka,1081 seri numaralı lineer hızlandırıcı cihazının Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nden, bir defaya mahsus olmak üzere ithalinin tarafınızdan gerçekleştirilmesinde "Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Yönetmeliği" hükümleri gereğince bir sakınca yoktur. Bu iznin geçerlilik süresi Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'nin 61. maddesi uyarınca 3 aydır.

Kurumumuza beyan edilen ek'teki fatura ile söz konusu orijinal faturanın ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından uygun olmadığına tespit edilmesi halinde ithaline izin verilmeyecek ve TAEK mevzuatı gereğince işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmail Hakkı ARIKAN
Başkan a.
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği
Dairesi Başkanı

EKLER

Ek-1 Kaşelenmiş proforma fatura

2 Gönderen - Importeur
MARUBENI EUROPE PLC
40210
DÜSSELDORF 40027 004

1 BEYAN

D

KDR

3 Formlar

2

2

3

8

ESENBOĞA GÜMRÜK MOD.
07060200IM028576

31 Kaptan ve eşyanın tanımı

Kaptan ve konteynerlerin marka numara ve onları

9 adet (unit)

Marka: research-Numara: kpt16

Tarife tanımı: nükleer reaktörler kazanlar makinalar mekanik cihazlar ve aletler bunların aksan ve parçaları kendine bağlı bir fonksiyonu olan makina ve mekanik cihazlar diğer makina ve cihazlar diğerleri diğerleri pompa tipinde otomatik makineler alet olup kullanılmamıştır
 Ticari tanımı: otomatik pipet seti

44 Ek bilgi belge ve diğer

Original Fatura V 13/07/2007-FE120707
 Banka Yazısı Y T.C.MERKEZ BANKASI
 A.T.R Dolanım Belgesi V A.T.R.31/05/2007-302270-ATR.13/07/2007-148206

32 Kalem no

2

33 TGTG numarası

84798997

20

12

34 Menşe ülke kodu

004

35 Brüt ağırlık (kg)

900.00

37 REJİM

40 00

38 Net ağırlık (kg)

850.00

40 Manifesto Özel beyan

41 Adet(UNIT)

9

42 Kalem fiyatı

27,081.00

E.B. Kodu

45 Ayrıntı

46 İstatistik

37,421.53

31 Kaptan ve eşyanın tanımı

Kaptan ve konteynerlerin marka numara ve onları

1 kap 1 adet (unit)

Marka: 3-DWater phantom-Numara: tp5

Tarife tanımı: optik alet ve cihazlar sinematiği kontrol labbi veya cerrahi alet ve cihazlar bunların aksan ve parçaları x ışını kozmik veya diğer ıyınlarına ıyınlarını ılgıneye mahsus alet ve cihazlar diğerleri diğerleri dozimetreler
 Ticari tanımı: dozimetri sistemleri

44 Ek bilgi belge ve diğer

Original Fatura V 13/07/2007-FE120707
 Banka Yazısı Y T.C.MERKEZ BANKASI
 A.T.R Dolanım Belgesi V A.T.R.31/05/2007-302270-ATR.13/07/2007-148206

32 Kalem no

3

33 TGTG numarası

90301000

90

00

34 Menşe ülke kodu

004

35 Brüt ağırlık (kg)

500.00

37 REJİM

40 00

38 Net ağırlık (kg)

450.00

40 Manifesto Özel beyan

41 Adet(UNIT)

1

42 Kalem fiyatı

569,731.86

E.B. Kodu

45 Ayrıntı

46 İstatistik

787,276.58

31 Kaptan ve eşyanın tanımı

Kaptan ve konteynerlerin marka numara ve onları

1 kap 1 adet (unit)

Marka: ara-Numara: tp7

Tarife tanımı: optik alet ve cihazlar ayar alet ve cihazlar tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar bunların aksan ve parçaları bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müeyyene alet cihaz ve makineler elektronik olanlar diğerlerinden diğerleridir.
 Ticari tanımı: radyoterapi amaçlı network ag sistemi

44 Ek bilgi belge ve diğer

Original Fatura V 13/07/2007-FE120707
 Banka Yazısı Y T.C.MERKEZ BANKASI
 A.T.R Dolanım Belgesi V A.T.R.31/05/2007-302270-ATR.13/07/2007-148206

32 Kalem no

4

33 TGTG numarası

90318034

00

19

34 Menşe ülke kodu

004

35 Brüt ağırlık (kg)

800.00

37 REJİM

40 00

38 Net ağırlık (kg)

750.00

40 Manifesto Özel beyan

41 Adet(UNIT)

1

42 Kalem fiyatı

208,402.11

E.B. Kodu


45 Ayrıntı

46 İstatistik

287,977.76

47 Vergi hesaplaması

Türü	Vergi matrahı	Oran	Tutar	Ö.S.	Türü	Vergi matrahı	Oran	Tutar	Ö.S.
10		% 0.00	0.00	P	10		% 0.00	0.00	P
40		% 18.00	8,457.05	P	40		% 18.00	177,920.00	P
Büyük kaleme ilişkin toplam					Büyük kaleme ilişkin toplam				
10		% 0.00	0.00	P	10		% 0.00	0.00	P
40		% 18.00	65,081.33	P	40		% 18.00	256,080.23	P
Üçüncü kaleme ilişkin toplam					Üçüncü kaleme ilişkin toplam				
10		% 0.00	0.00	P	10		% 0.00	0.00	P
40		% 18.00	65,081.33	P	40		% 18.00	256,080.23	P
Genel toplam					Genel toplam				
65,081.33					256,080.23				



Marubeni Europe plc Düsseldorf Branch



IMMERMANNSTR. 45
DEUTSCH-JAPANISCHES
CENTER
40210 DÜSSELDORF

Postfach 10 36 64
40027 DÜSSELDORF
TEL-NR. (0211) 2671-0
TELEFAX (0211) 2671-325
Internet: www.europe.marubeni.com

MARUBENI EUROPE PLC • Postfach 10 36 64 • 40027 DÜSSELDORF

For Account And Risk Of: HACETTEPE UNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ ANKARA-TURKEY		Invoice No. / Rechnung Nr.: FE120707 Date / Datum: 13.07.2007 Our Reference: HU-JUL-07-HERMES-I	
End Destination: HACETTEPE UNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ ANKARA-TURKEY		LC Number: 01156AKR44749	
Shipped from/Verschiffung von:	Mode of Transport:	Contract No./Vertrags Nr.:	Contract Date / Vertrags Datum:
Moenchengladbach, Germany	Truck		02.08.2001

In respect of the above-referenced Contract signed on 02.08.2001
WE HEREBY request you to pay the following sum to us

CORRESPONDING TO PARTIAL SHIPMENT OUT OF
74 ITEMS OF MACHINERY, MATERIAL AND EQUIPMENT. CIP ANKARA TURKEY

Item List No.	Item Code	Description (English)	Qty	Model	Euro (€)	US\$	Euro Counter-value (for Customs purposes only)
X 7	SER7	PCL EMERGENCY TROLLEYS	7	PCL	10,360.00		10,360.00
X 43	YOB9	PCL EMERGENCY TROLLEYS	1	PCL	1,480.00		1,480.00
61	KPT16	AUTOMATIC PIPETTE SET	6	RESEARCH	15,930.00		15,930.00
74	KAB6	AUTOMATIC PIPETTE SET	3	RESEARCH	11,151.00		11,151.00
X 138	KIU3	PCL EMERGENCY TROLLEYS	2	PCL	2,960.00		2,960.00
X 154	TRP5	DOSIMETER	1	3-D WATER PHANTOM		767,140.00	569,731.86
X 156	TRP7	NETWORK SYSTEM FOR RADIO THERAPY	1	ARIA		280,612.00	208,402.11
TOTAL					41,881.00	1,047,752.00	820,014.97

EURO TOTAL

US\$ TOTAL

41,881.00 Euro

1,047,752.00 US\$

TOTAL (EURO COUNTER-VALUE) for Customs purposes only

820,014.97 Euro

[Applied rate = 1.3465]

AMOUNT PAYABLE (UNDER LC No. 01156AKR44749)

35,598.85 Euro + 890,589.20 US\$

[= 85% x 41,881.00 Euro]

[= 85% x 1,047,752.00 US\$]

For and on behalf of
Marubeni Europe plc

[Authorized Signature]

London (Headquarters)
Marubeni Europe plc
120 Moorgate
London
EC2M 6SS
UK

Hamburg Branch
Marubeni Europe plc
Stadthausbrücke 7
20355 Hamburg
Germany

Berlin Office
Marubeni Europe plc
Bomholmer Strasse 7
10439 Berlin
Germany

Bankverbindungen:

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.
IBAN: DE64 3001 0700 0000 0150 81
SWIFT Code: BOTK DEDX
Konto-Nr.: 511-015 081 (BLZ 300 107 00)

Deutsche Bank AG
IBAN: DE94 3007 0010 0319 4701 00
SWIFT Code: DEUT 3333
Konto-Nr.: 3 194 701 (BLZ 300 700 10)

Paris Branch
Marubeni Europe plc
5, Boulevard de la Madeleine
75001 Paris
France

Milan Branch
Marubeni Europe plc
Viale Della Libertazione 18
20124 Milan
Italy

Stockholm Branch
Marubeni Europe plc
Kungsgatan 33, (8th floor)
SE-111 56 Stockholm
Sweden

Registriergericht Düsseldorf, HRB 37614
Geschäftsführer: Mr. Hitoshi Sakamoto
UST-ID-Nr.: DE 811 357 225

RESMİ KULLANIMA MAHSUS

		G.T.P.	Eşya No	Eşya No	Eşya No
A. Kıymetli Hesabının Temel Unsuru	11. (a) Döviz cinsine göre faturada yer alan net SATIŞ FİYATI (gümrük kıymetinin tespiti içinde gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat) (b) Dolaylı Ödemeler (Bkz. 8 (b)) 820.014.97 EİR (Döviz Kuru : 1.73310 EİR)		871680009011		
B. İLAVELER	12. TOPLAM (A) (11 Olarak) 1.421.167.95 YTL				
Yukarıda (A) ya ilave edilmiş il cinsinden maliyet unsurları(*)	13. (a) Alıcı tarafından üstlenilen giderler (b) Satınalma komisyonları dışındaki komisyonlar (c) Telifliye (d) Kap ve Ambalaj Bedeli				
Bu konuda Gümrük idaresince önceden verilmiş bir karar var mı? Belirtiliniz	14. İthal eşyasının üretiminde ve ihrac amacıyla satışta kullanılmak üzere alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin kıymetlerinden verilecek uygun miktardaki pay. (a) İthal eşyasına kullanılan malzeme, aksesuar, parça ve benzerleri (b) İthal eşyasının üretiminde kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler (c) İthal eşyasının üretim sırasında tüketilen maddeler (d) İthal eşyasının üretim için gereken ve ithal ülkesi dışında üretilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri (e) Royallı ve lisans ücretleri (Bkz. 9 (a)) (f) Nakliye (g) Başlatma ve işletme giderleri (h) Sigorta giderleri				
C. İNDİRİMLER	15. Royallı ve lisans ücretleri (Bkz. 9 (a)) 16. İthal eşyasının tekrar satışı ve diğer herhangi bir şekilde elden çıkarılması karşılığında sağlanan hasılatın bir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya iktisal ettirilen kısmı (Bkz. 9 (b)) 17. (a) İthal eşyasının giriş limanı veya mahalline kadar yapılan (i) Nakliye (ii) Başlatma ve işletme giderleri (b) Sigorta giderleri				
Yukarıda (A) ya ilave edilmiş ancak gerçekte ödenen veya ödenecek fiyattan ayrılmış bir kısmı ve tevsiki kağıtlarda il cinsinden maliyet unsurları (*)	18. TOPLAM (B) 19. Varso ithal eşyası için giriş mahallinden sonra yapılan nakliye giderleri 20. Varso ithal eşyası için ithalatın sonra yapılan inşa, kurma, montaj, bakım ve teknik yardımlara ilişkin giderler 21. Varso diğer ödemeler 1.500 YTL Diğerleri (Nitelikliğini belirtiniz) 22. Eşyanın ithal veya satışı nedeniyle Türkiye'de ödenecek gümrük vergileri ile diğer vergi, harç ve fonlar 23. TOPLAM (C)				
24. BEYAN EDİLECEK KIYMET (A+B-C) 1.422.667.95 YTL					

(*) Söz konusu maliyet unsurları döviz cinsinden ödenmiş veya ödenecek ise, 11 nolu kütuda belirtilen kur üzerinden, her bir eşya için TL'ye çevirmek suretiyle beyan ediniz.

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

Ausführer (Name, vollständige Anschrift, Staat)

TW-Freiburg
Lörracher Str. 7
D-79115 Freiburg / Germany

A.T.R. Nr. D

302270

2. Frachtpapier (Ausfüllung freigestellt)

Nr. vom

3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Staat) (Ausfüllung freigestellt)

Hacettepe University Reclorate
Hacettepe University's Oncology Hospital
Sihhiye, Ankara, Turkey

4.

ASSOZIATION
zwischen der
EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
und der
TÜRKEI

5. Ausfuhrstaat

Federal Republic of
Germany

6. Bestimmungsstaat (*)

Turkiye

7. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt)

8. Bemerkungen

9. Laufende
Nummer

10. Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke (bei lose geschütteten Waren je nach Fall Name des Schiffes,
Waggon- oder Kraftwagennummer); Warenbezeichnung

7 pallets

SUPPLY OF MEDICAL MACHINERY, EQUIPMENT & MATERIALS:

Item Code	Description / Model	Quantity
154-TRP5	Therapy Beam Analysers (3-D Water Phantom)	1 Set

11. Rohgewicht
(kg) oder
andere
Maße (ht,
m³, etc.)

weight gross:
total 651 kg
weight net:
total 468 kg

12. BESCHEINIGUNG DER ZOLLSTELLE

Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt

Ausfuhrpapier (*):

Art/Muster VAE Nr. AV 1777163

vom 2007-05-31

Zollstelle Hauptzollamt Lörrach

Austellender Stadt Zollamt Freiburg

Tulastr. 84

79108 Freiburg

(Unterschrift)

Stempel



13. ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS

Der Unterzeichner erklärt, daß die vorgenannten Waren die Voraussetzungen erfüllen, um diese Bescheinigung zu erlangen.

Freiburg, 2007-05-31

Physikalisch-Technische Werkstätten

i.A. Gerlinde Jäger

D-79115 Freiburg

(*) Anzugeben
ist der
Mitglied
staat oder
„Türkei“

(*) Nur aus-
zufüllen,
wenn im
Ausfuhr-
staat er-
forderlich

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

1. Führer (Name, vollständige Anschrift, Staat)

FOR AND ON BEHALF OF MARUBENI
EUROPE PLC. DÜSSELDORF BRANCH
IMMERMANSTR. 45
40210 DÜSSELDORF

A.T.R.

Nr. A.T.R. 148206

2. Frachtpapier (Ausfüllung freigestellt)

Nr. vom

3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Staat) (Ausfüllung freigestellt)

HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU
REKTORLUGU
TK ANKARA
Türkei

4. ASSOZIATION
zwischen der
EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
und der
TÜRKEI

5. Ausfuhrstaat

EG

6. Bestimmungsstaat 1)

Türkei

7. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt)

Strassenverkehr

8. Bemerkungen

9. Lau-
fende
Nr.

10. Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke (bei lose geschütteten Waren je nach Fall Name
des Schiffes, Waggon- oder Kraftwagennummer); Warenbezeichnung

Gesamtsendung Marubeni FE120707, bestehend aus 19 Colli

1. Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und
ihre Einheiten; magnetische oder optische Leser,
- Ursprung: Schweiz
2. - ANDERE MASCHINEN, APPARATE UND GERÄTE: -
ANDERE
- Ursprung: Deutschland
3. Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für
Fahrzeuge aller Art; andere nicht
- Ursprung: Italien

11. Roh-
gewicht (kg)
oder andere
Maße
(hl, m³, etc.)

1984

12. BESCHEINIGUNG DER ZOLLSTELLE

Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt.

Ausfuhrpapier: 2) AE Nr. 6066749

Art/Muster vom

Zollstelle: Mönchengladbach

Ausstellender Staat: Bundesrepublik Deutschland

Mönchengladbach 13.07.2007
(Ort und Datum)

(Unterschrift)

13. ERKLÄRUNG DES AUSFUHRERS

Der Unterzeichner erklärt, daß die vorgenannten
Waren die Voraussetzungen erfüllen, um diese
Bescheinigung zu erlangen.

Mönchengladbach 13.07.07

(Ort und Datum)

MICHAEL ZINTEL

(Unterschrift)

Nur aus-
füllen,
wenn im
Ausfuhr-
staat er-
forderlich





Tel: 089/89 52 68-0
Fax 089/89 52 68-20
E-Mail: ofg@orientfreight.de
<http://www.orientfreight.de>



CONFIDENTIAL

LEAGUE OF WRITERS INTERNATIONAL

CONFIDENTIAL

Chapters

Not, j fy

Agent
ORIENT FREIGHT GROUP
NAKLIYAT VE TICARET LTD. STI.
ISTANBUL YOLU 3.KM
KARATOPRAK MEVKII, MURAT BEY BELDESI
TR-34870 CATALCA - ISTANBUL

TR ANKARA

Deliv. Cond.: CIP
Freight : FREIGHT PREPAID
Number of originals:
shipper's reference:

label	colli and package	contents according to declaration of shipper	gross weight	net weight
	26 KOLLI	MEDIZINTECHNISCHE GERÄTE CIP ANKARA FREIGHT PREPAID	2635,7	
ANKİKEPO DEFTERİNİN 7792 NÖLÜ SAYFASINA KAYDEN. 26 RAP EŞYA Expeditor's GÜMRÜKLÜ ANTREPOSUNA ALINMIŞTIR	26.07.2007		ÖZET BEY: 15020 ÖZET BEY TARİHİ: 21.07.07 TARAFI: SAKABİ: GXSL 231337 GİZLİ LİPİSİ: K.WLF ABAS RAHISI: 31 E 1209	

accord.to declaration of consignor: L/C-No Proforma invoice value EUR

Frachtführer / Transporteur: DABLAN ULUS.TASI. VE TIC. LTD.SHI ISKENDERUN YOLU ÜZERİ DABLAN SITESİ B BLOK KAT. 1 TR ANTAKYA/HATAY	Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières: bei Beförder- oder Ablieferhindernissen ist die ORIENT FREIGHT GMBH umgehend zu informieren Um-/Zuladen nicht gestattet Gerichtsstand für alle Beteiligten ist München	
Dokumente / Documents:	Auslieferung des Gutes / Lieu prévu pour la livraison de la marchandise: Place of delivery / destination: Ort : ANKARA Land: TR Zollamt: ESENOĞA HAVALIMANI München, 29.06.2007	
As agent of sender/shipper: Orient Freight GmbH Internationale Spedition 0-80995 München/AS CARRIER	Ware unter Vorbehalt der Beschaffenheit und Vollständigkeit übernommen:	Ankunft / Arrival: Entladen / Discharged:

* Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenseitigen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR). — Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

Bankverbindung: Kreissparkasse München (BLZ 702 501 50) Kto.-Nr. 260 447 586,
Deutsche Bank 24 München (BLZ 700 700 24) Kto.-Nr. 7933 799

Wir erheben ausschließlich auf Basis der ersten Erhebung der Deutschen Sporthilfsbedingungen (ADSP). Erhebungen und Gerätebestand beider Teile ist ausschließlich Nürnberg. Auch bei veränderten Bedingungen gelten die ADSP nur relativ zu zahlen. Für veränderte Zahlen müssen wir Veranschaulichungen berechnen und Sie für Kurvenverläufe (z.B. Veranschaulichung) in Anhang nehmen. Alle ersten die Zellbereiche selbst nach.



T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Kuruluş Vergi Dairesi Vergi No: 9980069675

Hesaptan Hesaba Havale

Dekont

SUBE KODU/ADI 0384/SAMANPAZARI/ANKARA
IBAN TR570001000384032244285001
HESAP NUMARASI 0384/3224428-5001
VERGİ DAİRESİ KIZILBAY VERGİ DAİRESİ
VERGİ KİMLİK NO 4540016259
İŞLEM TARİHİ 26/07/2007-18:13:50-F01093
TALOR 27.07.2007
İŞLEM YERİ SUBE

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BA

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 26.7.2007/580376 TAL İST AKTARILAN

Alacaklı Şube : 921-HASKÖY/ANKARA

Alacaklı Hesap : 3081007 5002

Alacaklı Adi Soyadı : ESENBOĞA GÜHRÜK SAYHANLIĞI

Alacaklı Vergi No : 0690275732

Komisyon : 0,00 TRY

Havale Tutarı : 256.080,23 TRY

Kupon Dökümü

Sizden 256.080,23 TRY (Yalnız İKİYÜZELLİAETİBİNSEKSENVEKİ23 TRY) Borç Kaydedilmiştir.

27/07/2007-09:48:59 ACHTHVLG MEDOGAN DGUZEL

Fiş muhleviyatını aldım.
Müşteri imzası

Saygılarımızla.

T.C. ZİRAAT BANKASI
0384 SAMANPAZARI/ANKARA

0150.600.175

6.3.98/17636

EK - Belpeler
EK-70

05.03.1998

123

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne

İlgi: 07.11.1997 tarih B.02.I.HM.0.DEI.05.01/SAĞ/52510 sayılı yazınız hakkında.

Üniversitemiz 1998 yılı yatırım programında 84I000040 No.lu proje ile yer alan Onkoloji Hastanesi inşaatı I.ve II.Etap olmak üzere planlanmış ve aciliyeti olan Ayaktan Tedavi Bölümü (Gündüz Hastanesi) inşaatına 1984 yılında başlanılmış ve 17 Kasım 1993 tarihinde hizmete açılmıştır.

Hacettepe Onkoloji Hastanesi'nin II.Etabı olan yatan hastalara hizmet verecek olan (Yataklı Bölüm) Hastanesine ise 1994 yılında başlanılmış ve inşaatı hızlı yürütülmektedir.


Onkoloji Hastanesinin 1999 yılı içinde bitirilmesi ve tesisin bir bütün olarak hizmete girmesi planlandığından, bunun sağlanabilmesi amacı ile gerek inşaat gerekse makine teçhizat için ihtiyaç duyulan mali kaynağın aynı süre içinde temin edilerek kullanıma sokulmasında büyük yarar vardır.

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi inşaatı için 1997 Mali Yılı Bütçesinde mevcut 219,9 Milyar TL.ödenek dışında EK Bütçe Kanunu ile sağlanan 305 Milyar TL.ödenek ilgili yılda tamamen kullanılmış olup 1998 Mali Yılı Bütçesinde mevcut 213 Milyar TL.ödenekle inşaatın yıl sonunda büyük ölçüde tamamlanacağı ve 1999 Mali Yılı Bütçe Ödeneği ile Hastanenin tamamlanarak hizmete açılması planlanmıştır.

Yapımı sürdürülen Hastanenin Makine-Teçhizat (Tıbbi ekipman-diğer makine ekipmanlar) ile donanımının sağlanması için Dış Kredi istegimiz, ilgede kayıtlı yazınızda prensip olarak uygun görülmüş bulunmaktadır.

Dış kredi ile temini düşünülen bazı özel cihazların (kemik iliği ünitesi laminar flow donanımı, sterilizasyon ve klima cihazları gibi) inşaat sırasında yerleştirilmeleri gerektiği gibi, ek tanı ve tedavi cihazları ve hastane donanımının da 1999 yılı başında ihale edilmesi, Onkoloji Hastanesinin yataklı kısmının gecikmeden hizmete sokulabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenlerle, Onkoloji Hastanesi Donanımı için öngörülen 28.000.000.-US\$ dış kredi istegimizin gecikmeden temini hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof.Dr.Süleyman SAĞLAM

REKTÖR

Gen. Sek. : ... / ... / ...
Tarih : 4/3/98
İmza : 04/03/98
İmza : 04/03/98
İmza : 04/03/98

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

Akreditif no :

Biz Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 06100 Sıhhiye / ANKARA telgrafla aşağıdaki şartlar dahilinde Marubeni Europe Plc Duesseldorf Branch, Immermannstrasse 45, 40210 Duesseldorf, Germany lehine USD.2.844.219,85 ve EUR.7.799.338,20'lık (USD.3.066,061,35 ve EUR.8.665.415,10'lık tutarlara bilahare tamamlanacak) gayrikabili rücu müeyyet vesikalı bir akreditif açmanızı rica ederiz. Bu meblağ malın CIF Ankara bedelini teşkil etmektedir.

Bu akreditif 24.10.2007 tarihine kadar muteber olup, aşağıdaki sevk vesikalarının muhabirinize teslimi mukabilinde kullanılacaktır. Bu vade, vesaikin muhabirinize son teslim tarihidir. Vesaik alındığında vasıtanızla tarafımıza tevdi edilecektir.

- 1- Konşimento: Tam Takım 3 nüsha olacaktır. Taşıyacağı ibare: On board ve Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü emrine tanzim veya ciro edilmiş olacaktır.
- 2- Menşe Şahadetnamesi: 2 nüsha olarak tasdikli ve imzalı olarak tanzim edilmiş olacaktır.
- 3- Orijinal Fatura 5 nüsha olacaktır.
- 4- Sigorta Poliçesi malı aşağıdaki muhataralara karşı koruyacak : Deniz Muhataları, harp, mayın ve torpil muhataraları, kısmen veya tamamen çalınma, yanma, 1 orjinal, 2 kopya ve Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü emrine tanzim veya ciro edilmiş olacaktır.
- 5- Dolaşım Belgesi (ATR) 1 orjinal 2 Kopya olarak düzenlenecektir.(Sadece AB Menşeli mallar için)

Bu vesikalar " 74 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman " 'a mütealik bulunacaktır.

Mallar bir veya muhtelif partide, vapurla ,uçakla, kamyonla herhangi bir Avrupa ve/veya Asya ve/veya Ortadoğu ve/veya İsrail ve/veya Japon Limanından Ankara'ya sevkedilecektir.

Sevkiyat aktarmalı yapılacaktır.

HUSUSİ ŞARTLAR

- 1- Sigorta Poliçesi Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü adına düzenlenecektir.
- 2- Dolaşım Belgesi (ATR) 1 orjinal 2 Kopya olarak düzenlenecektir.(Sadece AB Menşeli mallar için)
- 3- Akreditif %100 teyitlidir.
- 4- Kredi no 38936 kapsamında akreditifi teyit eden banka sıfatıyla hareket eden Citibank International Plc'ye Hermes aracısı tarafından gönderilen avans teyit mektubu fotokopisi kabul edilebilir.
- 5- İşbu akreditif kapsamındaki ödemeler ancak kredi no 38936 kapsamında akreditifi teyit eden banka sıfatıyla hareket eden Citibank International Plc, Hermes aracısından artık doğru olmadığı gerekçesiyle avans teyit mektubunu geri çektikleri yönünde bir bildirim almazsa avans teyit mektubunda belirtilen tarihte ödenebilir.
- 6- Bu akreditif kapsamındaki çekişler belirtilen maksimum toplam tutara kadar EURO ve/veya USD cinsinden yapılabilir, ancak her halükarda çekişler EURO dengesinde USD cinsinden ve USD dengesinde EURO cinsinden yapılabilir.
- 7-Bu akreditif %95 ECA desteklidir.Alıcıya bu akreditifin sadece geçici olarak açıldığını bildiriniz. Akreditif, Hermes aracısından akreditifi gözden geçirdiği ve 38936 Nolu kredi kapsamındaki format koşullarına ve şartlarına uygun bulunduğunu belirten teyit yazısını aldıktan sonra aktif hale gelecek ve teyit edilecektir.
- 8- Bu akreditifin açılması ile ilgili yurtiçindeki masraflar tarafımıza, yurt dışındaki masraflar lehdara aittir.

Mevzuubahs akreditif baliğinin satış kurunuzdan mukabili ile bu meblağ üzerinden tarifenize uygun komisyonunuzu T.C. Ziraat Bankası Samanpazarı Şubesindeki 3224428-5001 No lu hesabımızdan mahsup edilmesine muvafakat ediyoruz / Peşinen Bankanıza tediye ediyoruz. Keza muhabiriniz komisyonu ile gerek Bankanızın ve gerek muhabirinizin her türlü masrafının ayrıca ve tamamen hesabımıza zimmet verilmesini rica ederim.

Bankanızca bu akreditiflere tatbik olunan "Beynelmilel Ticaret Odasının vesikalı kredilere mütedair yeknasak kaide ve teamüllerini" aynen kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederim.


8

Muhabiriniz tarafından lehdara tesviye edilecek olan meblağ mukabilinde tesellüm edilerek tarafınıza gönderilecek olan vesaikin usulüne uygun olarak tanzim edilmemiş bulunmasından, bunların sahte olmalarından veya tahrif edilmiş bulunmalarından;

- 2- Muhabirimize göndereceğiniz mektup ve telgrafların gecikmesinden veya kaybolmasından veya yanlış tesfir veya tercüme edilmelerinden ve telgrafların yanlış dekode edilmesinden,
- 3- Muhabiriniz tarafından Bankanıza gönderilecek olan vesaikin gecikmesinden veya kaybolmasından, muhabirinizin sun'u taksirinden veya sigortacının istitaatından,
- 4- İşbu vesaikin temsil ettiği malların miktar ve nev'inde fark zuhur etmesinden, malların kıymet veya ambalajından;

Bankanızın hiçbir suretle mes'ul tutulmayacağını berveçhi peşin kabul ettiğimizi saygılarımla arz ederim.

Mevzuubahs akreditifimiz taahhütname vadesi hitamında kısmen veya tamamen kullanılmadığı takdirde, Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kararnameye ilişkin tebliğ ve kararlar hükümleri dairesinde iptal edilerek alışlarının yapılmasına ve Yeni Türk Liralarının hesabımıza verilmesine peşinen muvafakat ettiğimi bildiririm.



Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 15/3827
Konu : Onkoloji-Hermes

19/3/2007

T.C.

BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü' ne

İlgi: a) 08.01.2007 tarih ve B.30.2.HAC.0.70.73.03 sayılı yazımız.

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi'nin (II.Kısım) 171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman tanımlı malzemelerin finansmanı amacıyla 24.10.2005 tarihinde imzalanan ve ilgi (a) yazınızla yürürlüğe girdiği bildirilen kredi anlaşmaları ile Citibank International Plc'den sağlanan 2495-5118-38936 finansman no.lu **USD.3.066.061,35** ve **EUR.8.665.415,10** tutarlık Hermes Garantili İhracat Kredisinden karşılanarak Akreditifleri açılacak olan **USD.2.844.219.85** ve **EUR.7.799.338.20** tutarındaki Akreditifle ilgili olarak ilgi yazımız ekinde göndermiş olduğumuz Akreditif açtırma talimatı ve Anlaşma eki "Schedule 5 Form Of Letter Of Credit" formunda tarafımızdan değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu Hermes Garantili İhracat Kredili akreditifinin açılması için ilişikte göndermiş olduğumuz Akreditif açtırma talimatı ve Anlaşma eki "Schedule 5 Form Of Letter Of Credit" formlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara Kambiyo Şubesi Dış Ticaret Servisine gönderilmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör

EKLER:

Ek-1: 3 Adet değişikliği yapılan Akreditif Açtırma Talimatı
ve Schedule 5 Formu İngilizce ve Türkçe Formları.

Morsur	: 16/3/07	OK
Def	: 16/3/07	OK
Şb. Md.	: -/-/-	
Başk. Md.	: 16/3/07	OK
Başkan	: 16/3/07	OK
Gör. Eşk.		



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 18216
Konu :

16/10/2007

ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Üniversitemiz **Onkoloji Hastanesi Projesi** (II.kısım) kapsamında temin edilen krediden karşılanarak Marubeni Europe Plc. Firmasından satın alınmasına karar verilen "**171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman**" tanımlı malzemelerle ilgili olarak Marubeni Europe Plc. Firması tarafından Almanya'dan Üniversitemiz adına gönderilen özet beyan no.lu 53,886 Kg ağırlığındaki Siclotron cihazı tanımlı tıbbi malzeme 16.10.2007 tarihinde Gümrük Müdürlüğüne gelmiş bulunmaktadır. Gelen malzemelerin ağırlığının (kilolarının) fazla olması nedeniyle malzemelerimizin Gümrük işlemlerini suphalan olarak yapmak istiyoruz. Söz konusu adı geçen malzeme ile ilgili yapılacak olan gümrük işlemlerinde gerekli kolaylığın gösterilmesini saygılarımla rica ederim.

Prof.Dr.Tunçalp ÖZGEN
Rektör

18.10.07 A

16.10.07 d



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 33/21996
Konu : Onkoloji-Hermes Akreditif Talebi

12/12/07

T.C.

MERKEZ BANKASI

Ankara Kambiyo Şubesi'ne
(Dış Ticaret Servisi)

İlgi : 03.12.2007 tarih ve B.02.2.TCM.4.06.00.01/96342 no.lu yazınız hakkında.

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi'nin finansmanı amacıyla temin edilen USD.3.066.061,35 ve EUR.8.665.415,10 tutarlık Hermes Garantili İhracat Kredisinden Marubeni Europe Plc. firmasından ithal edilecek olan malzemelerle ilgili olarak Şubeniz tarafından 01156AKR44749 no ile akreditifleri açılan "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman"tanımlı malzemelerden ithalat işlemi tamamlanan EUR.1.942.302,29 ve USD.270.588,15 lık tutarındaki kısımların ödeme talimatının beklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu ithalat işlemleri tamamlanan EUR.1.942.302,29 ve USD.270.588,15'lik malzeme bedelinin %85'ini teşkil eden kısımların ödemesinin yapılabilmesi için Hazine Müsteşarlığına 24.08.2007 tarih ve 132780 sayılı yazımızla 30.12.2008 tarihine kadar süre uzatım talebinde bulunulmuş olup bu güne kadar ilgi yazımıza cevap alınamamıştır. Adı geçen faturanın Marubeni Europe Plc. Firmasına ödeme işlemi ise kredi ve Akreditif süresinin uzatılmasından sonra mümkün olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör

Memur	: 07/12/07	OK
Şef	: 2.12.07	B
Şb. Md.	: -/-/-	
Başkan Yrd.	: 7/11/07	A
Başkan	: 02/11/07	Şef
Gec. Sak.	: -/-/-	



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 35/22338
Konu :

17.12.2007

ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Üniversitemiz **Onkoloji Hastanesi Projesi** (II.kısım) kapsamında temin edilen krediden karşılanarak Marubeni Europe Plc. Firmasından satın alınmasına karar verilen **"171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman"** tanımlı malzemelerle ilgili olarak Marubeni Europe Plc. Firması tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden Üniversitemiz adına gönderilen **5743.....**özet beyan no.lu **11.885 Kg** ağırlığındaki **EUR.1.248.571'lık MRI (Magnetik Rözanans Görüntüleme Sistemi Komple)** tanımlı tıbbi malzeme **17.12.2007** tarihinde Gümrük Müdürlüğüne gelmiş bulunmaktadır..

Söz konusu gümrüğüne gelen ve gümrük işlemleri suphalan olarak yapılacak olan **Magnetik Rözanans Görüntüleme sistemi** tanımlı cihazın Sıvı Helyum Gazı ile çalışması nedeniyle cihazda bulunan Sıvı Helyum gazının cihazın aralıksız 5 (Beş) gün enerjiye bağlanamamasında cihaz kendini upgrade etmektedir. Söz konusu adı geçen cihaza gümrüklü sahanızda Sıvı Helyum Gazı yüklenmesi ile ilgili olarak Hat grup Gaz ve Yüksek Teknoloji Ürünleri firmasından dolum teknisyenleri ve mühendis çalışanları elemanlarına cihaza gaz yüklenmesine müsaade edildiğine dair Üniversitemize yazı verilmesini ve gümrüklü sahada da gerekli kolaylığın gösterilmesini saygılarımla rica ederim.


Prof.Dr.Tunçalp ÖZGEN
Rektör

Memur	13.12.07	eh
Ş of	12.12.07	Ş
Şb. Md.		
Başkan Yrd.	13.12.07	Ş
Başkan	13.12.07	Ş
Gon. Şek.		



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ

Başhekimlik

Sayı :B.30.2.HAC.0.70.10.00/06.D- 836


19.11.2007

İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı'na

İlgi: Onkoloji Hastanesi Başhekimliği'nin 14.11.2007 tarih ve 1164 sayılı yazısı.

Onkoloji Hastanesi Başhekimliği'nin ilgi sayılı yazısındaki talebi uygun görülerek yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.


Prof.Dr.Uğur ERDENER
Hastaneler Genel Direktörü

Ek: 1 yazı.




Sayı: B.30.2.HAC.0.73.03.00/

REKTÖRLÜK MAKAMI'NA

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında Uluslararası ihale yolu ile tamamı dış kredili olmak üzere Marubeni Europe Plc. firmasından **USD.12.316.800.- ve EUR.16.000.000.** bedelle satın almasına karar verilen **"171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman"** tanımlı malzemelerden **USD.4.302.853,00** tutarındaki kısımlarının ithalatları tamamlanmış olan 2 Adet Lineer Akseleratör (S.No 150) 1 Adet Bilgisayarlı tedavi planlama sistemi (S.No.153) 1 Adet Dozimetri sistemleri (S.No.154) 1 Adet Brakiterapi sistemi, yüksek doz hızlı (S.No.155) 1 Adet Radyoterapi amaçlı network sistemi (S.No.156) tanımlı sıra numaraları ve adetleri verilen sözleşme ekindeki liste kapsamı cihazların montajları ve deneme işlemleri tamamlanmıştır.

Söz konusu cihazların Muayene ve kabul işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda adı soyadı ve görev ünvanı yazılı kişilerin görevlendirilmeleri hususunda olurlarınızı saygılarımla arz ederim.


Ecz. M. Nejat ERTÜRK
İdari ve Mali İşl. Dai. Bşk.

UYGUNDUR

09/12/2010

Prof. Dr. Uğur ERDENER
REKTÖR

Prof. Dr. Şuayib YALÇIN
Onkoloji Hastanesi Başhekimisi
Prof.Dr. Fadıl AKYOL
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Macit ARIYÜREK
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Meral KIRAZLI
Onkoloji Hastanesi Müdürü
Demet YILDIZ
Medikal Fizik Uzmanı



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SERMAYE GİDERLERİ
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: 0 (312) 305 1034-2333 - Faks: 0 (312) 311 4390
E-posta: imidb@hacettepe.edu.tr
www.imidbhacettepe.edu.tr

Sayı: B.30.2.HAC.0.73.03.00/ 05/7412

4.5.2010

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü' ne
(Devlet Borçları Saymanlığı)

İlgi: 13.02.2009 tarih ve 06479 sayılı yazınız hakkında

Üniversitemiz 19901001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında tamamı dış kredili olarak 02.04.2001 tarihinde ihalesi yapılan ve Marubeni Europe Plc. firmasından **USD.12.316.800.- ve EUR.16.000.000.** bedelle satın almasına karar verilen " 171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman " tanımlı malzemelerin yurtdışından ithalat yoluyla temini amacıyla 24.10.2005 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Kreditor Kuruluş Citibank International Plc arasında imzalanan kredi anlaşmalarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kredi anlaşması kapsamında Hermes Garantili İhracat Kredisinden karşılanan **2495-5118-38936** finansman no.lu **USD.3.066.061,35 ve EUR.8.665.415,10** tutarlar ile ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanan **2495-5118-38941** finansman no.lu **EUR.4.934.584,90 ve 2495-5118-38944** finansman nolu **USD.7.403.218,65** tutara ilaveten **2495-5118-38937** finansman no.lu **USD.1.847.520 ve EUR.2.400.000** tutarındaki Citibank N.A. Bahreyn Şubesinden sağlanan Ticari kredinin bütçeleştirme işlemi 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2003 tarihinde yürürlüğü giren yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredilerin tamamının bütçeleştirme işlemi yapılmıştır.

5 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi gazetede yürürlüğe giren Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esaslar ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik uyarınca kullanımların teyit edilmesi amacıyla, kredi kapsamında sağladıkları mal ve hizmet karşılıklarını bütçe sistemleri içerisinde ödenek ayırarak muhasebe hesaplarına kaydetmeleri yönetmelik ekinde yer alan (Ek-4)'ler düzenlenerek ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim

Prof. Dr. Uğur ERDENER
Rektör

Memur	: 22.4.10	Ek
Şef	: 22.4.10	Ek
Çi. Md.	: -/-/-	
Başkan Yard.	: 22.4.10	Ek
Başkan	: 22.4.10	Ek
Gen. Sek.	: -/-/-	

EKLER

Eki : 8 Adet Ek-4 formları



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 54 / 11424
Konu :

6.5.2008

İLGİLİ MAKAMA

Üniversitemiz adına Amerika Birleşik Devletleri'nden Bursa Gemlik Limanına HLCUTPA080500023 Konşimento Numarası ve HLXU 4427409, HLXU 6178820, FSCU 6683264 Konteyner no ile gönderilen tıbbi cihazların bilgilerinin bulunduğu Shhipper's Referans no.lu EXIM30042008 konşimentolara imza atmaya Üniversitemiz adına aşağıda tatbik imzası bulunan Üniversitemiz Genel Sekreter Vekili Doç.Dr.Turhan MENTEŞ yetkilidir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Uğur ERDENER
Rektor

Tatbik imzası :
Doç.Dr.Turhan MENTEŞ

İmza	: 5.6.08	et
Ş. Md.	: ---/---/---	
Başkan Yrd.	: 5.6.08	A
Başkan	: ---/---/---	
Gen. Sek.	: ---/---/---	19/6



Shipper:

MARUBENI AMERICA CORP
450 LEXINGTON AVE
NEW YORK, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA
TEL: 212-450-0454/FAX: 212-450-0796

Carrier's Reference: B/L-No.:

14453824

HLCUTPA080500023

Page:

2 / 6

Export References:

01NYOI08601713

EXIM30042008

C. H. B. NO: 1255

Forwarding Agent:

F. M. C. NO: 3778

MARUBENI TRANSPORT SERVICE CORP.
450 LEXINGTON AVE
NEW YORK, NY 10017

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

TO ORDER OF HACETTEPE UNIVERSITY
RECTORATE

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

KEASBEY, NJ

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify, see clause 20 (f) hereof):

1. MARUBENI CORPORATION, ANKARA
ATTN: IBRAHIM KILIC
FAX: 90 312 468 2180
2. INCEKARA A. S.
ATTN: AYLIN KIZILDAG
FAX: 90 312 295 2500

Vessel(s):

ST. LOUIS EXPRESS

Voyage-No.:

07E16

Place of Delivery:

ANKARA, TURKEY

Port of Loading:

NORFOLK, VA

Port of Discharge:

ANTWERP

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages, Description of Goods	Gross Weight:	Measurement:
	3 CNTRS 50 CRATES MEDICAL EQUIPMENT SUPPLY CONTRACT DATED AUGUST 2, 2001 FOR 171 ITEMS OF MACHINERY, MATERIAL AND EQUIPMENT (THE "CONTRACT"). CITIBANK LC NUMBER: 49700575 EXIM BANK GUARANTEE NO. APO81558XX - TURKEY FREIGHT COST FREIGHT PREPAID ST. LOUIS EXPRESS IS OF U. S. REGISTRY	29179.000 KGS	
HLXU 4427409 40' GP SLAC*:26 CRATES		4752.000	
SEALS : 00529 NEUNYOCB00529		KGS	
HLXU 6178820 40' HC SLAC*:15 CRATES		13338.000	
SEALS : 00589 NEUNYOCB00589		KGS	
FSCU 6683264 40' HC SLAC*:9 CRATES		11089.000	
SEALS : 00522 NEUNYOCB00522		KGS	

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier (see clause 11)

COPY

Total No. of Containers received by the Carrier:

3

Packages received by the Carrier:

Movement:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge

Rate

Basis

Amount

P/C

Doc. D. FURNAN MENTES
Genel Sekreteri

Place and date of Issue:

TAMPA, FL

MAY/07/2008

Freight payable at:

TAMPA, FL

Number of original B/Ls:

3

Total Freight Prepaid

21561.10

Total Freight Collect

Total Freight

21561.10

AS CARRIER HAPAG-LLOYD USA, LLC

Carrier: Hapag-Lloyd USA, LLC, Tampa

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Shipper:



Carrier's Reference: B/L-No.:

HLCUTPA080500023

Page:

3 / 6

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

Place of Delivery:

Port of Loading:

Port of Discharge:

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count

SHIPPED ON BOARD, DATE : MAY/01/2008

PORT OF LOADING: NORFOLK, VA

VESSEL NAME ST. LOUIS EXPRESS

Shipper's declared Value (see clause 7(2) and 7(3))

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier (see clause 11)

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

Currency:

Charge Rate

Base

P/C Amount

Doc Dr. Turhan MENTES
Genel Sekreter

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

Freight payable at:

Number of original B/L:

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Shipper:



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: B/L-No.:

HLCUTPA080500023

Page:

4 / 6

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

Place of Delivery:

Port of Loading:

Port of Discharge:

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

FREIGHT PREPAID

NO SED REQUIRED NDR AES X20080429033472

THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE WERE EXPORTED FROM
THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION
REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.
EXPORT LICENSE #: NLR

TURKEY CLAUSE

DEMURRAGE CLAUSE

- GENERALS -

FIRST 10 DAYS (SSHINC) *

FREE

NEXT 10 DAYS (SSHINC) *

USD 8,00/TEU/DAY

NEXT 20 DAYS (SSHINC) *

USD 16,00/TEU/DAY

THEREAFTER

USD 24,00/TEU/DAY

SPECIALS (NOT REEFER) TO ADD 100 PCT ON GENERALS

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility
or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

Currency:

Charge

Rate

P/C Amount

Doc. Dr. Turhan MENTES
Genel Sekreter

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below at of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

Freight payable at:

Number of original Bs/L:

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Carrier: Hapag-Lloyd USA, LLC, Tampa

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Shipper:



Hapag-Lloyd

Carrier's Reference:

B/L-No.:

Page:

HLCUTPA080500023

5 / 6

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

Place of Delivery:

Port of Loading:

Port of Discharge:

Container Nos., Seal Nos.; Marks and Nos.

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

FIRST 3 DAYS (SSHINC) *
NEXT 10 DAYS (SSHINC) *
THEREAFTER

- REEFERS -
FREE
USD 35,00/TEU/DAY
USD 70,00/TEU/DAY

*) SSHINC = SATURDAYS, SUNDAYS RESP. WEEKEND RESTDAYS AND OFFICIAL
HOLIDAYS INCLUDED.

THE DEMURRAGE PERIOD TO COUNT FROM THE DAY OF DISCHARGE UNTIL
THE DAY ON WHICH THE CONTAINER(S)
BEING RETURNED TO THE CARRIER'S TERMINAL EMPTY

PORT STORAGE TO BE SETTLED BY RECEIVER DIRECTLY WITH LOCAL AUTHORITIES
AS PER COUNTRY REGULATIONS.

REEFER PLUG-IN, MONITORING AND ELECTRICITY COSTS TO BE SETTLED BY
RECEIVER DIRECTLY WITH LOCAL AUTHORITIES AS PER COUNTRY
REGULATIONS.

Shipper's declared Value (see clause 7(2) and 7(3))

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility
or warranty as to correctness by Carrier (see clause 11)

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

Currency:

Charge

Rate

Basis: Lww/Vol/Vol

P/C Amount

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

Freight payable at:

Number of original B/L:

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Doc. Dr. Turhan MENTES
General Manager

Shipper:



Carrier's Reference: B/L-No.:

Page:

HLCUTPA080500023

6 / 6

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):

Voyage-No.:

Place of Delivery:

Port of Loading:

Port of Discharge:

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.

Number and Kind of Packages, Description of Goods

Gross Weight:

Measurement:

FREE OUT TERMS.

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
ORIGIN LANDFREIGHT	1265.00	CTR	1	USD	3795.00	
FUEL SURCH OLF	22.00	PCT	1265.00	USD	834.90	
TMNL SECURITY ORIG	5.00	CTR	1	USD	15.00	
CHASSIS USAGE ORIG	40.00	CTR	1	USD	120.00	
CARR. SECURITY FEE	7.00	CTR	1	USD	21.00	
SULPHUR FUEL SURCH	18.00	CTR	1	USD	54.00	
BUNKER CHARGE	1504.00	CTR	1	USD	4512.00	
CAF	12.00	PCT	2100.00	USD	756.00	
DESTIN LANDFREIGHT	1554.00	CTR	1	USD	4662.00	
FUEL SURCH DLF	10.00	PCT	1554.00	USD	466.20	
DOCUMENT FEE	25.00	BIL	1	USD	25.00	
LUMPSUM				USD	6300.00	

Shipper's declared Value (see clause 7(2) and 7(3))

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier (see clause 11)

Total No. of Containers received by the Carrier:

Packages received by the Carrier:

Movement:

Currency:

Charge

Rate

Basis

W/M/V

P/C

Amount

Doc. Dr. Tuhap MENTES
Genel Sekreter V.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

Freight payable at:

Number of original Bs/L:

Total Freight Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

For Account And Risk Of: HACETTEPE UNIVERSITY RECTORATE ANKARA -TURKEY End Destination: HACETTEPE UNIVERSITESI REKTORLUGU ANKARA-TURKEY		Invoice No.: EXIM30042008 Date / Datum: 30 th April 2008 Our Reference: HU-APR-08-EXIM LC Number: 49700575 ✓ EXIM BANK GUARANTEE NO. APO81558XX - TURKEY	
Shipped from: NORFOLK VIRGINIA, USA	Mode of Transport: OCEAN CONTAINER	Contract No:	Contract Date: 02.08.2001

In respect of the above-referenced Contract signed on 02.08.2001
We hereby request you to pay the following sum to us

CORRESPONDING TO PARTIAL SHIPMENT OUT OF
SUPPLY CONTRACT DATED AUGUST 2, 2001 FOR 171 ITEMS OF MACHINERY,
MATERIAL AND EQUIPMENT. (THE "CONTRACT")

Acquisition List No.	HU Master File Item No.	Item Code	Description (English)	Qty	Model	No. of pcs	USD
16	150	TRP1	Linear accelerator Made in U.S.A.	2	Clinac dhx high performance	44	2,551,020.00
16	153	TRP4	Treatment planning system Made in U.S.A.	1	Eclipse Dx Tps	4	397,959.00
16	155	TRP6	Brachtherapy system, high level dosing Made in Denmark	1	Gammamed Plus- Hdr	2	306,122.00
Total for ANKARA							3,255,101.00

USD TOTAL

3,255,101 USD

AMOUNT PAYABLE (UNDER LC No. 49700575)


2,766,835.85 USD

[= 85% x 3,255,101.00 USD]

CASH PAYMENT OF 15% HAS BEEN RECEIVED AND DEDUCTED FROM THE GROSS
INVOICE VALUE

Invoiced item(s) appear on the acquisition list approved by EXIM Bank

For and on behalf of
Marubeni America Corporation


Transportation Machinery Unit





HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ


İslam Kalkınma Bankası Onkoloji Hastanesi Projesi

Tarih :

Sayı :


REKTÖRLÜK MAKAMI'NA

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi'nin ihtiyacı olan ilişik liste muhteviyatı 179 kalem Tıbbi Cihaz, Ekipman, Makine ve Teçhizatın anahtar teslimi olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.Maddesi (p) fıkrası uyarınca tamamının Dış Kredili olarak satın alınması hususunda müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.



Mehmet ÖZEN

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı



UYGUNDUR
11.12/2000

Prof.Dr.Tunçalp ÖZGEN
REKTÖR

İşin Nev'i	: İlişik Liste
Proje Numarası	: 90 I 001 900
Harcama Kalemi	: Tamamı Uluslararası Dış Krediden karşılanacaktır.
İhale Usulü	: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.Maddesi (p) fıkrası uyarınca
Avans ve Fiyat Farkı	: Avans ve Fiyat Farkı verilmeyecektir.
Tahmin Edilen Bedel	: Bedel tahmini yapılmayacaktır.
İlan Şekli	: Resmi Gazete'de bir kez ilan edilecektir.
Teminat	: Teminat Alınacaktır.
Sözleşme	: Yapılacaktır. ✓
Şartname Bedeli	: <u>3.000.000.000.-TL.</u>

TUTANAK

KOD	MALIN CİNSİ	GİDEN
CGF 587-1	574 HEPA FİLTRE KUTUSU	14 ADET
H13	574*574*78 HEPA FİLTRE	14 ADET
CGF 470-1	457 HEPA FİLTRE KUTUSU (-9)	50 ADET
H13	457*457*78 HEPA FİLTRE 24	59 ADET
EKA-NIS	200 LÜK 4 KW ZON ISITICI	18 ADET
EKS	500*300 6 KW ZON ISITICI	3 ADET
SVR/E/DS/A	400/300 VAV	2 ADET
SVR/E/-A	400/300 VAV	3 ADET
SVR/M	DN 100 CAV	17 ADET
SVR/A	DN 160 VAV	41 ADET
SVR/A	DN 200 VAV	22 ADET
SVR/DS/A	DN 200 VAV	17 ADET
RKT/M	400/300 SHUT-OFF DAMPER	6 ADET
BDEP-4-020	SHUT-OF DAMPER Q 200	17 ADET
BDEP-4-016	SHUT-OF DAMPER Q 160	17 ADET

171 kalem Dış kredili alım ihalesi Sıra No:175 HKS1 Hijyenik Klima Sistemi için WEISS (Beyaz Teknik) tarafından Erişkin Hastanesi merkez depolarına teslim edilen yukarıda adı ve miktarı belirtilen malzemeler Onkoloji Hastanesi deposur teslim alınmıştır.

Firma tarafından getirilen listede belirtilen 14 adet 574 DİFÜZÖR, 9 adet CGF 470-1 457 HEPA FİLTRE KUTUSU, 59 adet 457 DİFÜZÖR eksik olduğu tespit edilmiştir.

Mercü KIRAZLI
Onkoloji Hast. Md. Yrd.

Fırat KARASAHİN
Yapı İşleri İşletme Bakım Onarım Md.

Ergülü AKAGÜNDÜZ
Erişkin Hast. Destek Hizmetleri

Muhammed Bilal AKGÜL
Beyaz Teknik Yetkilisi

Arma tarafından getirilen liste

İnce Kızlar Sineam Hanım 0533 250
Sarımsak Lalat Bey 0532 750

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HAST. TESLİMİ

KOD	MALIN CİNSİ	MİKTAR	GİDEN
CGF 587-1	574 HEPA FİLTRE KUTUSU	14	14
H13	574*574*78 HEPA FİLTRE	14	14
574	DİFÜZÖR.....	14	14
CGF 470-1	457 HEPA FİLTRE KUTUSU	59	59
H13	457*457*78 HEPA FİLTRE 24	59	59
457	DİFÜZÖR.....	59	59
EKA-NIS	200 LÜK 4 KW ZON ISITICI 10	18	18
EKS.	500*300 6 KW ZON ISITICI 3	3	3
SVR/E/DS/A	400/300 VAV	2	2
SVR/E/-/A	400/300 VAV	3	3
SVR/M	DN 100 CAV	17	17
SVR/A	DN 160 VAV	41	41
SVR/A	DN 200 VAV	22	22
SVR/DS/A	DN 200 VAV	17	17
ZL-2/B	160 SHUT-OFF DAMPER	17	17
ZL-2/B	200 SHUT-OFF DAMPER	17	17
RKT/M	400/300 SHUT-OFF DAMPER 6	6	6

→ yok

→ 9 adet eksik

→ yok

→ isimler farklı

→ isimler farklı

39

İnce Kırklar Sineam Hanım 0533 2500
Sarımsak Lalat Bey 0532 7537

28
19
47

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HAST. TESLİMİ

KOD	MALIN CİNSİ	MİKTAR	GİDEN
CGF 587-1	574 HEPA FİLTRE KUTUSU	14	14
H13	574*574*78 HEPA FİLTRE	14	14
574	DİFÜZÖR.....	14	14
CGF 470-1	457 HEPA FİLTRE KUTUSU (-9)	59	59
H13	457*457*78 HEPA FİLTRE 24	59	59
457	DİFÜZÖR.....	59	59
EKA-NIS	200 LÜK 4 KW ZON ISITICI 18	18	18
EKS	500*300 6 KW ZON ISITICI 3	3	3
SVR/E/DS/A	400/300 VAV	2	2
SVR/E/-/A	400/300 VAV	3	3
SVR/M	DN 100 CAV	17	17
SVR/A	DN 160 VAV	41	41
SVR/A	DN 200 VAV	22	22
SVR/DS/A	DN 200 VAV	17	17
ZL-2/B	160 SHUT-OFF DAMPER	17	17
ZL-2/B	200 SHUT-OFF DAMPER	17	17
RKT/M	400/300 SHUT-OFF DAMPER 6	6	6

CGF 470-1 457 Hepa filtre kutusu 50 Adet

BDEP-4-020

BDEP-4-016

Shut-off Damper 200

u u x Q 160

17 Adet

17 Adet

TUTUMAK

Waga klima saathallanina ait assagda kodlari ystan
Waga mikroblanai na ypdimai kontaktlari kontrol odilnalk
Waga firma (Byge Toknik) toaffandan toallim alimayth

①	Waga	750-342	atlamat	4 adit
②	Waga	750-559	4 AD 0-10VDC	5 adit
③	Waga	750-517	00250V AC 4.0A. Rel. 2CO Rdt-Fra	13 adit
④	Waga	750-430	8 DI 24V DC	7 adit
⑤	Waga	750-600	End Module	3 adit

Toallim Aba

Boyer Toknik
M. Bilal AKGUL

Toallim Ebn

Yasir Deniz


TUTANAK

Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilmiş olan malzemeler, H.Ü. Onkoloji Hastanesi Müdürlüğü'nden teslim alınmıştır.

<u>MALZEMENİN CİNSİ</u>	<u>ADEDİ</u>
HYGRSTAT	2 ADET
LAZTİK TAKOZ	2 PAKET
DAMPER MOTORU	2 ADET
NEMLENDİRİCİ BORUSU	2 ADET
ANA ŞALTER	2 ADET
GEBERİT	4 ADET
KANAL TİPİ SENSÖR	2 ADET
ISI – NEM SENSÖRÜ	2 ADET
ISI SENSÖRÜ	2 ADET
BASINÇ FARK PROSİTATI	6 ADET
BASINÇ SENSÖRÜ	4 ADET
FİLTRE VALF	2 ADET
1¼" KÜRESEL VANA	4 ADET
1¼" PİSLİK TUTUCU	2 ADET
NEMLENDİRİCİ DİRENAJ HORTUMU	2 ADET (4 Metre)

İş bu tutanakla aşağıda adları ve imzaları bulunanlar tarafından 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir. 30.03.2011

TESLİM EDEN

Turgut Polat


TESLİM ALAN

Ayhan Beher



TUTANAKTIR

Müteahhit SOMUT SOĞUTMA Mutf. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti taahhüdünde yapımı devam etmekte olan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 3.Kat havalandırma tesisatı imalatı için aşağıda yazılı malzeme teslim alınmıştır.

<u>S. NO:</u>	<u>MALZEMENİN CİNSİ</u>	<u>MİKTARI</u>
1	HEPA KUTUSU 457*457*78	(Üç) 3 ADET
2	HEPA KUTUSU 574*574*78	7 ADET
3	VAV Ø200	(Yedi) 7 ADET
4	SD 400/300	1 ADET
5	VAV Ø160	12 ADET
6	NEMLENDİRİCİ	(Üç) 3 ADET

İş bu tutanak aşağıda adları ve imzaları bulunanlar tarafından 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir.28.03.2011

TESLİM EDEN

TURGUT POLAT


TESLİM ALAN

BURHAN GÜLHAN



TUTANAKTIR

Müteahhit SOMUT SOĞUTMA Mutf. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti taahhüdünde yapımı devam etmekte olan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 4.Kat havalandırma tesisatı imalatı için aşağıda yazılı malzeme teslim alınmıştır.

S. NO: MALZEMENİN CİNSİ

1 HEPA KUTUSU 457*457*78

MIKTARI

7 ADET

İş bu tutanak aşağıda adları ve imzaları bulunanlar tarafından 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir. 02.03.2011

TESLİM EDEN

Ekrem Ateşoğlu


TESLİM ALAN

BURHAN GÜLHAN





TUTANAKTIR

Müteahhit SOMUT SOĞUTMA Mutf. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti taahhüdünde yapımı devam etmekte olan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 4.Kat havalandırma tesisatı imalatı için aşağıda yazılı malzemeler teslim edilmiştir.

S. NO: MALZEMENİN CİNSİ
1 HEPA KUTUSU 457*457*78
2 Ø100 CAV SRV/M

MİKTARI:
32 ADET
17 ADET

İş bu tutanak aşağıda adları ve imzaları bulunan taraflardan 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir. 01.02.2011

TESLİM EDEN

Ekrem Ateşoğlu


TESLİM ALAN

BURHAN GÜLHAN




29.06.2011

TATANAK

Apaqida Crasi ve miktari yaqli olan malszmeder farafumizadan teslim alinmishir

- 1- Hg80! Higrosstat 2. Adet
- 2- 151 Nem Sensore kanal tip 2 Adet
- 3- 151 Sensore kanalli tip 2 Adet
- 4- Psiklik tutucu nemlendiriciler. 2 Adet
- 5- Nemlendiriciler borusu (distribution) 2 Adet
- 6- Valdirhma tip Sensore
- 7- Pako Salder
- 8- Lastik haloz
- 9- Park basin prostat
- 10- basins Sensore
- 11- Gebert (Siron)
- 12- Psiklik tutucu 840
- 13- Psiklik tutucu 25
- 14- Kresed Vana 1"
- 15- Kresed Vana 1 1/2
- 16- Dampir

- 2 Adet
- 2 Adet
- 2 Adet
- 1 Adet
- 1 Adet
- 1 Adet
- 4 Adet
- 1 Adet
- 2 Adet
- 2 Adet
- 2 Adet
- 2 Adet
- 2 Adet
- 2 Adet

Teslim Alın
Ayken Bekar

Teslim Eden
Chf



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürü

178-S.No
Akr. hesabı
Kapanış

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 21/5762
Konu :

17/11/2005

T.C.
MERKEZ BANKASI
Ankara Şubesi
(Dış Ticaret Servisine)

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi'nin (II.Kısım) finansmanı amacıyla 02.04.2001 tarihinde Marubeni Europe Plc. Dusseldorf firmasından satın alınmasına karar verilen "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman " tanımlı malzemelerle ilgili olarak 24.10.2005 tarihinde Citibank International Plc ile kredi anlaşması imzalanmıştır.

Söz konusu 24.10.2005 tarihindeki anlaşma ile Hermes Garantili İhracat kredisinden karşılanarak, 2007 ve 2008 yıllarında 01156AKR44749, no ile akreditifi açılan USD.3.066.061,35 ve EUR.8.665.415,10 tutarındaki malzemelerin Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden ithalat işlemleri tamamlanmıştır.

Bu nedenle ilgili ithalat işlemimize ait USD.3.066.061,35 ve EUR.8.665.415,10 tutarındaki taahhüt hesabımızın kapatılması hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.

Prof.Dr. Uğur ERDENER
Rektör

7 5 0 9 d

7 5 0 9 d
01 05 09

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : TL 25.000
İDARE MERKEZİ : ANKARA

087968

ANKARA ŞUBESİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

ANKARA, 20 MAYIS 2009

B.02.2.TCM.4.06.00.01

Konu:01156AKR44749 No.lu Akreditif.

T.C.HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SERMAYE GİDERLERİ SATINALMA ŞB. MD.
06100 SİHİYE/ANKARA

TAAHÜTLÜ

İLGİ : 12.05.2009 tarih, B.30.2.HAC.0.70.73.03/21/8762 sayılı yazınız

Şubemiz kanalıyla açılmış olan 01156AKR44749 no.lu USD.3.066.061,35' lık ve EUR.8.665.415,10'luk akreditifinize ait ithalat hesabınız ilgi yazınız uyarınca kapalıdır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Ankara Şubesi

Gülden UZ
Kısmi Amiri

EK : 2 Zarf (Beyanname Asılları ve Diğer Belgeler)

156/LT

0912



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Genel yazı

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 73/12076
Konu :

18/7/2006

T.C.
BASBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı
(Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne)

İlgi : 4 Temmuz 2006 tarih ve 1599 sayılı yazınız hk.

Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı Projesi ile ilgili Müsteşarlığınız tarafından 20 Temmuz 2006 günü saat 14.30'da yapılacak olan toplantıya Üniversitemiz adına aşağıda isim ve ünvanı belirtilen yetkili katılacaktır.
Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Prof.Dr.Erol BELGİN
Rektör Vekili

Adı Soyadı :
Prof.Dr.Tezer KUTLUK

Ünvanı :
Onkoloji Hastanesi Başhekim

T.C.
BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı

24 TEMMUZ 2006

İVEDİ-SÜRELİ

Sayı : B.02.1.HM.0.DEİ.05.02.-02.03/1599
Konu : Kredi anlaşmaları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

17.07.06* 38135

Üniversiteniz tarafından yürütülmekte olan Onkoloji Hastanesi Makina ve Teçhizat Alımı Projesinin finansmanı amacıyla 24.10.2005 tarihli anlaşma ve ek mektup ile Citibank N.A.'dan 7.403.218,65 ABD Doları tutarında ABD Exim garantili ihracat kredisi, 24.10.2005 tarihli anlaşma ve ek mektup ile Citibank N.A.'dan 4.934.584,90 Avro tutarında ABD Exim garantili ihracat kredisi, 24.10.2005 tarihli anlaşma ve ek mektup ile Citibank International Plc'den 3.066.061,35 ABD Doları ve 8.665.415,10 Avro tutarında Hermes Garantili İhracat Kredisi ile 24.10.2005 tarihli anlaşma ile Citibank N.A. Bahreyn Şubesi'nden 1.847.520 ABD Doları ve 2.400.000 Avro tutarında ticari kredi sağlanmış olup, krediden kullanımlar henüz başlamamıştır.

Bilindiği gibi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile anılan Kanunda değişiklik yapılmasına dair 5436 sayılı Kanun hükümleri gereğince, anılan Kanunun II-(A) sayılı cetvelinde yer alan ve Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler olarak tanımlanan devlet üniversitelerinin, Müsteşarlığımızın Türkiye Cumhuriyeti adına borçlu olarak imzaladığı dış krediler ile finanse edilen projeleri kapsamında, 01.01.2006 tarihinden itibaren yapılan tüm kullanımlarının, ilgili üniversiteye ikraz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, 01.01.2006 tarihinden önce sağlanmış ve 01.01.2006 tarihinden sonra sağlanması planlanan tüm dış krediler tahtında, diğer bir ifadeyle kredi anlaşması imza tarihinden bağımsız olmak üzere, 01.01.2006 tarihinden sonra ilgili krediden gerçekleştirilmesi planlanan tüm kullanımların, bahse konu üniversiteye ikraz edilerek yapılması ve yapılan kullanım bazında doğan tüm masraflar ile birlikte, anılan üniversitenin Müsteşarlığımıza borçlandırılması gerekmektedir.

Öte yandan, üniversite projelerinin finansmanı amacıyla 01.01.2006'dan önce imzalanmış dış kredi anlaşmalarından yapılan kullanımların, ikraz edilmesi yerine geçmişte olduğu gibi, üniversitelere tahsis edilerek kullandırılmasına devam edilebilmesi amacıyla gerekli kanun değişikliği çalışmaları halihazırda sürmektedir.

Bu bilgiler ışığında, 01.01.2006 tarihinden itibaren yapılmış olan ve yapılması planlanan kullanımlar çerçevesinde, 20 Temmuz 2006 Perşembe günü saat 14:30'da Müsteşarlığımız 15. Katında bir toplantı düzenlenecek olup, bahse konu toplantıya kurumunuzdan üst düzey yetkililerin katılımının sağlanması ve katılacak yetkililerin isim ve ünvanlarının 18 Temmuz 2006 Salı günü mesai saati bitimine kadar Müsteşarlığımıza bildirilmesi (Faks: 212 85 50) hususunda gereğini rica ederim.

Memduh Aslan AKÇAY
Müsteşar
Genel Müdür

Kredi Anlaşması

T.C.
BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı

30.12.05* 72108

Sayı : B.02.1.HM.0.DEİ.05.02/SAĞLIK/2911
Konu : Kredi anlaşmalarının yürürlüğe girmesi

30 Aralık 2005

COK İVEDİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, Üniversiteniz tarafından yürütülmekte olan Onkoloji Hastanesi Makina ve Teçhizat Alımı Projesinin finansmanı amacıyla 24.10.2005 tarihli anlaşma ve ek mektup ile Citibank N.A.'dan 7.403.218,65 ABD Doları tutarında ABD Exim garantili ihracat kredisi, 24.10.2005 tarihli anlaşma ve ek mektup ile Citibank N.A.'dan 4.934.584,90 Avro tutarında ABD Exim garantili ihracat kredisi, 24.10.2005 tarihli anlaşma ve ek mektup ile Citibank International Plc'den 3.066.061,35 ABD Doları ve 8.665.415,10 Avro tutarında Hermes Garantili İhracat Kredisi ile 24.10.2005 tarihli anlaşma ile Citibank N.A. Bahreyn Şubesi'nden 1.847.520 ABD Doları ve 2.400.000 Avro tutarında ticari kredi sağlanmıştır.

Söz konusu Kredi Anlaşmaları kapsamında kreditor bankadan alınan yazılarda kredi anlaşmalarının yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.



Serdar GÜZEY
Müsteşar a.
Daire Başkanı

Malzeme Geliş
Tarihleri:

	HU	
FINANCING	EURO	US\$
USEXIM	€4,934,584.90	\$7,403,218.65
HERMES	€8,665,415.10	\$3,066,061.35
COMMERCIAL	€2,400,000.00	\$1,847,520.00
CONTRACT	€ 16.000,000	\$12.316,800
2005/2006 ORDER	€ 14.521,908	\$11.263,406
2008 BALANCE	€ 1.478,092	\$1.053,394

SHIPMENT UNDER 2005-2006 ORDER

INVOICE DATE	HERM € 9.175.692,00	HERM \$3.346.141,00	USEXIM € 5.346.216,00	USEXIM \$7.917.265,00
13.07.2007	€ 41.881,00	\$1.047.752,00		
31.07.2007	~~€ 1.266.496,00~~ € 289.201,00	S.W.O - 178		
	€ 98.821,00			
22.08.2007	€ 210.000,00			
	€ 3.457.992,00	\$1.809.826,00		
	€ 560.988,00			
12.10.2007	€ 689.664,00			
19.10.2007	€ 778.386,22	\$85.711,72		
	€ 1.506.675,29	\$232.627,28		
06.12.2007			€ 1.248.571,00	
18.12.2007			~~€ 280.928,00~~	
18.12.2007			~~€ 3.810.073,00~~	
08.01.2008				\$3.418.355,00
08.01.2008				\$494.931,00
10.03.2008	€ 159.028,68			
10.03.2008		\$31.104,00		
10.03.2008	€ 86.291,55	\$139.120,00		
10.03.2008	€ 30.267,26			
30.04.2008				\$3.255.101,00
17.06.2008				\$553.760,00
17.06.2008				\$75.085,00
09.12.2008			€ 6.643,00	\$51.461,00
TOTAL SHIPPED	€ 9.175.692,00	\$3.346.141,00	€ 5.346.216,00	\$7.917.265,00
BAL UN-SHIPPED	€ 0,00	\$0,00	€ 0,00	\$0,00

cclld

SHIPMENT UNDER 2008 ORDER

INVOICE DATE	HERM € 1.018.914,00	HERM \$260.990,00	USEXIM € 459.178,00	USEXIM \$792.404,00
26.11.2008	€ 671.349,00	\$260.990,00		
	€ 342.639,00			
05.12.2008	€ 4.926,00			
09.12.2008			€ 459.178,00	\$705.669,00
TOTAL SHIPPED	€ 1.018.914,00	\$260.990,00	€ 459.178,00	\$792.404,00
BAL UN-SHIPPED	€ 0,00	\$0,00	€ 0,00	\$0,00

cclld



ONAY BELGESİ

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BELGE TARİH VE SAYISI	14.08.2008-021
HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ'NE	
İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER	
İŞİN TANIMI	171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipmanların KDV bedeli
İŞİN NİTELİĞİ	USD.12.316.800 ve EUR.16.000.000 "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman"
İŞİN MİKTARI	171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman
Yaklaşık Maliyet	4.200.00 YTL
Kullanılabilir Ödenek Tutarı	5.712.600,00 bin YTL
Yatırım Proje Numarası (varsa)	1990 I 001900
Bütçe Tertibi (varsa)	38 04 38 32 07 3 2 00 2 06 1 2 03
Avans Verilecekse Şartları	---
İhale Usulü	---
İlanın Şekli ve Adedi	---
Ön Yeterlik / İhale Dokümanı Satış Bedeli	---
Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı	---
Bakanlar Kurulu Kararı	---

İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz 2008 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 1990 I 001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı" (II.kısım) Projesi kapsamında Marubeni America Corporation New York. Firmasından satın alınmasına karar verilen "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman" tanımlı malzemeler için Citibank International Plc'den sağlanan EUR.4.934.584,90 ve USD.7.403.218,65'lik ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanarak İstanbul Erenköy Gümrük Müdürlüğünden ithalat işlemlerine başlanan 13/08/2008 tarih ve IM116789 Gümrük Giriş Beyanname Muhteviyatı malzemelerin Ardiye ücreti bedeli olan 4.200.00 YTL'nın İmser Lojistik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketinin Garanti Bankası Üst Bostancı Şubesinde bulunan (İstanbul) (356) 6298502 no.lu hesabına 2008 Mali Yılı Bütçemizin 38 04 38 32 07 3 2 00 2 06 1 2 03 harcama tertibinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na ödenmesini;

ONAY

Onaylarınıza arz ederim 14/08/2008 Ecz. M. Nejat ERTÜRK İdari ve Mali İşl. Dai. Bşk.	Uygundur 14/08/2008 Prof. Dr. M. Tezer KUTLUK Hast. Gen. Direk.

Momut	14/8/08	01
Def		
St. M.		
Gen. M.		
Gen. Sek.		

GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİSİ KULLANIM İZİN BİLDİRİM FORMU*

KULLANICI KURULUŞ

KURULUŞ ADI	H.Ü. REKTÖRLÜĞÜ	İLGİLİ MERKEZ SAYMANLIĞI KODU:	6754
KULLANICI BİRİM	ONKOLOJİ HASTANESİ	KUL.KUR.BÜTÇE KODU:	38 04
DIŞ FİNANSMAN KODU		2495-5118-38941	
DIŞ FİNANSMAN NUMARASI		38941	

EK BİLGİLER

PROJE DPT YT.PRG.ADI	ONKOLOJİ HAST.MAK. VE TEÇH. ALIMI	PROJE DPT YT. PRG. KODU	1990 1 00 1900
İŞİN/PROJE ADI	H.Ü. ONKOLOJİ HASTANESİ PROJESİ (II.KISIM) - (171 KALEM MAKİNA,MALZEME VE EKİPMAN ALIMI)		
KREDİTÖRÜN ADI	CITIBANK N.A.		
ANLAŞMA TUTARI VE DÖVİZİ	EUR 4.934.584,90	ANLAŞMA TARİHİ	24.10.2005
EK ANLAŞMA TUTARI		İPTAL TUTARI	
CARİ ANLAŞMA TUTARI		KULLANIM SAYISI	0
TOPLAM KULLANIM TUTARI	0	KULLANILABİLECEK TUTARI	EUR 4.934.584,90

KULLANIM EMRİ VERİLECEK KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

SAĞLANAN MAL VE HİZMET BEDELİ (Bütçe Gideri Kaydına Esas Alınacak) VEYA			
ALINACAK MAL VE HİZMET BEDELİ (Avans verilmesi, Akreditif açılması)			EUR 390.304,30
AKREDİTİF AÇILACAK İŞE TOPLAM TUTAR	EUR 390.304,30	AKREDİTİFİN KAÇ YILDA KULLANILACAĞI	3
CARİ YILDA KULLANILACAK BÜTÇELEŞTİRMeye ESAS ALINACAK TUTAR			4.580.000,00 YTL
KULLANIM EMRİ VERİLECEK TUTARI	EUR 390.304,30	T.C.M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU	2,0568
KULLANIM EMRİ VERİLECEK TUTARI (YTL):	802.771,72		

YÜKLENİCİ VEYA MAL VE HİZMET SAĞLAYANA AİT BİLGİLER

YÜKLENİCİ ADI/ÜNVANI	MARUBENİ AMERICA CORPORATION	YÜKLENİCİ ÖLKESİ	ABD
FİLİ İTHALTARİHİ		VERGİ SİCİL NO	133 / 5951 / 0075
HAKEDİŞ VE FATURA NO	22.10.2005- FE221205-04		

YUKARIDA YER ALAN BİLGİLERİN UYGUNLUĞU TASDİK OLUNUR

14/04/2008 Prof.Dr.Tekin DİNCER İşletme Müdürü	14/04/2008 Prof.Dr.M.Tezer KUTLUK Hastaneler Genel Direktörü	14/04/2008 Prof.Dr. Uğur ERDENER Rektör

ÖDENEĞİ MEVCUTTUR.

14/04/2008
Murat KARAAGAC
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

KULLANICI KURULUŞ MERKEZ SAYMANLIĞI

HASEBE KAYDI YEVMİYE NO	2008 / 9607
YEVMİYE TARİHİ	14.04.2008
TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU	2,0568
BORÇ KAYDEDİLEN HESAP ADI	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları
	Avans ve Akreditifleri Hesabı
TUTARI	802.771,72 YTL

BÜTÇELEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLUP, DIŞ FİNANSMAN KAYNAĞINA KULLANIM EMRİ VERİLEBİLİR.

SAYMAN

İMZA

14/04/2008

Semih Sertan GENLİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

DEVLET BORÇLARI SAYMANLIĞI

	YEVMİYE KAYDI YAPILMIŞTIR.	
YEVMİYE KAYIT NO	SAYMAN	
	İMZA	
YEVMİYE TARİHİ	TARİH	
	AD SOYAD	

(*) Her Bir Kullanım İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır.

NOT: GİBİDİR
a. ve b. İş. Dai. Bşk. Yrd.

T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 82
Konu : Onay Belgesi

241.41...98

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Üniversitemiz 1990I001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında tamamı dış kredili olarak temin edilen krediden 02.04.2001 tarihinde satın almasına karar verilen **“171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman“** tanımlı malzeme ile ilgili düzenlenen USD.12.316.800 ve EUR.16.000.00 tutarlık sözleşme gereği Citibank N.A’dan temin edilen USD.1.847.520, EUR.2.400.000 tutarlık Ticari Kredi , USD.3.066.061,35, EUR.8.665.415,10 tutarlık Hermes Garantili İhracat Kredisi ve USD.7.403.218,65, EUR.4.934.584,90 tutarlık ABD Exim Garantili İhracat Kredisi anlaşmaları 24.10.2005 tarihinde imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında Marubeni Europe plc Dusseldorf Branch firmasının 19/12/2006 tarih FE191206-03 no'lu faturaya istinaden düzenlenen 20/12/2006 tarih ve 36273 yevmiye no'lu USD 3.496.22,55 tutarlık Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar Doğrudan Dış Proje Kredisini Kullanım İzin Bildirim Formu Ek-2 ile muhasebeleştirme işlemi yapılan ve ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanarak Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Yurt dışında akreditifi açılan malzemelerden faturanın 148 sırasında bulunan 68.572,00 USD tutarındaki 4 adet Aferez cihazı ile ilgili olarak Marubeni Europe plc London firmasından alınan 07/04/2008 tarihli yazılarında (KIU-13) Baxter marka CS-300 Plus model Aferez cihazının 2001 yılında imzalanan sözleşmeden bu yana geçen sürede üretimden kalktığını ve aynı teknik özelliklere haiz başka bir cihazın mevcut olmadığından bahsetmektedirler.

Bu nedenle Üniversitemizden faturanın 148. sırasında bulunan Aferez Cihazının iptalini ve 19/12/2006 tarih ve FE191206-01 nolu faturaya istinaden düzenlenen 20/12/2006 tarih ve 36277 nolu %15 'lık kısmına tekabül eden 771.924,15 USD tutarındaki Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin Bildirim Formu Ek-2 ile toplam olarak muhasebeleştirilmesi yapılan 148. sıradaki 68.572,00 USD tutarındaki 4 adet Aferez cihazının %15 'lık kısmı olan 10.285,80 USD tutar ile buna tekabül edecek olan banka masraflarının verilecek olan banka hesap numarasına iade edeceklerini bildirmektedirler.

Yukarıda belirtilen nedenlerle söz konusu Aferez cihazının alımından Onkoloji Hastanesi olarak vazgeçilmiş olduğundan Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimde bulunulmasını saygılarımla arz ederim.

Prof.Dr.M.Tezer KUTLUK
Hastaneler Genel Direktörü

QY GUNDUR

~~24/04/2008~~

Prof.Dr.Üğur ERDENER
Rektör

Memor : 12.12.2012
\$ o f : 10.01.02
Sd. Rd. :
Bapak : 10.01.02
H. U. Idari & Mak J
Kontak : (031) 21305
E-posta: iminab@pacc
Ccm. Gattai:

H. Ü. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü 06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: (0 312) 305 10 34 -305 23 33 Faks: (0 312) 311 43 90 E-ğ: www.imidb.hacettepe.edu.tr
E-posta: imidb@hacettepe.edu.tr



ONAY BELGESİ

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI	HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BELGE TARİH VE SAYISI	24.03.2008-011
HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ'NE	
İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER	
İŞİN TANIMI	Ordino bedeli
İŞİN NİTELİĞİ	USD.12.316.800 ve EUR.16.000.000 "171 Kal. Mak., Mlz. ve Ekipman "
İŞİN MİKTARI	171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman
Yaklaşık Maliyet	627,42 YTL
Kullanılabilir Ödenek Tutarı	2,046,00 bin YTL
Yatırım Proje Numarası (varsa)	1990 I 001900
Bütçe Tertibi (varsa)	38 04 38 32 07 3 2 00 2 06 1 2 03
Avans Verilecekse Şartları	----
İhale Usulü	----
İlanın Şekli ve Adedi	----
Ön Yeterlik / İhale Dokümanı Satış Bedeli	----
Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı	----
Bakanlar Kurulu Kararı	
İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR	
Üniversitemiz 2007 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 1990 I 001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı" (II.kısım) Projesi kapsamında Marubeni Europe Plc. Firmasından satın alınmasına karar verilen " 171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman " tanımlı malzemeler için Citibank International Plc'den sağlanan 3.066.061,35 ABD doları ve 8.665.415,10 Euro tutarında Hermes Garantili İhracaat Kredisinden karşılanarak Esenboğa Gümrük Müdürlüğüne gelen malzemelerin Ordino bedeli olan toplam 627,42 YTL'nin Kühnhe Nagel Nakliyat Ltd.Şti. Garanti Bankası Maltepe Şb. (114) 6298976 nolu (YTL) hesabına 2008 Mali Yılı Bütçemizin 38 04 38 32 07 3 2 00 2 06 1 2 03 harcama tertibinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca ödenmesini;	
ONAY	
Onaylarınıza arz ederim 24/03/2008 <i>[Signature]</i> Ecz.M. Nejat ERTÜRK İda.Mali.İşl.Dai.Bşk.	Uygundur 24/03/2008 <i>[Signature]</i> Prof. Dr. M.Tezer KUTLUK Hast.Gen.Direk.



T.C.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü


Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 31/194132
Konu :

01/11/2007

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI'NA
(Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı)
Eskişehir yolu 9.km Lodumlu ANKARA

Üniversitemiz 1990 I 001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı Projesi (II.kısım) kapsamında Marubeni Europe Plc. Firmasından satın alınmasına karar verilen "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman" tanımlı malzemelerle ilgili olarak Marubeni Europe Plc. Dusseldorf Branch firması tarafından Almanya'dan gönderilen "Digital mammography equipment" tanımlı tıbbi malzeme 25.10.2007 tarihinde IM21825 özet beyan no.su ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğüne gelmiş bulunmaktadır.

Söz konusu cihazın Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden ithalat işleminde kullanılmak üzere kurumunuz tarafından Üniversitemize ithal izni yazısının verilmesini saygılarımla rica ederim.


Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör

EKLER :

- Ek: 1 - 19.10.2007 tarih FE191007 no.lu ithalat fatura fotokopisi
- Ek: 2 - İthal harcı için yatırılan 250 YTL Banka dekontu
- Ek: 3 - İthal izni Başvuru formu



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 30/16448
Konu :


01/11/2007



T.C.
MERKEZ BANKASI
Ankara Kambiyo Şubesi'ne
(Dış Ticaret Servisi)

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi'nin finansmanı amacıyla temin edilen USD.3.066.061,35 ve EUR.8.665.415,10 tutarlık Hermes Garantili İhracat Kredisinden Marubeni Europe Plc. firmasından ithal edilecek olan malzemelerle ilgili olarak Şubeniz tarafından 01156AKR44749 no ile akreditifleri açılan "171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman" tanımlı malzemelerin ithalat işlemleri Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden yapılmaktadır.

Söz konusu Akreditifleri açılan malzemelerin Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden ithalat işleminde kullanılmak üzere döviz transfer dekontu olmadığına dair gümrüğe sunulmak üzere yazı verilmesini saygılarımla rica ederim.


Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör

Sn Tezer Hocam,

Ekde ABD'den sevk edilecek GE cihazlarının sevkiyat programı yer almaktadır.

Hava yolu ile sev edilecek olan MRI cihazı için (Ekli çizelgede kırmızı renkle gösterilmiştir) sevkiyat ile Ankara'ya varış tarihi arasında max 14 gün olacak ve bu süre içinde montajının yapılması gerekmektedir.

Cihazların Ankara'ya geliş tarihlerine göre yer hazırlıklarının tamam olacağı hususunu teyid etmenizi rica ederiz.

Ayrıca özellikle deniz yolu ile gelecek cihazların Ankara gümrüğüne geleceği tarih Ocak ayına sarktığı için bu cihazlarla ilgili KDV ve Gümrük vergilerinin 2008 yılına aktarılması için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla
MARUBENİ
İbrahim E. Kilic



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARLARI

OTURUM TARİHİ

OTURUM SAYISI

KARAR SAYISI

07.03.2007

8

2007-313

Hastaneler Genel Direktörlüğü'nün 07.03.2007 tarih ve 3640 sayılı yazılarında, Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi'nin 21.02.2001 tarihinde yapılan 171 kalem tıbbi teçhizat ihalesiyle ilgili olarak, ihalenin gerçekleştirilme tarihinden bugüne kadar geçen uzun zaman ve teknolojinin gelişimine paralel olarak bazı cihazların üretimden kalkması, bazılarının ise daha yeni modellerinin geliştirilmesi nedeniyle bazı değişikliklerin yapılmasının zaruri hale geldiği, firmanın şartnameyi tam olarak karşılamak ve bazı cihazlar için üstün özellikleri de içermek koşuluyla ekli listede verilen ekipmanlarda değişiklikler teklif ettiği, bu değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili birimlerin yazılı görüşünün yanı sıra Maliye Bakanlığı'nun da yazılı görüşü alındığı, bu değişikliklerin Onkoloji Hastanesi Başhekimliği ve Hastaneler Genel Direktörlüğü'nce de uygun olduğu belirtilerek işlemin bu yönde devam etmesi için onay istenmektedir.

Üniversitemizin 1990 I 001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi'nin Uluslararası ihale yoluyla tamamı dış kredili olmak üzere, T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 01.05.1998 tarih ve 23739 sayılı uygunluk yazısına istinaden "171 Kalem Tıbbi Cihaz, Ekipman, Makine ve Teçhizat" tanımlı ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51.maddesi (p) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile 21.02.2001 tarihinde CIF.EURO.16.000.000 ve CIF.USD.12.316.800 bedelle **Marubeni Corporation** firmasına yapılmış, ihale dosyası 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 64 maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlığın 10.07.2001 tarih ve 15543 no.lu yazılarıyla vizesi yapılarak Üniversitemize iade edilmiş, ancak ihale 21.02.2001 yılında yapılmasına rağmen sözleşmeler Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 24.10.2005 tarihinde imzalanmış, kredi anlaşmalarının yürürlüğe girdiği 30.12.2005 tarihinde Üniversitemize bildirilmiş, 5018 sayılı yasanın kredi kullanımı ile ilgili son düzenlemelerinin yapılmasını takiben 30.12.2006 tarihinde akreditiflerin açılması için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na gerekli bilgiler verilmiştir.

ASLI GİDİYOR



Prof. Dr. Erol BELGİN
Genel Sekreter V

./..



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARLARI

OTURUM TARİHİ

07.03.2007

OTURUM SAYISI

8

KARAR SAYISI

2007-313

- 2 -

Görüldüğü gibi ihalenin yapıldığı tarihle (21.02.2001) sözleşmenin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca imzalanarak kredi anlaşmasının yürürlüğe girdiği ve akreditiflerinin açılabilceği (30.12.2006) tarihi arasında yaklaşık 6 yıl geçmiştir. Sözleşme konusu malzeme için hemen her 6 ayda bir değişen ve gelişen teknoloji, bu cihazlardan bazılarının üretimden kalkması, bazılarının ise daha yeni modellerinin geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur.


İhale üzerinde kalan Marubeni Corporation firması, bu kaçınılmaz gelişmeleri göz önüne alarak Üniversitemizle yaptığı değerlendirme sonucunda söz konusu 171 Kalem en son teknolojik özellikleri kapsayan Tıbbi Cihaz, Ekipman, Makine ve Teçhizatın teslimatıyla ilgili liste ve raporunu hazırlamış ve Üniversitemize sunmuştur.

Üniversitemiz Hastaneler Genel Direktörlüğü'nce söz konusu listede değişiklik yapılan cihazları kullanacak, Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden oluşturulan uzman komisyon üyelerince durum değerlendirilmiş bu değerlendirme sonucunda, **"şartnameyi birebir karşılayan, son teknoloji ürünü olan, daha üstün özellikler içeren tıbbi ekipman ve malzemenin herhangi bir fiyat farkı ödenmeksizin"** temin edilmesinin uygun olduğu yönünde görüş belirten ilişik raporlar Rektörlüğümüze sunulmuştur.

Ortaya çıkan bu durum karşısında Maliye Bakanlığının konuya ilişkin görüşüne ihtiyaç duyulmuş bu görüş de Bakanlığın 01.03.2007 tarih ve 3703 sayılı yazısı ile olumlu olarak alınmıştır.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nca "171 Kalem Tıbbi Cihaz, Ekipman, Makine ve Teçhizatın" yukarıda özetlenen gelişmeler ışığında yapılan değişikliklerle sağlanarak Onkoloji Hastanesi'nin kullanımına verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

ASLI GİBİDİR



Prof. Dr. Erol BELGİN
Genel Sekreter V.



SER-8, CER-14, KIU-4

DEFİBRİLLATÖR, MONİTÖRLÜ

2001 Yılındaki ihalede teklif edilen Monitörlü Defibrillatör **NIHON KOHDEN, TEC-7521K Model** dir. Ancak bahse konu olan Monitörlü Defibrillatörün bu modelinin üretimden kaldırılmış olması nedeniyle **Şartnameyi bire bir karşılayan**, LCD ekrana sahip olması, tam şarjlı bir batarya ile peş peşe 70 şok yapabilmesi, Defibrilasyon/Alarm/VF-VT için hafıza özelliği mevcut olup, ayrıca ekranda geri çağınlarak izlenebilmesi mümkün olması, gelişmiş bir batarya test modu mevcut olması gibi **daha üstün özellikler içeren, NIHON KOHDEN, TEC-7621K Model** Monitörlü Defibrillatör herhangi bir fiyat farkı olmaksızın verilecektir.

YOB-4

DEFİBRİLLATÖR, MONİTÖRLÜ

2001 Yılındaki ihalede teklif edilen Monitörlü Defibrillatör **NIHON KOHDEN, TEC-7521K Model** dir. Ancak bahse konu olan Monitörlü Defibrillatörün bu modelinin üretimden kaldırılmış olması nedeniyle **Şartnameyi bire bir karşılayan**, daha üstün özellikler içeren, **NIHON KOHDEN, TEC-7631K Model** Monitörlü Defibrillatör herhangi bir fiyat farkı olmaksızın verilecektir.

SER-10

EKG CİHAZI

2001 Yılındaki ihalede teklif edilen EKG Cihazı **NIHON KOHDEN, ECG-9130K Model** dir. Ancak bahse konu olan EKG Cihazı'nın bu modelinin üretimden kaldırılmış olması nedeniyle **Şartnameyi bire bir karşılayan**, otomatik kayıta çekim süresi ayarlanabilmesi, cihaz herhangi bir aritmi dedekte ettiğinde otomatik kaydın süresi 24 sn.ye kadar uzatılabilmesi gibi **daha üstün özellikler içeren NIHON KOHDEN, ECG-9132K Model** EKG Cihazı herhangi bir fiyat farkı olmaksızın verilecektir.

KAB-5

2001 Yılındaki ihalede teklif edilen Santrifüj, Hemotokrid Cihazı **Heraous Marka, Biofuge Haemo Model** dir. Ancak bahse konu olan Santrifüj, Hemotokrid Cihazı'nın bu modelinin üretimden kaldırılmış olması nedeniyle **Şartnameyi bire bir karşılayan**, daha üstün özellikler içeren son teknoloji ürünü **HERAOUS Marka PIKO-17 Model** Santrifüj, Hemotokrid Cihazı herhangi bir fiyat farkı olmaksızın verilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Benan BAYRAKÇI
Diploma No : 11035
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

29.01.07

Prof. Dr. M. Tezer KUTLUK
H.Ü. Onkoloji Hastanesi
Başhekim



SER-13, CER-13, KIU-7, YOB- 8

HASTA İZLEME SİSTEMİ

2001 Yılındaki ihalede teklif edilen Hasta İzleme Sistemi **AGILENT TECH., VIRIDIA Model** dir. Ancak bahse konu olan Hasta İzleme Sistemi'nin bu modelinin üretimden kaldırılmış olması nedeniyle **Şartnameyi bire bir karşılayan, 800x600 piksel TFT LCD** ekrana sahip olması, **fansız** özel soğutma sisteminin mevcut olması ve kullanıcının değiştirmesi gereken filtre ve benzeri sarf malzemeler bulunmaması, BIS, EEG, C.O, CO2, IBP gibi ölçümlerin eklenebilmesi, ekranın split screen özelliği ile ölçülen parametrenin hızında 30 dakikalık trend bilgisi de görüntülenebilmesi, monitörde ekran trendlerinin yanısıra monitörizasyon datasının son 10 dakikasını değerlendirerek, ayarlanan baseline'a göre hastanın durumundaki değişiklikleri gösteren özel **"horizon view"** denilen trend özelliğinin bulunması, **ST Map** özelliği ile ST segment verileri numerik değerlerin yanısıra grafik (harita) olarak ekranda izlenmesi gibi **daha üstün özellikler** içeren **AGILENT TECH., INTELLIVUE Model** Hasta İzleme Sistemi **herhangi bir fiyat farkı olmaksızın** verilecektir.

YOB-1

HASTA YATAĞI, YOĞUN BAKIM

2001 Yılındaki ihalede teklif edilen Yoğun Bakım Hasta Yatağı **HILL-ROM, EVOLUTION/PRIMO Model** dir. Ancak bahse konu olan Yoğun Bakım Hasta Yatağı'nın bu modelinin üretimden kaldırılmış olması nedeniyle **Şartnameyi bire bir karşılayan, tam koltuk ve sandalye pozisyonuna girebilme, elektrik kesildiğinde yatağın tüm hareketleri 12 voltluk akü destek sistemi ve hidrolik ayak kumandası ile yapabilme, 83cm yükselebilmeye, yatak uzunluğu uzat-kısalt tuşu ile 30cm kadar uzayıp kısalabilmesi, karyolanın her iki tarafında acil durumda yatağı trendelenburg pozisyonuna getirebilen bir ayak pedalı olması, tüm yüzey boyunca floroskopi çekmeye müsait olması, C-Kollu röntgen cihazına girebilme ve X-ışınlarını geçirebilme gibi daha üstün özellikler** içeren **HILL-ROM, TOTAL CARE Model** Yoğun Bakım Hasta Yatağı **herhangi bir fiyat farkı olmaksızın** verilecektir.

CER-8

ANESTEZİ CİHAZI, MONİTÖRLÜ VE VENTİLATÖRLÜ

2001 Yılındaki ihalede teklif edilen Mobil Anestezi Sistemi **AMS, MODEL:200+8200 Model** dir. Ancak bahse konu olan Mobil Anestezi Sistemi'nin bu modelinin üretimden kaldırılmış olması nedeniyle **Şartnameyi bire bir karşılayan, ek olarak PVC ve SIMV modları gibi daha üstün özellikler içeren, AMS, MODEL:200+8500 Model** Mobil Anestezi Sistemi **herhangi bir fiyat farkı olmaksızın** verilecektir.



SER-12

ÖRDEK YIKAMA CİHAZI

2001 Yılındaki ihalede teklif edilen Ördek Yıkama Cihazı **KEN, 711 OS** dir. Ancak bahse konu olan Ördek Yıkama Cihazı'nın üretimden kaldırılmış olması nedeniyle **Şartnameyi bire bir karşılayan**, hasta tarafından kullanılmasından sonra herhangi bir ön temizliğe gerek kalmadan, buharla dezenfekte edip, kurutan, paslanmaz çelik, çift cidarlı ve izolasyonlu, tam ve kalıntısız temizlik için 9 adet jetnozzle bulunan, her programı hijyenik ve teknik olarak çalışma esnasında en az 4 kere kontrol edebilecek sistemde, cihaz üstünde dokunmatik, film-type kontrol paneli ile ayarlanabilen 40 farklı program olması gibi **daha üstün özellikler içeren MEICO marka KD 20.2 AP, Model Ördek Yıkama Cihazı herhangi bir fiyat farkı olmaksızın verilecektir.**

KAP 4 – KPT 8

MIKROSKOP, BINOKULER

2001 yılındaki ihalede teklif edilen Olympus Marka, CH40-213E Model Binoküler Mikroskop yerine, teslimat sırasında son teknoloji ürünü verilecek olması nedeni ile, herhangi bir fiyat farkı olmaksızın, daha üstün özellikler içeren Olympus Marka CX41-12C02 Modeli verilecektir

KAB 15


KAN IŞINLAMA CİHAZI

2001 yılındaki ihalede teklif edilen MDS Nordion Marka, Gamacell 1000 Model Kan Işınlama Cihazı yerine, teslimat sırasında son teknoloji ürünü verilecek olması nedeni ile, herhangi bir fiyat farkı olmaksızın, daha üstün özellikler içeren MDS Nordion Marka GC 3000 Modeli verilecektir.

YOB 3 - KAB 21 – ECZ 4 – ONK13 – KIU 5

LAMINAR HOOD

2001 yılındaki ihalede teklif edilen Kendro - Heraeus Marka, HS12 Model Laminar Hood yerine, teslimat sırasında son teknoloji ürünü verilecek olması nedeni ile, herhangi bir fiyat farkı olmaksızın, daha üstün özellikler içeren Kendro - Heraeus Marka KS 12 Modeli verilecektir


Yrd. Doç. Dr. Benan BAYRAKÇI
Diploma No: 11035
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
ÇOCUK BAĞIŞTİVE HASTALIKLARI
Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü Sıhhiye 06100 ANKARA
Tel: (312) 305 1123 - 1125 • Faks: (312) 324 4990


Prof. Dr. Mustafa TEZCAN KUTLUK
H.U. Onkoloji Hastanesi
Başhekim



KAB 20

KAN TOPLAMA SİSTEMİ

2001 yılındaki ihalede teklif edilen Kan Toplama Sistemi, Fresenius Hemocare Marka, Compomixer 2 Model yerine, teslimat sırasında son teknoloji ürünü verilecek olması nedeni ile, herhangi bir fiyat farkı olmaksızın, daha üstün özellikler içeren Fresenius Marka Compomixer 3 Modeli verilecektir.

ONK 8

HOT PLATE

2001 yılındaki ihalede teklif edilen Hot Plate, Gerhard Marka, HC 33 Model yerine, teslimat sırasında son teknoloji ürünü verilecek olması nedeni ile, herhangi bir fiyat farkı olmaksızın, daha üstün özellikler içeren Gerhard Marka HT 22 Modeli verilecektir.

KPT 23


MİKROSKOP, FAZ KONTRAST


2001 yılındaki ihalede teklif edilen Mikroskop, Faz Kontrast, Olympus Marka, BX 51 Model yerine teslimat sırasında son teknoloji ürünü verilecek olması nedeni ile, herhangi bir fiyat farkı olmaksızın, daha üstün özellikler içeren Olympus Marka IX 71 Modeli verilecektir.

CER 17

INFUZYON ISITICISI

2001 Yılındaki ihalede teklif edilen Infuzyon Isıtıcısı Barkey Marka Autcontrol Model dir. Ancak bahse konu olan Infuzyon Isıtıcısı'nın üretimden kaldırılmış olması nedeniyle Şartnameyi bire bir karşılayan, daha üstün özellikler içeren NOUVA Marka B-BW05 Model Infuzyon Isıtıcısı herhangi bir fiyat farkı olmaksızın verilecektir.


Yrd. Doç. Dr. Benan BAYRAKÇI
Diploma No: 11055
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI



Prof. Dr. M. Tezcan KUTLUK
H.O. Onkoloji Hastanesi
Başhekim



SER-5

HİDROLİK, SEDYE

2001 Yılındaki ihalede teklif edilen Hidrolik Sedye, **HILL ROM, Durastar Model** dir. Ancak bahse konu olan Hidrolik Sedye'nin bu modelinin üretimden kaldırılmış olması nedeniyle **Şartnameyi bire bir karşılayan, daha üstün özellikler içeren, HILL ROM, P8000 Model Hidrolik Sedye herhangi bir fiyat farkı olmaksızın verilecektir.**


Yrd. Doç. Dr. Behret BAYRAKTAR
Diploma No : 11035
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI


Prof. Dr. M. Tamer KUTLUK
HÜ Onkoloji Hastanesi
Başhekim



T.C.

CETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

9/1455

01.10.2007

T.C.

BAŞBAKANLIK

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI'NA

İlgi: a) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın 22.01.2007 tarih ve B.02.1.DPT.0.09.02-8-27/ 230 sayılı yazınız.

Üniversitemiz 2007 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 1990 I 001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı" Projesi kapsamında satın alınmasına karar verilen " 171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman " tanımlı malzemeler için 2005 ve 2006 yıllarında bütçeleştirme işlemi yapılarak bütçe emanetine alınan toplam 41.662.779,98 YTL ödenegin 2007 yılına devri Müsteşarlığı'nızca uygun mütalaa edilmiş ve ihtiyaç duyulan proje revizyonu 2006/11105 program kararnamesinin 7/h ve (i) maddelerine istinaden yazınız eki cetvel esasları dahilinde ikmal edilmiştir.

Öte yandan 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince 01.01.2006 tarihinden itibaren dış kredilerden yapılan kullanımların ilgili kurumlara ikraz edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Ancak bu hüküm Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun (Madde-3'le düzenlenen) Geçici 12.maddesinde "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun eki (II) sayılı Cetvelin (A) bölümünde bulunan kuruluşların yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı için 01.01.2006 tarihinden önce imzalanan dış kredi anlaşmaları çerçevesinde sağlanan krediler, anılan kuruluşlara tahsisli olarak kullanılmaya devam edilir. Bu maddeye istinaden kullanılacak krediler ile ilgili olarak krediyi tahsis eden kuruluş hakkında, 14. maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşlara uygulanmaz." hükmünün 30.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmesi ile akreditiflerin açılması için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına gerekli bilgiler verilmiştir.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yazmış olduğu 18 Ocak 2007 tarih ve 2215 sayılı yazılarında, Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan Onkoloji Hastanesi 171 kalem Makine ve Teçhizat Alımı Projesinin kısmi finansmanı amacıyla 24 Ekim 2005 tarihli anlaşma ile Citibank International Plc'den sağlanan ve anlaşmada yer alan 3.066.061,35 ABD doları ve 8.665.415,10 Euro tutarında Hermes Garantili İhracat Kredisi sağlanan kredi anlaşması çerçevesinde krediden kullanımların

./.

yapılabilmesi için şubeleri nezdinde (2005 ve 2006 yıllarında bütçeleştirilmesi yapılarak bütçe emanetine alınan tutarlar karşılığında) toplam tutarı 2.844.219,85 ABD doları ve 7.799.338,20 Euro olmak üzere akreditif açılması için kredi anlaşmasının Ek- 5'i uyarınca Akreditif formu ile diğer belgeleri göndermiştir. Ayrıca Citibank N.A' dan sağlanan 2495-5118-38941 finansman no.lu EUR. 4.934.584,90 ve 2495-5118-38944 no.lu USD.7.403.218,65'lık ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanacak tutarların Akreditifleri ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından anlaşma gereğince yurtdışında açılacaktır.


Söz konusu Hermes Garantili İhracat Kredisi ve ABD Exim Garantili İhracat Kredisinden karşılanarak Akreditifleri açılacak olan tutarların karşılığı olarak ödenek devri yapılan 41.662.779,98 YTL'lık tutar kapsamında 2007 yılı içinde yurt dışından gelecek malzemelerin gümrük işlemleri esnasında ödenmesi gereken %18 KDV tutarı 7.492.100,40 YTL, gümrük masrafı tutarı 2.622.366,80 YTL ve banka masrafı tutarı 75.000.00 YTL olmak üzere toplam 10.189.467.20 YTL, ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

Adı geçen proje ile ilgili henüz bütçeleştirme işlemi yapılmayan 1.053.394,00 ABD doları ile 1.478.092,00 Euro tutar bulunmakta olup yaklaşık YTL karşılığı 4.449.510,99 YTL (ABD doları 1,50 YTL, 1 EURO 2,00 YTL olarak hesaplanmıştır) 'dır. Yurt dışından gelecek bu malzemelerin de gümrük işlemleri esnasında ödenmesi gereken %18 KDV tutarı 800.911,97 YTL, gümrük masrafı tutarı 291.970,78 YTL ve banka masrafı tutarı 55.113,00 YTL olmak üzere toplam 5.597.506,74 YTL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

Ancak, 21.07.2001 tarih ve 24469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına ilişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ " projenin gerçekleştirilmesi için temin edilecek dış finansman tutarının her türlü vergi, resim ve harçları kapsamayacağına hükmetmektedir.

Bu nedenle, 1990 I 001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı Projesi kapsamında dış kaynaktan karşılanamayan söz konusu masrafların karşılanmasını teminen, Bütçeleştirilme işlemi yapılan ve 2007 mali yılında bütçemizin ilgili tertibinde yeterli ödenek olmadığından bütçeleştirilme işlemi yapılmayan 4.449.510,99 YTL ana para ile % 18 KDV tutarı 8.293.012,37 YTL, gümrük masrafı tutarı 2.914.337,58 YTL ve banka masrafı tutarı 130.113,00 YTL. olmak üzere toplam 15.786.973,94 YTL ödenegin sağlanmasını ve proje ile ilişkilendirilerek revize edilmesini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör



emir : 01.02.07
ef : -/-/-
RAD. : -/-/-
Gör. Y. : 01.02.07
Gör. : 01.02.07
T. Sek. : 1.2.07

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü


Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 73/12076
Konu :

13/7/2006

T.C.
BASBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı
(Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne)

İlgi : 4 Temmuz 2006 tarih ve 1599 sayılı yazınız hk.

Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan Onkoloji Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımı Projesi ile ilgili Müsteşarlığınız tarafından 20 Temmuz 2006 günü saat 14.30'da yapılacak olan toplantıya Üniversitemiz adına aşağıda isim ve ünvanı belirtilen yetkili katılacaktır.
Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.


Prof.Dr.Erol BELGİN
Rektör Vekili

Adı Soyadı :
Prof.Dr.Tezer KUTLUK

Ünvanı :
Onkoloji Hastanesi Başhekimisi

GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİSİ KULLANIM İZİN BİLDİRİM FORMU*

KULLANICI KURULUŞ

KURULUŞ ADI	H.Ö. REKTÖRLÜĞÜ	İLGİLİ MERKEZ SAYMANLIĞI KODU:	6754
KULLANICI BİRİM	ONKOLOJİ HASTANESİ	KUL.KUR.BÜTÇE KODU:	3800
DIŞ FİNANSMAN KODU		2495-5118-38944	
DIŞ FİNANSMAN NUMARASI		38944	

EK BİLGİLER:

PROJE DPT YT. PRG. ADI	ONKOLOJİ HAST. MAK. VE TEÇH. ALIMI	PROJE DPT YT. PRG. KODU	1990 00 1900
İŞİN/PROJE ADI	H.Ö. ONKOLOJİ HASTANESİ PROJESİ (İLKISIM) - (171 KALEM MAKİNA, MALZEME VE EKİPMAN ALIMI)		
KREDİTÖRÜN ADI	CITIBANK N.A		
ANLAŞMA TUTARI VE DÖVİZİ	USD 7.403.218,65	ANLAŞMA TARİHİ	24.10.2005
EK ANLAŞMA TUTARI		İPTAL TUTARI	
CARI ANLAŞMA TUTARI		KULLANIM SAYISI	0
TOPLAM KULLANIM TUTARI	0	KULLANILABİLECEK TUTARI	USD 7.403.218,65

KULLANIM EMRİ VERİLECEK KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

SAĞLANAN MAL VE HİZMET BEDELİ (Bütçe Gideri Kaydına Esas Alınacak) VEYA			
SAĞLANACAK MAL VE HİZMET BEDELİ (Avans verilmesi, Akreditif açılması)			USD 3.496.222,55
AKREDİTİF AÇILACAK İSE TOPLAM TUTAR	USD 3.496.222,55	AKREDİTİFİN KAÇ YILDA KULLANILACAĞI	2
CARI YILDA KULLANILACAK BÜTÇELEŞTİRMeye ESAS ALINACAK TUTAR			28.000.000,00 YTL
KULLANIM EMRİ VERİLECEK TUTAR	USD 3.496.222,55	T.C.M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU	1,4270
KULLANIM EMRİ VERİLECEK TUTAR (YTL)	4.989.109,57 YTL		

YÜKLENİCİ VEYA MAL VE HİZMET SAĞLAYANA AİT BİLGİLER

YÜKLENİCİ ADI/ÖNÜMÜ	MARUBENİ AMERICA CORPORATION	YÜKLENİCİ ÖLKESİ	ABD
FİİLİ İTHALTARİHİ		VERGİ SİCİL NO	133 / 5951 / 0075
HAKEDİŞ VE FATURA NO	19/12-2006-FE-191206-08		

YUKARIDA YER ALAN BİLGİLERİN UYGUNLUĞU TASDİK OLUNUR.

20.12.2006 Mehmet ÖZGEN İdari Mali İşler Bşk.	20.12.2006 Prof.Dr.Erol BELGİN Genel Sekreter V.	20.12.2006 Prof.Dr.Tunçalp ÖZGEN Rektör

KULLANICI KURULUŞ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖDENEĞİ MEVCUTTUR:	
M. F. KARAAĞAÇ	12.2006
Strateji Geliştirme	
Genel Sekreter	

KULLANIM EMRİ VERİLECEKLER.

KULLANICI KURULUŞ MERKEZ SAYMANLIĞI

MUHASEBE KAYDI YEVİMİYE NO	33223
YEVİMİYE TARİHİ	20.12.2006
CMB DÖVİZ ALIŞ KURU	1,4270
ORÇ KAYDEDİLEN HESAP ADI	Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanımları
	Avans ve Akreditif Hساب
TUTARI	4.989.109,57 YTL

BÜTÇELEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLUP, DIŞ FİNANSMAN KAYNAĞINA KULLANIM EMRİ VERİLEBİLİR.

SAYMAN
S. Serdar GENLİ
24.12.2006
Şube Müdürü

DEVLET BORÇLARI SAYMANLIĞI

	YEVİMİYE KAYDI YAPILMIŞTIR.	
YEVİMİYE KAYIT NO	SAYMAN	
	İMZA	
YEVİMİYE TARİHİ	TARİH	
	AD SOYAD	S. Serdar GENLİ

(*) Her Bir Kullanım İçin Ayn Ayn Doldurulacaktır.



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satınalma Şube Müdürlüğü

SAYI : B.30.2.HAC.0.70.73.03/170/21272
KONU :

30/12/2005

T.C.
MERKEZ BANKASI
Ankara Kambiyo Şubesi'ne
(Dış Ticaret Servisi)

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi'nin finansmanı amacıyla temin edilen USD.3.066.061,35 ve EUR.8.665.415,10 tutarlık Hermes Garantili İhracat Kredi Anlaşmasından karşılanarak Marubeni Europe Plc. firmasından ithal edilecek " 171 Kalem Makine,Malzeme ve Ekipman " tanımlı malzeme ile ilgili evraklar yazımız ekinde sunulmaktadır.

Buna istinaden , 2006 yılı içerisinde ilave ödenek tahsis edilmesini müteakip, malzeme bedelinin %85'ini teşkil eden USD.3.066.061,35 ve EUR.8.665.415,10' lık tutarlara bilahare tamamlanacak olan USD.1.966.205,55 ve EUR.1.843.763,90 tutarında akreditifimizin açılması hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN

REKTÖR

EKLER:

EK 1 : 1 Adet Akreditif Açtırma Talimatı.

EK 2 : 1 Adet Fatura.

Memur	: —/—/—	
Şef	: 30/12/05	8
Şub. İ. D.	: —/—/—	
Başkan Yard.	: 30/12/05	4
Başkan	: 30/12/05	4
Çiğdem	: —/—/—	

06100 Sıhhiye-ANKARA

Tel : 305 10 34

Fax : 311 43 90

e-posta : imddb@hacettepe.edu.tr

Elektronik Ağ: www.imddb.hacettepe.edu.tr



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sermaye Giderleri Satılma Şube Müdürlüğü

SAYI : B.30.2.HAC.0.70.73.03/ 167/21275
KONU : Onkoloji-Ticari-Ek-2

30/12/2005

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
'Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü' ne
(Devlet Borçları Saymanlığı)

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi'nin (II.Kısım) finansmanı amacıyla 24.10.2005 tarihinde imzalanan 2495-5118-38937 finansman no.lu **USD.1.847.520** ve **EUR.2.400.000** tutarlık Ticari Kredi anlaşması kapsamında yapılacak sevkiyatın %15 'lık tutarına tekabül eden **USD.917.586,75** ve **EUR.629.709,30**'lık meblağların bütçeleştirme işlemi 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan " Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik " hükümleri çerçevesinde Bütçe Dairesi Başkanlığımızca yapılmıştır.

Bütçeleştirilen söz konusu tutarlara ait " Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin Bildirim Formları " (Ek-2) yazımız ekinde sunulmuş olup, Dış Borç Kaydının yapılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Rektör

EKLER:

Ek-1: 2 Adet Ek-2 Formu

Ek-2: 1 Adet Proforma Fatura

Memur	: / /
Ş e f	: 30/12/05
Şb. Md.	: / /
Başkan	: 30/12/05
Başkan	: 30/12/05
Gen. Sec.	: / /
06100 Sıhhiye-ANKARA	

Tel : 305 10 34

Fax : 311 43 90

GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİSİ KULLANIM İZİN BİLDİRİM FORMU*

KULLANICI KURULUŞ

KURULUŞ ADI	H.Ü. REKTÖRLÜĞÜ	İLGİLİ MERKEZ SAYMANLIĞI KODU:	6654
KULLANICI BİRİM	ONKOLOJİ HASTANESİ	KUL.KUR.BÜTÇE KODU:	7900
DIŞ FİNANSMAN KODU		2495-5118-38937	
DIŞ FİNANSMAN NUMARASI		38937	

EK BİLGİLER

PROJE DPT YT. PRG. ADI	ONKOLOJİ HAST. MAK. VE TEÇH. ALIMI	PROJE DPT YT. PRG. KODU	1990 I 00 1900
İŞİN/PROJE ADI	H.Ü. ONKOLOJİ HASTANESİ PROJESİ (II.KISIM) - (171 KALEM MAKİNA, MALZEME VE EKİPMAN ALIMI)		
KREDİTÖRÜN ADI	CITIBANK N.A. BAHRÉYN BRANCH		
ANLAŞMA TUTARI VE DÖVİZİ	EUR.2.400.000,00	ANLAŞMA TARİHİ	24.10.2005
EK ANLAŞMA TUTARI		İPTAL TUTARI	
CARİ ANLAŞMA TUTARI		KULLANIMSAYISI	0
TOPLAM KULLANIM TUTARI	0	KULLANILABİLECEK TUTARI	EUR.2.400.000,00

KULLANIM EMRİ VERİLECEK KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

SAĞLANAN MAL VE HİZMET BEDELİ (Bütçe Gideri Kaydına Esas Alınacak) VEYA			
SAĞLANACAK MAL VE HİZMET BEDELİ (Avans verilmesi, Akreditif açılması)			AVANS
AKREDİTİF AÇILACAK İSE TOPLAM TUTAR		AKREDİTİFİN KAÇ YILDA KULLANILACAĞI	
1 YILDA KULLANILACAK BÜTÇELEŞTİRMEYE ESAS ALINACAK TUTAR			15.416.000,00 YTL.
KULLANIM EMRİ VERİLECEK TUTARI: EUR.629.709,30		T.C.M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU	1,5904

KULLANIM EMRİ VERİLECEK TUTARI(YTL): 1.001.489,67 YTL.

YÜKLENİCİ VEYA MAL VE HİZMET SAĞLAYANA AİT BİLGİLER

YÜKLENİCİ ADI/ÜNVANI	MARUBENİ EUROPE PLC.	YÜKLENİCİ ÜLKESİ	ALMANYA
FİİLİ İTHALTARİHİ		VERGİ SİCİL NO	133 / 5951 / 0075
HAKEDİŞ VE FATURA NO	22.12.2005-FE221205-01		

YUKARIDA YER ALAN BİLGİLERİN UYGUNLUĞU TASDİK OLUNUR.

30.12.2005 Mehmet ÖZGEN İdari Mali İşler Bşk.	30.12.2005 Atilla KÖNİK Genel Sekreter	30.12.2005 Prof.Dr.Tunçalp ÖZGEN Rektör

KULLANICI KURULUŞ BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖDENEĞİ MEVCUTTUR.	
30.12.2005 ÖZCAN GÜÇLÜ BÜTÇE DAİRESİ BAŞKAN V.	

KULLANICI KURULUŞ MERKEZ SAYMANLIĞI

MUHASEBE KAYDI YEVMIYE NO	2005 0036316	BÜTÇELEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLUP, DIŞ FİNANSMAN KAYNAĞINA KULLANIM EMRİ VERİLEBİLİR.
YEVMIYE TARİHİ	30.12.2005	
T.C.M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU	1,5904	
BORÇ KAYDEDİLEN HESAP ADI	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları	
	Avans ve Akreditifler Hesabı	
TUTARI	1.001.489,67 YTL.	

DEVLET BORÇLARI SAYMANLIĞI

		YEVMIYE KAYDI YAPILMIŞTIR.	
YEVMIYE KAYIT NO		SAYMAN	
		İMZA	
YEVMIYE TARİHİ		TARİH	
		AD SOYAD	

(*) Her Bir Kullanım İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır.

SAYMANLIK İŞLEM FİŞİ

İşlem Tarihi : 30/12/2005

İşlem No : 20050037032

Saymanlık	Kurum	Bütçe	Yevmiye	Belge Düzenleme Nedeni	İlgilinin Adı Soyadı
6654	97 4 38 32	2005	Tarhi 30.12.05 Numarası 35766		HACETTEPE Sİ BÜTÇE DAİRE
dış proje					

Hesap No	Kurum Kodu	Fonksiyonel Kod.	Fin.	Ekonomik Kod.	TUTAR		Gelir, Kasıntı, Ayrıntı veya İşlemin Çeşidi
					BORÇ	ALACAK	
176 368	97 4 38 32 772	7 3 2 0	7	1 6 1 0 2 0 0 0	2.742.786,03	2.742.786,03	Mamul Mal Alımları Doğrudan Dış Proje K Katma Bütçeli Kurulu Doğrudan Dış Proje K
Toplam :					2.742.786,03	2.742.786,03	

SAYMANLIĞIN				KARŞI SAYMANLIĞIN		
Nakit Hareket Cetvelinin Dönem Tarihi	Ödeme - Tahsilat Mahsubunun Türü	Mükellef Sicil - Hesap No.	Vergilendirme Dönemi	Kodu	Yevmiye Tarihi	Yevmiye Numarası

TAHSİLAT ve ÖDEMELERDE				
Kasa No.	Vezne Alındı No.	Menkul Kıymetler Alındısı No.	Çek Numarası	Gönderme Emri No.

İADE OLUNAN EMANETLERDE			ADRES, AÇIKLAMA ve EKLER	
Kasa Alındığı Tarih	Alacak Sıra No.	Kımin Adına Kayıtlı Olduğu	kur 1,5904 döviz 1,724,588,80 euro	
AVANS ve KREDİLERDE				
Avans ve Kredi No.	İade Ed. Avansın Ver. Tarih	İlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı		

Düzenlenmiştir Tahakkuk Ettirilmiştir D. Amiri / Say. Me. / Tah. Me. Adı, Soyadı Mehmet ÖZGEN İda. ve Muh. Bşk.	Ödenmesi Uygundur İta Amiri Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN Rektör	Kayıt ve Vize Edilmiştir Bütçe Dalresi Başkanı	Gereğini Yapınız Sayman	Tahsil Edilmiştir Veznedar
İmza				



-Asli Batıcede-

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Bütçe ve Plan Şube Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.HAC.0.70.73.01/1235
Konu :

8.12.2005

BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA

Üniversitemiz 2005 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 1990 I 001900 no.lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II.kısım) kapsamında tamamı dış kredili olarak temin edilen krediden 02.04.2001 tarihinde satın alınmasına karar verilen " 171 Kalem Makine, Malzeme ve Ekipman " tanımlı malzeme ile ilgili düzenlenen USD.12.316.800 ve EUR.16.000.000 tutarlık sözleşmeler gereği Citibank N.A'dan getirilen Ticari Kredi , Hermes ve USExim garantili ihracat kredisi anlaşmaları Bakanlar Kurulu'nda imzalanma aşamasına gelmiş olup, 2005 yılı içerisinde akreditifleri açılacaktır.

Söz konusu ihale dosyası için 2005 Yılı bütçemizin 97 04 38 32 07 3 2 7 06 1 2 03 tertibine 16.000.000,00 YTL. ödenek tahsis edilmiş olup, Bütçe Kanunu gereğince %3,65'lik kanuni kesinti sonrası kalan ödenek tutarı 15.416.000,00 YTL' dir.

21.07.2001 tarih ve 24469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına ilişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ " projenin gerçekleştirilmesi için temin edilecek dış finansman tutarının her türlü vergi, resim ve harçları kapsamayacağına hükmetmektedir.

Söz konusu kredinin kullanımından kaynaklanan, yurt dışından gelecek malzemelerin gümrük işlemleri esnasında ödenmesi gereken %18 KDV tutarı 2.767.811,03 YTL, gümrük masrafı tutarı 922.603,68 YTL., ardiye bedeli 60.000,00 YTL., ordino ve diğer masraflar 10.000,00 YTL. ve banka masrafı tutarı 48.236,41 YTL. olmak üzere toplam 3.808.651,12 YTL. ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle söz konusu masrafların karşılanmasını teminen Üniversitemiz 2005 Mali Yılı Bütçesinin 97 04 02 04 01 3 9 2 03 4 tertibine 3.760.414,71 YTL. ile 97 04 02 04 01 3 9 2 03 5 tertibine de 48.236,41 YTL. olmak üzere toplam 3.808.651,12 YTL. ek ödenek ilave edilmesi hususunda Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimde bulunulmasını rica ederim.

Yazdır	09.12.05	21
İmza	08.12.05	97
Sıra	-/-	
Ek		
Ek	8.12.05	97
Gözetim		

Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
R e k t ö r



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
ANKARA

Dış Alımlar Şube Müdürlüğü
SAYI : B.302.HAC.0.70.73.02/ 1264
KONU:

24.11.2001

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Dış Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'ne

İlgi : 01.05.1998 tarih ve 23739 sayılı müsaade yazınız.

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesi çerçevesinde, tamamı yurt dışı kredi ile finanse edilmek üzere Makine-Teçhizat temini Uluslar arası kredili ihaleye çıkılması ilgi yazınız ile uygun görülmüştü.

İlgi yazınıza istinaden Makine-Teçhizat temini ile ilgili ihale 21.02.2001 tarihinde yapılmış olup, CIF.EURO.16.000.000 ve CIF.US\$.12.316.800 bedelle Marubeni Europa Plc. firmasından 171 kalem malzemenin kredili dışalım olarak gerçekleştirilmesi konusunda 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığı'ndan vize ettirilmiş ve Sayıştay Başkanlığı tarafından ihale dosyasına ait sözleşme tescil edilmiştir.Söz konusu ihale ile ilgili tüm işlemler tamamlanarak ihale dosyası ve sözleşme yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereği ile neticenin tarafımıza iletilmesini arz ederim.


Prof.Dr. Tunçalp ÖZGEN

REKTÖR

EKLER :

EK-1 : 2 Adet Dosya

GEREKLİ BİLGİLER

İdare : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
Taahhüdün Konusu : Onkoloji Hastanesi Makine-Teçhizat Alımları
Bedeli : 12.316.800 USD. + 16.000.000 EURO
Firma : Marubeni Europe PLC
Kredi Kuruluşu : Citibank
Yatırım Proje No. : 1990 I 001900

Gen. Sek.	24.11.2001
Başkan	24.11.2001
Şube Md.	24.11.2001
S.Ş.	24.11.2001
Memur	24.11.2001



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İslam Kalkınma Bankası Onkoloji Hastanesi Projesi

Tarih : 19.6.2007
Sayı : 459

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne

İlgi : 13.06.2001 tarih ve 12251 sayılı yazınız hakkında.

Her yıl ortalama 150000 civarında kanser vakasının beklendiği ülkemizde kanserli hastalara tanı ve tedavi hizmeti verecek merkezlerin sayısı maalesef yetersizdir. Bu nedenle bu hastaların bir kısmı yurt dışına gitmekte, bir kısmı ise yurt içindeki sınırlı sayıdaki merkezde sınırlı tedavi imkanlarından istifade etmeye çalışmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nin Gündüz Hastanesi bölümü 1993 yılında hizmete açılmış olup, her yıl 30000 civarında hastaya ayaktan tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Onkoloji Hastanemizin yataklı kısmının inşaatı da tamamlanma aşamasında olup ekipmanların yerleştirilmesini takiben hizmete açılacaktır. Böylece Ülkemiz, hemen her yöreden gelen hastalara hizmet verecek olan tam kapsamlı bir "Kanser Merkezi'ne" kavuşmuş olacaktır.

Bu hastanemizin ekipman ihtiyacını karşılamak amacıyla Uluslararası ihale yoluyla tamamı dış kredili olmak üzere 179 kalem ekipman ve malzemenin 21.02.2001 tarihinde yapılan ihalesi ve takip eden tarihlerde yapılan pazarlıklarla 171 kalem malzemenin Marubeni Europa Plc.firmasından alınması uygun görülerek vize için Genel Müdürlüğünüze gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğünüz tarafından yapılan incelemede, "üzerine ihale yapılan firmanın teklif ettiği cihazlardan bazılarının teknik şartnamede istenen bazı özellikleri taşımadığı ve buna rağmen ihale komisyonunca uygun bulunduğu, söz konusu cihazların hizmetin görülmesi için yeterli olup olmadığı, ihaleye katılan diğer firmaların teklif ettiği cihazların da teknik şartnamede istenen özellikleri taşıyıp taşımadığı" konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilmekte ve bu konuda açıklama istenmektedir.

Hazine Müsteşarlığı ile yapılan görüşmelerde, projenin Uluslararası ihale Yoluyla Tamamının Dış Kredili olması ve kredi bulma işlemleri açısından projenin başarılı olabilmesi için tek paket şeklinde ihaleye çıkılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Üniversitemizce rekabet koşullarının gerçekleşmesi için şartnamelerde, her bir kaleme 1 esas, 2 alternatif cihaz teklif etme imkanı tanınmış olup 21.02.2001 tarihinde yapılan ihaleye benzer ihalelere katıldığı bilinen 4 ana firma katılmış olup her firma her bir kalem için bir esas, 2 alternatif cihaz (çok sayıda üretici firma ürünü) önermişlerdir.



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İslam Kalkınma Bankası Onkoloji Hastanesi Projesi

Tarih : 19.6.2001
Sayı : 459

Üniversitemiz Satınalma Komisyonu 21.02.2001 tarihli Ara Kararı ile ihaleye katılan 4 (dört) ana firmanın önerdikleri esas ve alternatif cihaz tekliflerini teknik yönden incelemiş olup, şartnameye uymayan cihazlar değerlendirme dışına çıkarılarak, firmaların şartnamelere tam uyan cihazları ile cihazın kullanım amacını, verimliliğini, fiyatını etkilemediği düşünülen önemsiz eksikliklerin şartnamelere aykırılık taşımadığı belirlenen ve Hastanemizin yüksek performansla çalışması için yeterli olacak en uygun cihazlar seçilerek firmalar bazında "Malzeme Tercih Listeleri" oluşturulmuş ve bu cihazlarla ilgili firmalardan istenilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek toplayıcı 4 ana firmanın da katıldığı pazarlık aşamasında da rekabet ortamı en iyi şekilde sağlanmıştır.

Söz konusu Onkoloji Hastanesi II.Etap Projesi kapsamında gerçekleştirilecek makine-teçhizat alımı, Satınalma Komisyonumuzun 02.04.2001 tarih ve 5 no.lu Satınalma Komisyonu Kararı doğrultusunda en ucuz fiyatı veren Marubeni Europa Plc.firmasından CIF.US\$.12.316.800 ve CIF.EURO.16.000.000 bedelle alınması kararlaştırılmıştır.

Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64.maddesi uyarınca vize edilmesini ve asıl dosyanın Üniversitemize iadesini saygılarımla rica ederim.

Prof.Dr.Tunçalp ÖZGEN

REKTÖR

Gen. Sek.	21.6.01	UC
Rektör	21.6.01	UC
Yardımcı Rektör	21.6.01	UC
Prof.	21.6.01	UC
Doç.	21.6.01	UC
Öğr. Gör.	21.6.01	UC
Öğr. Yard.	21.6.01	UC
İdari Yard.	21.6.01	UC
Diğer	21.6.01	UC
Toplam	21.6.01	UC



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
ANKARA

Dış Alımlar Şube Müdürlüğü

SAYI : B.30.2.HAC.0.70.73.02/

KONU:

...../...../.....

SATINALMA KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi :
02.04.2001

Karar No
05

Satınalma Komisyonu Süreyya ÖZER Başkanlığı'nda bugün saat 14.00'de toplandı.

Üniversitemiz Onkoloji Hastanesi Projesinin Uluslararası ihale yoluyla tamamı dış kredili olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51.Maddesi (p) fıkrası uyarınca yurt dışından ithal etmek istediğimiz 179 kalem tıbbi cihaz, ekipman, makine ve teçhizatın anahtar teslimi olarak satın alınması ile ilgili 02.04.2001 tarih ve saat 14.00'de Üniversitemiz Kültür Merkezi (R) Salonunda; 26.03.2001 tarihinde alınan Ara Karar'a istinaden İdari Şartnamemizin 4.Maddesi uyarınca paketin bütünlüğünü bozmayan ve dolayısıyla Hastane faaliyete geçtiğinde temel işlevlerini aksatmayacak şekilde alınacak olan cihazların, verimli çalışmasını engellemeyen bazı kalemlerin alımından vazgeçilmesi, bazı kalemlerinin de sayısının azaltılarak ihalenin gerçekleştirilmesi için Onkoloji Hastanesi Başhekimliği'nce çıkarılması ve eksilmesi önerilen ve Rektörlük'ce uygun görülen malzeme listesi görülerek 4 firmaya yazılan davet mektubunda belirtildiği üzere Komisyon çalışmalarına başladı.

Firmaların 26.03.2001 tarihindeki pazarlıkta beyan ettikleri seçenekler için önerdikleri son tekliflerinden başlamak şartıyla pazarlığa geçildi.

Simed International B.V.firmasının, 02.04.2001 tarihli yazılarıyla söz konusu pazarlığa katılamayacağını beyan ettikleri,


Nissho Iwai Corporation firmasının 1.turda 29.990.000 US\$ teklif ettiği , 2.turda 02.04.2001 tarihli yazılarını ibraz ederek ve sözlü olarak da pazarlıktan çekildiklerini beyan ederek pazarlık tutanağını imzaladıkları,

Marubeni Corporation (Türkiye Temsilcisi : İncekara A.Ş.)firmasının ekli listede beyan ettiği seçenekler için 27.turda 29.420.000 US\$, son yazılı tekliflerinde ise 16.000.000 EURO ve 12.316.800 US\$ teklif ve taahhüt ettiği,

FRITZ Werner (Türkiye Temsilcisi : Meteksan Sistemler Teknoloji A.Ş.) firmasının ekli listede beyan ettiği seçenekler için 27.turda 27.998.000 US\$, son yazılı teklifinde 27.797.000 US\$ teklif ve taahhüt ettiği görüldü.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 01.05.1998 tarih ve 23739 sayılı yazısı ile Onkoloji Hastanesi II.Etap Projesi kapsamında gerçekleştirilecek makine ve teçhizat alımının Uluslararası standartlara uygun dış kredili olarak sağlanması için yapılan pazarlık sonucunda ilişik listede gösterilen malzemenin en ucuz fiyatı veren **Marubeni Corporation** (Türkiye Temsilcisi : İncekara A.Ş.) firmasından **16.000.000 EURO ve 12.316.800 US\$** bedelle satın alınmasına ve Kararımızın Rektörlük Makamı'nın Onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.


KOMİSYON BAŞKANI


Süreyya ÖZER
Genel Sekreter Yrd.


ÜYE


Hasan BEYTAŞ
Bütçe Dairesi Başkan Yrd.


ÜYE


Mehmet ÖZEN
İdari ve Mali İşl.Dai.Bşk.

ÜYE


Mak.Müh.M.Sabri ÜSTÜN
Yapı İşl.Teknik Dai.Başk.Yrd.

TEKNİK ÜYE


Prof.Dr.M.Tezer KUTLUK
Onkoloji Hastanesi Başhekim V.


TEKNİK ÜYE


Prof.Dr.Mustafa N.ÖZMEN
Erişkin Hastanesi Başhekim Yrd.

TEKNİK ÜYE



Prof.Dr.Şevket RUACAN
Onkoloji Enstitüsü Müdürü

TEKNİK ÜYE


Prof.Dr.Lale ATAHAHAN
Radyasyon Onkolojisi A.B.D.Başkanı

UYGUNDUR

16.1.4.2001


Prof.Dr.Tunçalp ÖZGEN
REKTÖR

ONKOLOJİ HASTANESİ PROJESİ
179 KALEM TIBBİ CİHAZ, EKİPMAN, MAKİNE VE TEÇHİZAT ANAHTAR TESLİMİ İHALE TUTANAĞI

Sıra No.	Firma Adı	Geçici Tem. Tutarı	Teklif Mektubu Tutarı	Tic.ve San. Odası Bel.	İmza Sirküleri	Konsolosluk Tasdiki	Tebliğat Adresi	Yetki Belgesi	İmza Şartname	Kanuni İkametgah	Teknik Doküman	İmza Belgesi
1	Marubeni-İncekara A.Ş. (YILMAZ İSLEK)	1 080.000 US \$ 630.000 EURO	20.365.994 US \$ 27 756 387 EURO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Simed Int.(Nasseti) LEVENT İNİGÜN	729.000 US \$ 660.000 EURO	25.140.004 US \$ 19.251.661 EURO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	FRITZ Werner (Meteksan) CENK TEZCAN	1.245.000 US \$ 1.100.000 EURO	41.484.352 US \$ 37 800 000 EURO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Nissso Iwai Corp. İHSAN ŞÖNUTEMİZ	1.500.000 US \$ 1.350.000 EURO	49.448.657 US \$ 45 000 000 EURO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Komisyon Başkanı

Süreyya ÖZER
Genel Sekreter Yard.

Üye

Hasan BEYTAŞ
Bütçe Dairesi Başk.Yrd.

Üye

Mehmet ÖZEN
İd.ve Mali İşl. Dai. Başk.

Üye

Mak.Müh.M. Sabri ÜSTÜN
Yapı İşl.ve Tek.Dai. Bşk.Yrd.

Teknik Üye

Prof.Dr.M.Tezer KUTLUK
Onkoloji Hastanesi Başhekim

Teknik Üye


Prof.Dr.Mustafa N.ÖZMEN
Erişkin Hast.Başhek.Yrd.

Teknik Üye

Prof.Dr.Şevket RUACAN
Onkoloji Enstitü Müdürü

Teknik Üye

Prof.Dr.Lale ATAHAHAN
Radyasyon Onk.A.B.D.Başkanı



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İslam Kalkınma Bankası Onkoloji Hastanesi Projesi

Tarih : 21.06.1999

Sayı : 163

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi projesinin 180 yataklı Hastane, Kemik İliği Nakli Ünitesi, Radyoizotop Tedavisi ve Kansere Tarama Merkezi'ni içine alan II. kısmının inşaatına, I.kısım olan "Gündüz Hastanesi"nin açılışından hemen sonra 1994 yılında başlanılmış ve Üniversitemiz bütçe olanakları içerisinde bugüne kadar projenin %50 'sini oluşturan kaba inşaat, çatı, iç bölmeler, pencereler ve bazı iç tesisat tamamlanmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, projenin yukarıda bahsedilen II.kısımı için 28 milyon USD'lık kredi, firma kredisi olarak Hazine Müsteşarlığımız Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 01.05.1998 tarih ve 23739 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve bu izin 5.5.1999 tarih ve 31572 sayılı yazı ile 30.4.2000 yılına kadar uzatılmıştır. Adı geçen kredi "makine ve teçhizat" kredisi olarak izirlendirilmiştir. Onkoloji Hastanesi II. kısım inşaatının 1999 yılında, bütçe kaynakları ile bitirilmesi öngörülmüş olmakla beraber, 1998 ve 1999 yıllarında inşaat için yapılan tahsislerle inşaat projesinin ancak %50'si bitirilebilmiş, geri kalan bölümünün tamamlanabilmesi için yaklaşık 8 milyon USD bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.

Onkoloji Hastanesi yataklı bölümü ve özel ünitelerine duyulan büyük ihtiyaç ve şimdiye kadar yapılan yatırımların biran önce hizmete sokulabilmesi için, projenin II.kisminde ait alet ve donanım listesi tekrar gözden geçirilerek tahsis edilen 28 milyon USD'den tasarruf imkanları araştırılmış, 8 milyon USD'lik donanımın öncelik bakımından daha sonraya bırakılabileceği düşünülmüştür. Bu 8 milyon USD ile inşaatın hızla tamamlanması mümkün olabilecek ve kredinin kalan 20 milyon USD'ı ile de makine ve teçhizat alımı yapılarak hastane kısa bir zaman içinde hizmete açılacak ve "Tam kapsamlı bir kanser merkezi" olarak ülkemizde önemli bir ağığı kapatacaktır.

Onkoloji Hastanesi II.kısım projesi için tahsis edilen ve izin süresi 30.04.2000 yılında dolacak olan kredinin yukarıda açıklandığı gibi "8 milyon USD'lik bölümünün alet ve teçhizatla ilgili inşaatın tamamlanması ve 20 milyon USD'lik bölümünün ise alet ve teçhizat alımında kullanılmak üzere revizyonunun" yapılması için gereğini arz ederim.

Prof.Dr.Süleyman SAĞLAM

REKTÖR

EKLER :

Ek-1: Proje Bilgileri

Ek-2: 05.05.1999 ve 31572 sayılı Hazine Müsteşarlığı'nın yazısı.



**HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ**

▪ Erişkin Hastanesi
▪ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
▪ Onkoloji Hastanesi

B.30.2.HAC.0.HD.00.00/H- 9885

23.05.2012

Marubeni Europe Plc.
Konrad Adenauer Cad. Sancak Mah.
No.67/3
Çankaya/Ankara

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Projesi kapsamında, uluslararası ihale yoluyla tamamı dış kredili, anahtar teslimi olmak kaydıyla, ithal yoluyla 171 kalem makine, ekipman ve malzemeden Sıra No:150 TRP-1 kodlu Lineer Akseleratör (Linac 3) 22.05.2012 tarihinde arızalanmıştır. Durumun aciliyeti sebebi ile arza firmanıza faks ile bildirilmiştir. İlgili cihaz arızasının sözleşme gereği garanti kapsamında giderilmesi, giderilmediği takdirde doğacak kamu zararının firmanıza rücu edileceğini ve Üniversitemizin hukuki işlemleri ve süreci başlatacağını bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,


Prof.Dr.Ömer UĞUR
Hastaneler Genel Direktörü

ÖU/nk

Hacettepe Üniversitesi**Hastaneler Genel Direktörlüğü'ne,**

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi projesi kapsamında uluslar arası ihale yoluyla tamamı dış kredili, anahtar teslimi ihale yoluyla satın alınan 171 kalem makine, ekipman ve malzemeden Sıra No: 150 TRP – 1 kodlu Lineer Akseleratör (Linac 3) 22.05.2012 tarihinde arızalanmıştır. Durumun aciliyeti sebebi ile arıza firmaya faks ile bildirilmiştir.

İlgili cihaz arızasının sözleşme gereği garanti kapsamında giderilmesi için Marubeni Europe Plc. firmasına bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.



Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Onkoloji Hastanesi Başhekimi

Ek: 2

YT/mb

22.05.2012

TUTANAK

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi projesi kapsamında uluslar arası ihale yoluyla tamamı dış kredili, anahtar teslimi ihale yoluyla satın alınan 171 kalem makine, ekipman ve malzemeden Sıra No: 150 TRP – 1 kodlu Lineer Akseleratör (Linac 3) 22.05.2012 tarihinde arızalanmıştır.

İlgili cihaz arızasının sözleşme gereği garanti kapsamında giderilmesi için düzenlenen bu tutanak İncekara firmasına faks ve telefon ile bildirilmiştir.

ALİ DOĞAN
Fizik Mühendisi

Yasin TURK
Hastane Müdürü



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

22 Mayıs 2012

Sayı : B.30.2.HAC.0.01.00.32/194

H.Ü.Onkoloji Hastanesi
Başhekimliğine,

Anabilim Dalımızda bulunan Varian marka DHX model 3811 seri numaralı lineer hızlandırıcı cihaz arızası nedeniyle hasta alınamamaktadır.Konu ile ilgili Medikal Fizik Uzmanı Ali Doğan'ın yazısı ek'te sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof.Dr.Fadıl Akyol
Radyasyon Onkolojisi
Anabilim Dalı Başkan V.

Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı Başkanlığına,

Anabilim Dalımızda bulunan Varian marka DHX model 3811 seri numaralı lineer hızlandırıcı cihazı 21.05.2012 tarihinde arızalanmıştır. Yetkili teknik servis raporu ile arızanın MLC leri yöneten Power Supply olduğu tarafımıza aktarılmıştır. Bu parça sipariş edilmiş olup bir hafta içerisinde gelebileceği söylenmiştir. Cihazın arızası süresince hastalarımız tedavi alamayacaklardır.

Gereğini saygılarımla arz ederim.



Medikal Fizik Uzmanı

Ali DOĞAN

GEÇİCİ VE KESEN KABUL İŞLEMİ YAPILMAYAN 5 KALEM
171 KALEM ONKOLOJİ HASTANESİ TIBBİ CİHAZLARI

SIRA NO	ALZEMEN KODU	MALZEMENİN CİNSİ	MİK TARI	MALZEME BEDELİ	P B	MAL. GEÇİCİ KABUL TARİHİ	MAL. KES. KAB. TARİHİ	KESEN KABULÜNÜN YAPILDIĞI TARİHLER	
26	CER10	Otoklav, Flash	1	21.940,00	\$	HİÇ İŞLEM YAPILMADI		1	
27	CER11	Otoklav	1	32.913,00	\$	HİÇ İŞLEM YAPILMADI		2	
51	KPT6	Otoklav	1	32.913,00	\$	HİÇ İŞLEM YAPILMADI		3	
175	HKS 1	Hijyenik Klima Sistemi	1	1.266.496,00	€	HİÇ İŞLEM YAPILMADI		4	
179	NUK3	Siklotron Cihazı	1	1.929.898,00	€	HİÇ İŞLEM YAPILMADI		5	
						21.940,00		1.266.496,00	
						32.913,00		1.929.898,00	
						32.913,00		3.196.394,00	EUR
						87.766,00 USD			

BİLGİ İFADE TUTANAĞI

T.C. KİMLİK NO	: 11959746574
ADI VE SOYADI	: Prof.Dr.Hüsnü Fadıl Akyol
BABA ADI	: Mehmet Bülent
DOĞUM TARİHİ VE YERİ	: Ankara 1954
İKAMET ADRESİ	: Park Manzara Evleri A Blok No:16 Dikmen Cad. K.Pınarı/ANKARA
EV-İŞ- CEP TELEFONU NO	: 479 92 92 0532 257 26 08 305 29 00
ÜNVANI	: Prof.Dr.
BİLGİNİN ALINDIĞI YER	: Rektörlük Toplantı Salonu
TARİH VE SAAT	: 16.07.2012 18:01
O DÖNEMDEKİ GÖREVİNİZ (2007-2011)	: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

ŞUAN BULUNDUĞUNUZ GÖREV :

KONU :
MARUBENİ'den alınan 171 kalem hakkında

VERİLEN BİLGİDE

S: 171 Kalem Marubeni firmasından ihale edilen malzemelerle ilgili ne biliyorsunuz? 9 adet cihazın garantisi ile sıkıntı var. Hijyenik klimalarla ilgili sıkıntı var. Ne biliyorsunuz?

C: Bizim Klimalarla ilgili bilgimiz yok. 2011 Ağustos sonu Anabilim Dalı Başkanlığım bitti. Garanti ile ilgili sorun yoktu sonra oluştu onun için bilgim yok. 2011 de problem yoktu. PET-BT hakkında bilgim yok.

S: Brakiterap cihazının 2010 yılında montajı yapılmış. Sipariş de Well-Type iyon odası var.

C: Aralık ya da Ocakta Well-Type olmadığını söylediler. Bunun nerede olduğunu sordular? Aradık bulamadılar. Varinak firma Ankara Bölge Müdürü Levent Bey (montajı yapan kişi) montaj yaparken olmadığını söyledi. Kutuları biz açamayız. Havaalanında beklemiştir. Firma getirdi, hangi marka gelecekse o firmanın elemanı gelir. Firma tek başına kutuları açar çalıştırır. İhalede şartnamedeki parçalardan bilgim yok. Tek bildiğim aletin çalıştığı bunun içinde imzaladım.

parçalardan bilgim yok. Tek bildiğim aletin çalıştığı bunun içinde imzaladım.
Kutuların ~~gözetiminde~~ bilgim yok. Teslim almadık, aramadık.

Soruşturmacı

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Filiz Ercan

Canan

Prof. Dr. Canan HEKİMOĞLU

Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

Mutlu Aytemir

Bilgi Veren

Prof.Dr. Hüsnü Fadıl Akyol

Hüsnü Fadıl Akyol



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük

Sayı: B.30.2.HAC.0.00.00.00/410 - 2624

02 Temmuz 2012

Konu : Soruşturma Hk.

Sayın Prof.Dr. Fadıl AKYOL,

Üniversitemiz 19901001900 no'lu Onkoloji Hastanesi Projesi (II. Kısım) kapsamında uluslararası ihale yolu ile tamamen dış kredili olmak üzere 02.08.2001 tarihinde yapılan sözleşme ile, MARUBENİ EUROPE PLC firmasından satın alınan 171 kalem, makine, malzeme ve ekipmanın bir kısmının teslimi, kurulumu, montajı, garantisi gibi yükümlülüklerin firma tarafından sözleşme ve şartnameye uygun yerine getirilmediği halde taahhüde aykırı işlemleri nedeniyle yazılı olarak uyarılmadığı, firma taahhüdünde olan birtakım inşaat ve tadilatların başka bir firmaya ihale edildiği, montaj ve eksikliklerin tamamlanmasında gecikmeye sebebiyet verildiği, makine, teçhizat ve ekipmanın muayenesinde, geçici kabulünde sözleşme ve şartname hükümlerine uyulmadığı ve bu suretle idare zararına yol açıldığı ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2012 tarih ve Sor.5263-1595 sayılı onayıyla Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin ve 2547 Sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere Prof.Dr. Canan Hekimoğlu ve Prof.Dr. Mutlu Aytemir ile birlikte görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Konu ile ilgili olarak bilginize başvurulacağından 16.07.2012 günü saat 15:00'de H.Ü. Sıhhiye Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonunda hazır bulunmanızı rica ederim.

Prof.Dr. Filiz Ercan

Soruşturma Komisyonu Başkanı
